巻末資料 1-1　工事全体の作業と帳票の整理結果

工事全体の作業と帳票の整理結果

※契：工事請負契約書、共仕：土木工事共通仕様書（案）、特仕：特記仕様書 （関東地方整備局版を参考）
※工事打合せ簿の括弧書きの数字は、工事打合せ簿に添付する書類として、対応する作業分類レベル3の番号を示す

作業分類 レベル1	作業分類 レベル2	作業分類 レベル3		参照した仕様書等(共仕は略号省略)	帳票様式番号	帳票様式名称	作業者と書類の流れ 発注者		作業者と書類の流れ 請負者	備考
(1) 工事開始手続（工事請負契約書の工事着手30日に必要な諸手続き等）【工事契約～14日】										
	101	契約締結								
	102	監督職員等通知	1021	監督職員通知書作成	契9条 第1編 1-1-6 第3編 1-1-4	23	監督員通知書	○			
			1022	現場技術員通知書作成		23	監督員通知書	○			
			1023	施工体制調査員通知書作成		23	監督員通知書	○			H18.2.27付事務連絡「施工体制調査員による施工体制の点検試行要領」
			1024	通知		1	工事打合せ簿(1021,1022,1023) ※数字は関係する作業（作業分類レベル3の番号）を表す。以降、同様。	○	→		緊急時には口頭による指示（共仕1-1-6）
			1025	確認						○	
			1026	保管				○		○	
	103	現場代理人及び主任技術者等	1031	現場代理人経歴書作成	契10条	21	経歴書			○	
			1032	現場代理人通知書作成		20	現場代理人等通知書			○	契約締結後速やかに提出
			1033	（A）主任技術者経歴書作成		21	経歴書			○	
			1034	（A）主任技術者通知書作成		20	現場代理人等通知書			○	契約締結後速やかに提出
			1035	（B）監理技術者経歴書作成		21	経歴書			○	
			1036	（B）監理技術者通知書作成		20	現場代理人等通知書			○	契約締結後速やかに提出
			1037	専門技術者経歴書作成		21	経歴書			○	
			1038	専門技術者通知書作成		20	現場代理人等通知書			○	契約締結後速やかに提出
			1039	提出		1	工事打合せ簿 (1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038)		←	○	
			103A	確認				○			
			103B	契約担当官へ報告				○			
			103C	保管				○		○	
			TO 105								
	104	品質証明	1041	品質証明員経歴書作成	第3編 1-1-8	21	経歴書			○	
			1042	品質証明員通知書作成		20	現場代理人等通知書			○	
			1043	提出		1	工事打合せ簿(1041,1042)		←	○	
			1045	確認				○			
			1046	保管				○		○	
	105	工事カルテ作成、登録（工事契約後10日以内）	FROM 103		第1編 1-1-5						
			1051	工事カルテ作成			工事カルテ			○	（CORINS登録（500万円以上））
			1052	提出		1	工事打合せ簿（1051）		←	○	
			1053	工事カルテ内容確認				○	→		
			1054	保管				○		○	
			1055	CORINS登録（送付）						○	CORINSセンター
			1056	工事カルテ受領書受取り			工事カルテ受領書			○	
			1057	提出		1	工事打合せ簿(1056)		←	○	
			1058	確認				○			
			1059	保管				○		○	
	106	建設副産物情報交換システム（登録）	1061	利用登録	特仕1-1-1					○	H14.5.30付国関整技調第35号「建設副産物情報交換システムの運用について」
			1062	報告		1	工事打合せ簿(1061)		←	○	
			1063	確認				○			
			1064	保管				○		○	
	107	建設発生土情報交換システム（登録）	1071	利用登録	特仕1-1-1					○	H11.5.19付国関整技調第26号「建設発生土情報交換システムの運用の開始について」
			1072	報告		1	工事打合せ簿(1071)		←	○	
			1073	確認				○			
			1074	保管				○		○	
	108	請負代金内訳書及び工事費構成書（契約後14日以内）	1081	請負代金内訳書作成	契3条 第3編 1-1-2	4 28	請負代金内訳書（条件：契約書第3条に規定された場合に受注者が提出）			○	契第3条に規定された場合に受注者が請負代金内訳書を契約後14日以内に提出
			1082	請負代金内訳表（FD）作成						○	H15.10.1付事務連絡「請負代金内訳書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ」の登録について
			1083	提出		1	工事打合せ簿(1081,1082)		←	○	
			1084	確認				○			
			1085	保管				○		○	
			1086	工事費構成書の提示		1	工事打合せ簿		←	○	（条件：請負代金が1億以上で、6ヶ月を超える工期の場合、内訳書提出後に総括監督員に対して提出を求める）
			1087	確認				○			
			1088	保管				○		○	
			1089	工事費構成書作成			工事費構成書	○			
			108A	提出		1	工事打合せ簿（1089）	○	→		
			108B	確認						○	
			108C	保管				○		○	
	109	前払金請求手続（契約プロセス）	FROM 保証契約（契約プロセス）		契34条（特則40条）						
			1091	前払い金請求書作成		60	請求書			○	
			1092	提出					←	○	
			TO 702								
(2) 施工準備（施工計画立案に必要な準備・調整事項）【工事契約～30日、及び箇所別施工前】										
	201	設計図書照査	2011	設計図書内容照査	第1編 1-1-3		設計図書確認資料			○	
			2012	提出		1	工事打合せ簿（2011）		←	○	
			2013	確認				○			
			2014	保管				○		○	
	202	工事測量	2021	基準点指定	第1編 1-1-37 第3編 1-1-14		基点測量資料等	○			（丁張その他工事施工の基準となる仮設標識）
			2022	指示		1	工事打合簿（2021）	○	→		
			2023	基準点指示内容受領確認						○	
			2024	保管				○		○	
			2025	測量結果作成			測量結果			○	
			2026	提出		1	工事打合せ簿（2025）		←	○	
			2027	測量結果受領確認				○			
			2028	保管				○		○	
	203	施工体制台帳	2031	施工体制台帳作成	第1編 1-1-10	6	施工体制台帳			○	
			2032	施工体系図作成			施工体系図			○	下請負契約後速やかに提出
			2033	提出		1	工事打合せ簿（2031,2032）		←	○	
			2034	確認				○			
			2035	事務所長等確認				○			H6.4.6付事務連絡「低入札価格調査制度調査対象工事に係わる監督体制の強化」の登録について
			2036	保管				○		○	
	204	請負者相互の協力	2041	近接工区連絡体制の調整	第1編 1-1-11					○	
			2042	連絡協議会の開催			近接工区連絡に関する資料等			○	
			2043	提出		1	工事打合せ簿（2042）		←	○	
			2044	確認				○			
			2045	保管				○		○	

作業分類				参照した仕様書等(共仕は略号省略)	帳票様式番号	帳票様式名称	作業者と書類の流れ			備考
レベル1	レベル2		レベル3				発注者		請負者	
	205	保険の付保及び事故の補償	2051 水雷保険、傷害保険及び動産総合保険	契50条 第1編 1-1-40					○	共仕1-1-40(1)
			2052 回航保険						○	共仕1-1-40(2)
			2053 雇用者を被保険者とする保険						○	共仕1-1-40(3)
			2054 掛け金収納書		30	建設業退職金共済制度の掛金収納書			○	共仕1-1-40(5)
			2055 提出		1	工事打合せ簿(2051,2052,2053,2054)		←	○	
			2056 確認				○			
			2057 保管				○		○	
	206	官公庁等への手続等	2061 官公庁等への手続	第1編 1-1-35		手続内容記載文書			○	関係機関、地域住民等の交渉を含む
			2062 報告		1	工事打合簿(2061)		←	○	
			2063 確認				○	→		
			2064 保管				○		○	
			2065 手続き実施			手続き書類写し			○	
			2066 提出		1	工事打合簿(2065)		←	○	
			2067 保管				○		○	
	207	支給材料及び貸与物件 (支給材料及び貸与品)	2071 支給品要求書作成	第1編 1-1-16		支給品要求書			○	(要求の時)
			2072 提出		1	工事打合簿(2071)		←	○	
			2073 受領確認				○			
			2074 物品管理官へ報告				○			
			2075 保管				○		○	
			2076 支給品引渡通知			支給品引渡通知書	○	→		
			2077 支給品、貸与品引渡				○	→		(支給品、貸与品)
			2078 確認						○	
			2079 保管				○		○	
			207A 受領書、借用書作成		33 32	支給品受領書 貸与品借用(返納)書			○	引渡の日から7日以内に提出
			207B 提出		1	工事打合簿(207A)		←	○	
			207C 受領確認				○			
			207D 物品管理官へ報告				○			
			207E 保管				○		○	
	208	支給材料及び貸与物件受領 (建設機械借用)	2081 建設機械借用書作成	第3編 1-1-5	40	建設機械(借用・返納)書			○	(機械借用を必要とする場合)
			2082 提出		1	工事打合簿(2081)		←	○	
			2083 確認				○			
			2084 物品管理官へ報告				○			
			2085 建設機械引渡し				○	→		
			2086 確認						○	
			2087 保管				○		○	
	209	監督職員による検査(確認)及び立会等 (品質管理-工事材料)	2091 材料確認願作成	第3編 1-1-6	2	材料確認願			○	事前に提出
			2092 品質証明書作成		10	品質証明書			○	
			2093 標本試験結果作成			標本試験結果			○	
			2094 数量表作成			数量表			○	
			2095 提出		2	材料確認願		←	○	
			2096 確認				○			
			2097 通知				○	→		
			2098 材料確認				○		○	
			2099 保管				○		○	
	210	工事用地等の使用	2101 工事用地等の使用	第1編 1-1-7		基準点測量資料等	○			H14.4.22付国関整技管第4号「条件明示について」
			2102 指示		1	工事打合簿(2101)	○	→		
			2103 確認						○	
			2104 保管				○		○	
(3) 施工計画【工事契約～30日、及び箇所・工種別施工計画】										
	301	施工計画	3011 工事数量算定	第1編 1-1-4					○	
			3012 主要施工法検討						○	
			3013 概略工程計画、工事費算定						○	
			3014 施工計画書作成		7 8	再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書			○	各計画(工事基本、組織、工程、品質、安全・衛生、環境、資材、機械、労務、施工方法、再資源利用、交通管理)の検討、作成
			3015 提出		1	工事打合簿(3014)		←	○	
			3016 確認				○			
			3017 保管				○		○	
(4) 工事施工、施工管理【工事契約　30日(最遅)～、及び箇所・工種別施工管理】										
	401	本工事	4011 別途(巻末資料1-2参照)			工事打合簿　等				
	402	安全管理	4021 安全教育、安全訓練計画	第1編 1-1-26 1-1-27 1-1-32 第3編 1-1-12 1-1-13					○	(施工計画書内)
			4022 労務安全関連記録の収集						○	
			4023 安全点検						○	
			4024 安全教育、安全訓練実施			安全記録資料			○	
			4025 報告		1	工事打合簿(4024)		←	○	
			4026 確認				○			
			4027 保管				○		○	
	403	環境管理	4031 環境・衛生管理計画	第1編 1-1-30					○	(施工計画書内)
			4032 応急措置、苦情対応			応急措置、苦情対応記録等			○	
			4033 報告		1	工事打合簿(4031)		←	○	
			4034 確認				○			
			4035 保管				○		○	
			4036 指示				○	→		
			4037 確認						○	
			4038 保管				○		○	
	404	工程管理	4041 工程管理計画	第1編 1-1-4 1-1-36					○	(施工計画書内)
			4042 進捗状況表、工事工程表作成			進捗状況表、工事工程表、工事月報			○	工事月報は上半期分20日まで、 下半期分翌月5日まで提出
			4043 提出		1	工事打合簿(4042)		←	○	
			4044 確認				○			
			4045 保管				○		○	
			4046 指示				○	→		
			4047 確認						○	
			4048 保管				○		○	
			4049 休日作業届			休日作業届			○	
			404A 提出		1	工事打合簿(4049)		←	○	
			404B 確認				○			
			404C 保管				○		○	
	405	品質管理	4051 標本抽出	第1編 1-1-23 第3編 1-1-11					○	
			4052 標本試験						○	
			4053 品質証明書照合						○	
			4054 品質管理図作成			品質証明書、試験結果、品質管理図			○	
			4055 保管						○	
			4056 提出、提示			工事打合簿(4054)		←	○	完成検査時までに監督職員に提出 監督職員から請求があった場合に提示
			4057 確認				○			
			4058 保管				○		○	

作業分類					参照した仕様書等(共仕は略号省略)	帳票様式番号	帳票様式名称	作業者と書類の流れ			備考
レベル1	レベル2		レベル3					発注者		請負者	
	406	品質管理-工事材料-立会「監督職員による検査(確認)及び立会等」	4061	立会願作成	第1編 1-1-6(5)					○	事前に提出
			4062	提出		11	確認・立会願		←	○	
			4063	確認				○			
			4064	通知		11	確認・立会願	○	→		
			4065	材料確認(立会)				○		○	
			4066	保管				○		○	
	407	出来形管理	4071	検測、写真撮影	第1編 1-1-23 第3編 1-1-6 1-1-7					○	
			4072	出来形管理図、管理表作成			出来形管理図、出来形管理表 測定結果一覧表			○	
			4073	保管						○	
			4074	提出、提示			工事打合簿(4072)		←	○	完成検査時までに監督職員に提出 監督職員から請求があった場合に提示
			4075	確認				○			
			4076	保管				○		○	
	408	出来形管理-段階確認「監督職員による検査(確認)及び立会等」	4081	段階確認項目	第1編 1-1-6					○	
			4082	報告		3	段階確認書		←	○	
			4083	確認				○			
			4084	通知		3	段階確認書	○	→	○	
			4085	確認(現場)				○		○	
			4086	保管				○		○	
	409	工事の一時中止	4091	工事中止通知書作成	契20条 第1編 1-1-13	42	工事の一時中止について	○			
			4092	工事中止通知		1	工事打合簿(4091)	○	→		
			4093	確認、工事中止						○	
			4094	保管				○		○	
			4095	維持・管理に関する基本計画書作成			維持・管理に関する基本計画書			○	
			4096	提出		1	工事打合簿(4095)		←	○	
			4097	確認				○			
			4098	保管				○		○	
	410	工事再開の通知	4101	工事再開通知書作成		43	工事の一時再開について	○			
			4102	工事再開通知		1	工事打合簿(4101)	○	→		
			4103	確認、工事再開						○	
			4104	保管				○		○	
	411	設計図書の変更	4111	設計図書変更	第1編 1-1-14		設計図書の変更について	○			
			4112	指示		1	工事打合簿(4111)	○	→		
			4113	確認						○	
			4114	保管				○		○	
	412	工期変更	4121	工期変更必要性把握	第1編 1-1-15			○		○	
			4122	工期変更事前協議			工期変更資料	○		○	
			4123	提出		1	工事打合簿(4122)		←	○	
			4124	協議内容確認				○			
			4125	保管				○		○	
			4126	契約変更等決議書作成				○			
			4127	契約担当官へ提出				○			
			4128	協議対象確認通知			工期変更協議対象確認通知書	○	→		
			4129	確認						○	
			412A	保管				○		○	
			412B	工期変更関連書類作成、提出		19	変更工程表 工期延期願、変更日数算出根拠		←	○	
			412C	確認				○			
			412D	保管				○		○	
	413	契約変更	4131	契約変更決議書作成	契17-25条			○			
			4132	契約担当官へ提出				○			
			4133	契約変更等通知			契約変更等通知書、協議書	○	→		
			4134	確認						○	
			4135	保管				○		○	
			4136	現場説明実施			変更現場説明書	○	→		(変更現場説明書)
			4137	受領確認						○	
			4138	記名押印						○	
			4139	保管				○		○	
			413A	変更契約書(案)作成、提出		26 16	工事請負変更契約書 変更見積書 変更施工計画書		←	○	
			413B	受領確認				○			
			413C	記名押印				○			
			413D	保管				○		○	
			413E	契約変更締結通知		27	工事請負変更請書 契約締結通知書、契約書	○	→		
			413F	確認						○	
			413G	保管				○		○	
	414	建設副産物	4141	土砂、砕石等搬入計画	第1編 1-1-18	7	再生資源利用計画書、施工計画書			○	施工計画内
			4142	建設混合廃棄物等搬出計画		8	再生資源利用促進計画書、施工計画書			○	施工計画内
			4143	土砂、砕石等搬入管理						○	
			4144	建設混合廃棄物等搬出管理						○	
			4145	建設副産物実態調査(センサス)			代替プロセス(4141,4142)			○	特仕1-1-1 建設副産物を扱う全ての工事
			4146	産業廃棄物管理表作成			マニフェスト			○	
			4147	提出					←	○	
			4148	確認				○			
			4149	保管				○		○	
	415	工事履行報告	4151	工事履行報告	契11条 第1編 1-1-24	5	工事履行報告書		←	○	翌月5日まで提出
			4152	確認				○			
			4153	保管				○		○	
	416	部分払い請求	4161	部分前払い請求	契37条	73	請負工事既済部分検査請求書			○	
			4162	提出					←	○	
			4163	確認			検査命令書	○			(検査日設定)
			4164	保管				○		○	
			TO 604								
			4165	認定				○			
			4166	認定調書通知			認定調書	○	→		
			4167	確認						○	
			4168	保管				○		○	
			4169	請求書作成			中間前払い金請求書			○	
			416A	提出					←	○	
			TO 702								

作業分類					参照した仕様書等(共仕は略号省略)	帳票様式番号	帳票様式名称	作業者と書類の流れ			備考
レベル1	レベル2		レベル3					発注者		請負者	
	417	部分使用	4171	工事の部分使用(協議)通知	第1編 1-1-22	55	工事の部分使用について(協議・承諾)	○	→		
			4172	確認						○	
			4173	保管				○		○	
			4174	工事の部分使用(承諾)提出		55 66 67	工事の部分使用について(協議・承諾) 指定部分引渡書 指定部分完成通知書		←	○	
			4175	確認			検査命令書	○			(検査日設定)
			4176	保管				○		○	
			TO 604								
			4177	工事の部分使用(承諾)通知		55	工事の部分使用について(協議・承諾)	○	→		
			4178	確認						○	
			4179	保管				○		○	
	418	建設機械使用実績報告	4181	建設機械使用、管理	第3編 1-1-5		建設機械管理記録			○	
			4182	建設機械使用実績報告		41	建設機械使用実績報告書		←	○	3ヶ月毎に翌月の15日まで提出
			4183	受領確認				○			
			4184	物品管理官へ報告				○			
			4185	保管				○		○	
	419	監督職員の変更	4191	監督職員変更通知書作成	第1編 1-1-6	24	監督職員変更通知書	○			
			4192	現場技術員変更通知書作成		24	監督職員変更通知書	○			
			4193	施工体制調査員変更通知書作成		24	監督職員変更通知書	○			
			4194	通知		1	工事打合簿(4191,9412,4193)	○	→		
			4195	確認						○	
			4196	保管				○		○	
	420	現場代理人及び主任技術者等の変更	4201	現場代理人経歴書作成	契10条	21	経歴書			○	
			4202	現場代理人通知書作成		22	現場代理人等変更通知書			○	
			4203	(A)主任技術者経歴書作成		21	経歴書			○	
			4204	(A)主任技術者通知書作成		22	現場代理人等変更通知書			○	
			4025	(B)監理技術者経歴書作成		21	経歴書			○	
			4206	(B)監理技術者通知書作成		22	現場代理人等変更通知書			○	
			4207	専門技術者経歴書作成		21	経歴書			○	
			4208	専門技術者通知書作成		22	現場代理人等変更通知書			○	
			4209	提出		1	工事打合せ簿 (4201,4202,4203,4204,4205,4206,4207,4208)		←	○	
			420A	確認				○			
			420B	契約担当官へ報告				○			
			420C	保管				○		○	
			TO 422								
	421	品質証明の変更	4211	品質証明員経歴書作成	第3編 1-1-8	21	経歴書			○	
			4212	品質証明員通知書作成		22	現場代理人等変更通知書			○	
			4213	提出		1	工事打合せ簿(4211,4212)		←	○	
			4214	確認				○			
			4215	保管				○		○	
	422	工事カルテ変更登録	FROM 420		第1編 1-1-5					○	
			4221	工事カルテ作成			工事カルテ			○	(CORINS登録(500万円以上))
			4222	提出		1	工事打合せ簿(4221)		←	○	
			4223	工事カルテ内容確認				○	→		
			4224	保管				○		○	
			4225	CORINS登録						○	CORINSセンター
			4226	工事カルテ受領書受取り			工事カルテ受領書			○	
			4227	提出		1	工事打合せ簿(4225)		←	○	
			4228	確認				○			
			4229	保管				○		○	
	423	建設副産物情報交換システム(入力・変更)	4231	情報入力	特仕1-1-1					○	H14.5.30付国関整技調第35号「建設副産物情報交換システムの運用について」
			4232	報告		1	工事打合せ簿(4231)		←	○	
			4233	確認				○			
			4234	保管				○		○	
	424	建設発生土情報交換システム(入力・変更)	4241	情報入力	特仕1-1-1					○	H11.5.19付国関整技調第26号「建設発生土情報交換システムの運用の開始について」
			4242	報告		1	工事打合せ簿(4241)		←	○	
			4243	確認				○			
			4244	保管				○		○	
	425	事故報告書	4251	事故発生、対応措置	第1編 1-1-29					○	
			4252	事故発生報告		12	事故発生報告書		←	○	事故発生後7日以内(死亡事故は1両日)
			4253	確認				○			
			4254	契約担当官へ提出				○			
			4255	保管				○		○	
	426	天災等による損害発生時	4261	天災等による損害発生通知	第1編 1-1-38	51 52	天災その他の不可抗力による損害の通知について 被災内訳及び内容確認書		←	○	
			4262	確認				○			
			4263	保管				○		○	
			4264	決議、損害発生確認通知		53 52	天災その他不可抗力による損害の確認の通知について 被災内訳及び内容確認書	○	→		
			4265	確認						○	
			4266	保管				○		○	
			4267	損害額請求		58	天災その他の不可抗力による損害額について(請求) 損害額内訳書		←	○	
			4268	確認				○			
			4269	保管				○		○	
			426A	決議、協議通知			天災その他の不可抗力による損害の協議の通知につい	○	→		
			427B	確認						○	
			429C	損害額承諾			損害額承諾書		←	○	
			429D	確認				○			
			430E	保管				○		○	
			431F	承認、損害額決定通知		59	天災その他の不可抗力による損害額について(通知)	○	→		
			432G	確認						○	
			433H	保管				○		○	
			434I	支払い請求			支払い請求書		←	○	
			TO 702								
(5) 精算											
	501	支給材料及び貸与物件受領(建設機械返納)	5021	発注者貸与機材返却処理	第3編 1-1-5					○	
			5022	発注者貸与機材返却		40	建設機械(借用・返納)書		←	○	返納時
			5023	受領確認				○			
			5024	物品管理官へ報告				○			
			5025	保管				○		○	
	502	支給品精算	5031	支給品返却処理	第1編 1-1-16					○	
			5032	支給品返却		34	支給品精算書		←	○	工事完成時に提出
			5033	確認				○			
			5034	物品管理官へ報告				○			
			5035	保管				○		○	

作業分類						参照した仕様書等(共仕は略号省略)	帳票様式番号	帳票様式名称	作業者と書類の流れ			備考
レベル1	レベル2		レベル3						発注者		請負者	
	503	支給材料精算	5041	支給材料精算処理		第1編 1-1-16					○	
			5042	支給材料返却				支給材料受払簿		←	○	工事完成時に提出
			5043	確認					○			
			5044	物品管理官へ報告					○			
			5045	保管					○		○	
	504	現場発生品引渡し	5051	現場発生品処理		第1編 1-1-17					○	
			5052	現場発生品引渡報告			36	現場発生品調書		←	○	発生品引渡の時
			5053	引渡場所指示					○	→		
			5054	現場発生品引渡						←	○	
			5055	確認					○			
			5056	契約担当官へ報告					○			
			5057	物品管理官へ報告					○			
			5058	保管					○		○	
(6) 竣工・検査												
	601	後片付け	6011	指示		第1編 1-1-28	1	工事打合せ簿(6011)	○	→		
			6012	確認							○	
			6013	保管					○		○	
	602	工事完成図	6021	工事完了		第1編 1-1-19					○	
			6022	工事完成図作成				工事完成図			○	
			6023	提出						←	○	
			6024	受領確認					○			
	603	工事完成検査 (会計法第29条の11第2項)	6032	工事完成通知		第1編 1-1-20	69	工事完成通知書			○	
			6033	提出						←	○	
			6034	確認					○			
			6035	保管					○		○	
			TO 604									
	604	技術検査	FROM 416,417,603			第3編 1-1-10						
			6041	検査命令				検査命令書	○			
			6042	通知					○	→		(検査日設定)
			6043	検査資料等準備(TO 602)							○	
			6044	検査					○		○	
			6045	修補指示			74	修補指示書	○	→		
			6046	修補完了報告			75	修補完了報告書		←	○	
			6047	検査合格通知				検査合格通知書	○	→		
			6048	確認							○	
			6049	保管					○		○	
	605	工事完成図書の納品 (電子納品)	6051	発注者諸届の提出		第3編 1-1-9				←	○	
			6052	竣工図面の提出				竣工図		←	○	
			6053	維持管理説明書の提出				維持管理説明書		←	○	
			6054	監督官庁諸届の提出						←	○	
			6055	確認					○			
			6056	保管					○		○	
	606	工事引渡し	6061	検査合格通知書受領		契31条 第3編 1-1-15					○	
			6062	工事引渡書提出			68	引渡書		←	○	
			6063	確認					○			
			6064	契約担当官へ報告					○			
			6065	保管					○		○	
			6066	工事引渡完了通知				工事引渡確認書	○	→		
			6067	確認							○	
			6068	保管					○		○	
(7) 支払												
	701	完成払い請求	6011	工事引渡確認書受領		契32条					○	
			6022	完成払金請求				完成払金請求書		←	○	
			TO 702									
	702	請負代金の支払	FROM 109,416,426,702			契32条						
			7021	契約担当官へ提出					○			
			7022	支出担当官へ報告					○			
			7024	保管					○		○	

巻末資料 1-2　工種別の作業と帳票の整理結果

工種別の作業と帳票の整理結果

※参考とした仕様書等
- 国土交通省土木工事積算基準(H18)
- 関東地方整備局　土木工事共通仕様書(H17.4)
- 関東地方整備局　土木工事施工管理基準　出来形管理基準及び規格値　品質管理基準及び規格値　土木工事写真管理基準(H17.4)
- 土木工事監督技術基準(案)(H18.1)

※請負者における資料作成状況
- 作成・保管：書類を作成・保管し、監督職員の請求に対して提示が必要なもの(検査時に提出が必要な場合がある)
- 作成・提出：監督職員への提出が必要なもの(写真については作成・随時保管)

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名(文書、写真)
				作成・保管	作成・提出	
土工						
	001	機械土工(土砂)				
			機械搬入		○	着手前写真
			掘削、床掘		○	状況写真
			(段階確認)		○	確認・立会願、段階確認書
			積込			状況写真
			運般			状況写真
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			埋戻し			状況写真
			機械搬出		○	完了写真
	002	機械土工(岩石)				
			火薬取扱確認		○	火薬類保安手帳、従事者手帳 火薬使用計画書、火災予防計画書
			機械搬入		○	着手前写真
			火薬併用掘削、床掘		○	状況写真
			(段階確認)		○	確認・立会願、段階確認書
			積込			状況写真
			運般			状況写真
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			埋戻し			状況写真
			機械搬出		○	完了写真
	003	土の敷均し締固め工				
			機械搬入		○	着手前写真
			敷均し			状況写真
			締固め			状況写真
			土の締固め試験、写真撮影			試験成績表、品質管理写真
			現場密度の測定、写真撮影			試験成績表、品質管理写真
			品質管理記録	○		品質管理表
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			機械搬出		○	完了写真
	004	小規模土工				
			機械搬入		○	着手前写真
			舗装版破砕積込、床掘			状況写真
			埋戻し			状況写真
			運般			状況写真
			機械搬出		○	完了写真
	005	人力土工				
			人力切り崩し、床掘			状況写真
			仮置			状況写真
			積込み、埋戻し			状況写真
			運般			状況写真
	006	安定処理工				
			機械搬入		○	着手前写真
			固化材散布			状況写真
			混合			状況写真
			敷均し			状況写真
			締固め			状況写真 確認・立会願、段階確認書
			土の締固め試験、写真撮影			試験成績表、品質管理写真
			現場密度の測定、写真撮影			試験成績表、品質管理写真
			プルーフローリング			試験成績表、品質管理写真
			段階確認		○	確認・立会願、段階確認書

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			品質管理記録	○		品質管理表
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			養生			状況写真
			機械搬出		○	完了写真
共通工						
	007	法面整形工				
			法面削取り、築立盛土			着手前写真、状況写真
			法面整形			状況写真
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図、完了写真
	008	コンクリート法枠工				
			機材搬入		○	着手前写真
			足場設置			状況写真
			敷砂利投入			状況写真
			吹き出し防止材敷設			状況写真
			プレキャストブロック設置			状況写真
			アンカー設置			状況写真
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			間詰コンクリート投入			状況写真
			中詰材設置			状況写真
			足場撤去			状況写真
			機器搬出		○	完了写真
	009	基礎・裏込砕石工				
			材料投入			着手前写真
			敷均し			状況写真
			締固め			状況写真
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図、完了写真
	010	コンクリートブロック積（張）工				
			機械搬入		○	着手前写真
			法面整形			状況写真
			基礎コンクリート打設			状況写真
			吸出し防止材設置			状況写真
			裏込材投入転圧			状況写真、出来形管理写真
			コンクリートブロック積			状況写真、出来形管理写真
			胴込材投入転圧			状況写真
			裏込・胴込コンクリート打設			状況写真
			天端コンクリート打設			状況写真
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			機械搬出		○	完了写真
	011	現場打擁壁工				
			床掘			着手前写真、状況写真
			段階確認1		○	確認・立会願、段階確認書
			資機材搬入		○	工事打合簿
			基礎材敷均し・転圧			状況写真
			均しコンクリート打設・養生			状況写真
			均し型枠撤去			状況写真
			足場設置			状況写真
			鉄筋加工・組立			状況写真
			段階確認2		○	確認・立会願、段階確認書
			型枠製作・設置			状況写真
			目地材設置			状況写真
			水抜パイプ設置			状況写真
			止水板設置			状況写真
			コンクリート打設・養生			状況写真
			段階確認3		○	（把握のための資料）
			型枠撤去			状況写真
			吹き出し防止材設置			状況写真

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			足場撤去			
			裏込採石敷均し、転圧			状況写真
			段階確認4		○	確認・立会願、段階確認書
			資機材搬出		○	工事打合簿
			埋戻し			完了写真
	012	井桁ブロック積工				
			資機材搬入		○	着手前写真
			床掘			状況写真
			（段階確認）		○	確認・立会願、段階確認書
			基礎材敷均し・転圧			状況写真
			基礎コンクリート			状況写真
			埋戻し			状況写真
			井桁ブロック据付			状況写真
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			中詰材投入			状況写真
			吸出防止材設置			状況写真
			裏込材投入・締固め			状況写真
			天端工			状況写真
			資機材搬出		○	完了写真
	013	プレキャスト擁壁工				
			床掘			着手前写真、状況写真
			（段階確認）		○	確認・立会願、段階確認書
			基礎砕石			状況写真
			均しコンクリート			状況写真
			敷モルタル			状況写真
			プレキャストブロック据付			状況写真
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			ブロック接合			状況写真
			目地モルタル詰			状況写真
			排水材設置			状況写真
			埋戻し			状況写真、完了写真
	014	補強土壁工				
			機器搬入		○	着手前写真
			壁面コンクリート強度試験			試験成績表、品質管理写真
			外観検査			外観写真
			品質管理記録	○		品質管理表
			壁面材組立			状況写真
			補強材設置まで敷均し・締固め			状況写真
			補強材設置			状況写真
			締固め、粒度試験			試験成績表、品質管理写真
			敷均し・締固め			状況写真
			現場密度試験			試験成績表、品質管理写真
			品質管理記録	○		品質管理表
			壁面上端処理			状況写真
			機器搬出		○	完了写真
	015	コンクリート矢板工				
			機材搬入		○	着手前写真
			施工機械設置			状況写真
			コンクリート矢板吊上げ・建込み			状況写真
			チャック締付け			状況写真
			段階確認1		○	確認・立会願、段階確認書
			コンクリート矢板打込み			状況写真
			段階確認2		○	確認・立会願、段階確認書
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			施工機械撤去			状況写真
			機材搬出		○	完了写真

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
	016	排水構造物工				
			床掘			着手前写真、状況写真
			基礎砕石			状況写真
			巻き（均し）コンクリート			状況写真
			据付			状況写真
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			埋戻し			状況写真
			残土処理			状況写真、完了写真
	017	地盤改良工（バーチカルドレーンエ）--袋詰式サンドドレーンエ				
			機材搬入		○	着手前写真
			組立			状況写真
			位置決め			状況写真
			貫入			状況写真
			段階確認		○	確認・立会願、段階確認書
			砂投入			状況写真
			引抜き			状況写真
			移動			状況写真
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			分解			状況写真
			機材搬出		○	完了写真
	018	地盤改良工（固結工）--粉体噴射撹拌工				
			機材搬入		○	着手前写真
			組立			状況写真
			位置決め			状況写真
			貫入			状況写真
			貫入完了			状況写真
			段階確認1		○	確認・立会願、段階確認書
			引抜・改良材噴射			状況写真
			引抜完了			状況写真
			一軸圧縮試験			試験成績表、品質管理写真
			品質管理記録	○		品質管理表
			段階確認2		○	確認・立会願、段階確認書
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			分解			状況写真
			機材搬出		○	完了写真
	019	薬液注入工（固結工）				
			機材搬入		○	着手前写真
			プラント組立			状況写真
			足場仮設			状況写真
			機械準備			状況写真
			削孔			状況写真
			注入			状況写真
			引抜			状況写真
			一軸圧縮試験			試験成績表、品質管理写真
			品質管理記録	○		品質管理表
			段階確認		○	確認・立会願、段階確認書
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			器具洗浄			状況写真
			プラント解体			状況写真
			機材搬出		○	完了写真
	020	函渠工				
			床堀			着手前写真、状況写真
			段階確認1		○	確認・立会願、段階確認書
			資機材搬入		○	工事打合簿
			基礎材敷均し・転圧			状況写真
			均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生			状況写真
			足場設置			状況写真
			床版鉄筋加工・組立			状況写真

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			段階確認2		○	確認・立会願、段階確認書
			グラウト管設置			状況写真
			床版型枠製作・設置			状況写真
			目地材設置、止水板設置			状況写真
			コンクリート打設・養生			状況写真
			段階確認3		○	（把握のための資料）
			床版型枠撤去			状況写真
			支保設置			状況写真
			内型枠・スラブ型枠製作・設置			状況写真
			側壁・スラブ鉄筋加工・組立			状況写真
			段階確認4		○	確認・立会願、段階確認書
			外型枠製作・設置			状況写真
			目地材設置、止水板設置			状況写真
			コンクリート打設・養生			状況写真
			段階確認5		○	（把握のための資料）
			内・外型枠、スラブ型枠撤去			状況写真、出来形管理写真
			可とう性継手設置			状況写真
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			足場・支保撤去			状況写真
			段階確認6		○	確認・立会願、段階確認書
			資機材搬出		○	状況写真
			埋戻し			完了写真
	021	目地・止水板設置工				
			準備			着手前写真
			型枠設置			状況写真
			止水板設置			状況写真
			目地板設置			状況写真
			コンクリート打設			状況写真
			段階確認1		○	（把握のための資料）
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			型枠撤去			状況写真
			後片付け			完了写真
基礎工						
	022	鋼管・既製コンクリート杭打工--パイルハンマ工				
			搬入		○	着手前写真、出来形管理写真
			機械組立			状況写真
			機械移動据付			状況写真
			杭吊込・芯出し			状況写真
			打込（打撃）			状況写真
			浸透深傷試験、超音波探傷試験、放射線透過試験			試験成績表、品質管理写真
			品質管理記録	○		品質管理表
			段階確認1		○	確認・立会願、段階確認書
			継杭吊込（継杭有の場合）			状況写真、出来形管理写真
			杭継溶接（継杭有の場合）			状況写真
			浸透深傷試験、超音波探傷試験、放射線透過試験			試験成績表、品質管理写真
			品質管理記録	○		品質管理表
			杭頭処理（ヤットコ無の場合）			状況写真、出来形管理写真
			段階確認2		○	確認・立会願、段階確認書
			ヤットコ吊込			状況写真
			ヤットコ打込			状況写真
			ヤットコ引抜			状況写真
			穴埋・整地作業			状況写真
			掘削			状況写真
			杭頭処理			状況写真、出来形管理写真
			段階確認3		○	確認・立会願、段階確認書
			出来形管理実測、写真撮影			出来形管理写真
			出来形管理記録	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			機械解体			状況写真
			搬出		○	完了写真

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
	023	鋼管・既製コンクリート杭打工--中堀工				
			搬入		○	着手前写真、出来形管理写真
			機械組立			状況写真
			機械移動据付			状況写真
			杭吊込・芯出し			状況写真
			杭建込			状況写真
			杭打作業（オーガ掘削）			状況写真
			（段階確認1）		○	確認・立会願、段階確認書
			継杭建込（継杭有の場合）			状況写真
			継手溶接（継杭有の場合）			状況写真
			（試験）			試験成績表、品質管理写真
			（品質管理記録）	○		品質管理表
			（段階確認2）		○	確認・立会願、段階確認書
			ヤットコ建込			状況写真
			打撃打止（打撃を選択した場合）			状況写真
			グラウト注入（グラウト注入を選択した場合）			状況写真
			ヤットコ引抜き			状況写真
			穴埋・整地作業			状況写真
			（段階確認3）		○	確認・立会願、段階確認書
			杭頭処理			状況写真、出来形管理写真
			（段階確認4）		○	確認・立会願、段階確認書
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			機械解体			状況写真
			搬出		○	完了写真
	024	場所打杭工--オールケーシング工・硬質地盤用オールケーシング工				
			搬入		○	着手前写真
			機械組立			状況写真
			準備			状況写真
			鉄筋かご製作			状況写真
			ケーシング建込			状況写真、出来形管理写真
			土砂仮置			状況写真
			土砂運搬			状況写真
			鉄筋かご、トレミー管建込			状況写真、出来形管理写真
			（段階確認1）		○	確認・立会願、段階確認書
			コンクリート打設			状況写真
			（段階確認2）		○	（把握のための資料）
			ケーシング引抜き			状況写真、出来形管理写真
			杭頭処理			状況写真、出来形管理写真
			（段階確認3）		○	確認・立会願、段階確認書
			（段階確認4）		○	確認・立会願、段階確認書
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			殻処分等			状況写真
			機械解体			状況写真
			搬出		○	完了写真
	025	場所打杭工--リバースサーキュレーションエ				
			搬入		○	着手前写真
			機械組立			状況写真
			スタンドパイプ建込			状況写真
			移動据付			状況写真
			循環設備組立			状況写真
			鉄筋かご製作			状況写真
			掘削			状況写真
			（段階確認1）		○	確認・立会願、段階確認書
			土砂運搬			状況写真
			鉄筋建込			状況写真、出来形管理写真
			（段階確認2）		○	確認・立会願、段階確認書
			スライム処理			状況写真
			コンクリート打設			状況写真
			（段階確認3）		○	（把握のための資料）

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			泥水運搬			状況写真
			（段階確認4）		○	確認・立会願、段階確認書
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			機械解体			状況写真
			搬出		○	完了写真
	026	場所打杭工--アースオーガエ・硬質地盤用アースオーガエ				
			施工機械搬入		○	着手前写真
			機械据付			状況写真
			掘削及び排土			状況写真
			（段階確認1）		○	確認・立会願、段階確認書
			モルタル注入			状況写真
			オーガ引抜			状況写真
			（段階確認2）		○	（把握のための資料）
			鉄筋かごまたはH形鋼建込			状況写真、出来形管理写真
			（段階確認3）		○	確認・立会願、段階確認書
			（段階確認4）		○	確認・立会願、段階確認書
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			機械撤去			状況写真
			施工機械搬出		○	完了写真
	027	場所打杭工--大口径ボーリングマシンエ				
			搬入路構築		○	着手前写真
			機械・機材搬入			状況写真
			整地・敷鉄板設置			状況写真
			足場設置			状況写真
			やぐら設置			状況写真
			芯出し			状況写真
			削孔			状況写真
			鋼管またはH形鋼建込			状況写真、出来形管理写真
			孔内洗浄			状況写真
			コンクリート・モルタル打設			状況写真
			（段階確認1）		○	（把握のための資料）
			（段階確認2）		○	確認・立会願、段階確認書
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			やぐら撤去			状況写真
			足場・敷鉄板撤去			状況写真
			施工機械搬出		○	完了写真
	028	場所打杭工--ダウンザホールハンマエ				
			機械・機材搬入		○	着手前写真
			整地・敷鉄板設置			状況写真
			足場設置			状況写真
			やぐら設置（大口径ボーリングマシン工法選択時）			状況写真
			掘削機組立（クレーン工法選択時）			状況写真
			芯出し			状況写真
			削孔			状況写真
			孔内洗浄			状況写真
			（段階確認1）		○	確認・立会願、段階確認書
			鋼財建込み・溶接			状況写真、出来形管理写真
			（試験）			試験成績表、品質管理写真
			（品質管理記録）	○		品質管理表
			中詰材充填			状況写真
			外詰材充填			状況写真
			スライム除去			状況写真
			掘削機移動			状況写真
			（段階確認2）		○	確認・立会願、段階確認書
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			やぐら撤去（大口径ボーリングマシン工法選択時）			状況写真
			足場・敷鉄板撤去			状況写真

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			施工機械搬出		○	完了写真
	029	深礎工				
			機材搬入		○	着手前写真
			掘削			状況写真、出来形管理写真
			段階確認1		○	確認・立会願、段階確認書
			土砂搬出			状況写真
			土留材組立			状況写真
			杭内足場工			状況写真
			鉄筋組立			状況写真
			（段階確認2）		○	確認・立会願、段階確認書
			グラウト注入			状況写真
			（段階確認3）		○	確認・立会願、段階確認書
			（段階確認4）		○	確認・立会願、段階確認書
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			機材搬出		○	完了写真
コンクリート工						
	030	コンクリート工				
			打設準備		○	着手前写真
			打設			状況写真
			締固め			状況写真
			表面仕上げ			状況写真
			養生		○	完了写真
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図、完了写真
	031	型枠工				
			型枠材搬入		○	着手前写真
			型枠製作・加工			状況写真
			化粧型貼付（化粧型枠とする場合）			状況写真
			組立・設置			状況写真
			コンクリート打設			状況写真
			化粧型はく離（化粧型枠とする場合）			状況写真
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			解体・撤去			
			型枠材搬出		○	完了写真
仮設工						
	032	鋼矢板（H形鋼）工--バイブロハンマ工				
			機材搬入（打込み時）		○	着手前写真
			施工機械設置（打込み時）			状況写真
			配管部材取付（ウォータージェット併用施工）			状況写真
			鋼矢板・H形鋼吊上げ・建込			状況写真
			鋼矢板・H形鋼打込			状況写真、出来形管理写真
			配管部材引抜き（ウォータージェット併用施工）			状況写真
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			施工機械撤去（打込み時）			状況写真
			機材搬出（打込み時）			状況写真
			機材搬入（引抜き時）			状況写真
			施工機械設置（引抜き時）			状況写真
			鋼矢板・H形鋼引抜き			状況写真
			鋼矢板・H形鋼打抜倒			状況写真
			施工機械撤去（引抜き時）			状況写真
			機材搬出（引抜き時）		○	完了写真
	033	鋼矢板（H形鋼）工--油圧圧入引抜工				
			機材搬入（打込み時）		○	着手前写真
			施工機械据付（打込み時）			状況写真
			配管部材取付（ウォータージェット併用施工）			状況写真
			鋼矢板吊上げ			状況写真
			鋼矢板圧入			状況写真、出来形管理写真
			継矢板吊上げ（継施工する場合）			状況写真

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			鋼矢板溶接（継施工する場合）			状況写真
			配管部材引抜き（ウォータージェット併用施工）			状況写真
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			施工機械解体（打込み時）			状況写真
			機材搬出（打込み時）			状況写真
			機材搬入（引抜き時）			状況写真
			施工機械据付（引抜き時）			状況写真
			鋼矢板引抜き・吊上げ			状況写真
			施工機械解体（引抜き時）			状況写真
			機材搬出（引抜き時）		○	完了写真
	034	鋼矢板工（アースオーガ併用圧入工）				
			機材搬入・組立		○	着手前写真、状況写真
			矢板玉掛・吊込・芯出し			状況写真
			オーガ掘削・矢板圧入		○	状況写真、出来形管理写真
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			オーガ引抜き			状況写真
			機械解体・搬出		○	状況写真、完了写真
	035	鋼矢板（H形鋼）工（クレーン引抜き工）				
			機材搬入		○	着手前写真
			施工機械組立			状況写真
			矢板引抜き			状況写真
			矢板吊出し			状況写真
			施工機械分解			状況写真
			機材搬出		○	完了写真
	036	仮設材設置撤去工				
			矢板・H鋼打込		○	着手前写真、状況写真、出来形管理写真
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			掘削			状況写真
			履工板受桁設置（履工板設置の場合）			状況写真
			切梁・腹起し・タイロッド・横矢板・履工板設置			状況写真
			本体施工			状況写真
			切梁・腹起し・タイロッド・横矢板・履工板撤去			状況写真
			履工板受桁撤去（履工板設置の場合）			状況写真
			埋戻し			状況写真
			矢板・H鋼引抜		○	状況写真、完了写真
	037	足場工				
			機材搬入		○	着手前写真
			足場設置			状況写真
			供用中			状況写真
			足場撤去			状況写真
			機材搬出		○	完了写真
	038	支保工				
			機材搬入		○	着手前写真
			支保設置			状況写真
			供用中			状況写真
			支保撤去			状況写真
			機材搬出		○	完了写真
	039	締切排水工				
			機材搬入		○	着手前写真
			ポンプ据付			状況写真
			ポンプ運転			状況写真
			ポンプ撤去			状況写真
			機材搬出		○	完了写真
	040	仮橋・仮桟橋工				
			機材搬入（設置時）		○	着手前写真
			導杭打込			状況写真
			導枠設置			状況写真
			杭橋脚打込			状況写真
			コンクリート基礎設置（直接基礎形式の場合）			状況写真
			導枠撤去			状況写真
			導杭引抜			状況写真

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			橋脚設置（直接基礎形式の場合）			状況写真
			杭橋脚設置			状況写真
			足場設置			状況写真
			上部地組・架設			状況写真
			履工板設置			状況写真
			高欄設置			状況写真、出来形管理写真
			足場撤去			状況写真
			機材搬出（設置時）			状況写真
			機材搬入（撤去時）			状況写真
			足場設置			状況写真
			高欄撤去			状況写真
			履工板撤去			状況写真
			上部撤去・解体			状況写真
			足場撤去			状況写真
			杭橋脚撤去			状況写真
			橋脚撤去（直接基礎形式の場合）			状況写真
			杭橋脚引抜き			状況写真
			コンクリート基礎撤去（直接基礎形式の場合）			状況写真
			機材搬出（撤去時）		○	完了写真
河川海岸						
	041	浚渫工--ポンプ式浚渫船				
			回航運搬		○	着手前写真
			仮設受電路設置			状況写真
			土砂埋立地築堤			状況写真
			余水処理施設設置			状況写真
			汚濁防止フェンス設置			状況写真
			排砂管及び受枠等設置			状況写真
			浚渫			状況写真、出来形管理写真
			配土			状況写真
			繁船			状況写真
			排砂管等段取替え			状況写真
			浚渫船移動			状況写真
			排砂管及び受枠等撤去			状況写真
			汚濁防止フェンス撤去			状況写真
			余水処理施設撤去			状況写真
			仮設受電路撤去			状況写真
			回航運搬		○	完了写真
河川維持						
	042	堤防天端補修工				
			機械搬入		○	着手前写真
			不陸整正			状況写真
			補修材敷均し			状況写真
			締固め			状況写真
			機械搬出		○	完了写真
	043	護岸基礎ブロック工				
			床堀		○	状況写真、着手前写真
			プレキャスト基礎ブロック据付			状況写真、出来形管理写真
			目地材設置			状況写真
			基礎ブロック連結			状況写真
			中詰コンクリート投入			状況写真
			埋戻し		○	状況写真
			（段階確認1）		○	確認・立会願、段階確認書
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図、完了写真
砂防						
	044	土工				
			機械搬入		○	着手前写真
			機械掘削作業			状況写真、出来形管理写真
			人力掘削			状況写真、出来形管理写真
			（段階確認1）		○	確認・立会願、段階確認書
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			掘削積込作業			状況写真
			運搬作業			状況写真
			埋戻し（盛土）・集積・捨土処理			状況写真
			機械搬出		○	完了写真

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
	045	コンクリート工				
			打設準備		○	着手前写真
			チッピング（岩盤）			状況写真
			岩盤清掃			状況写真
			型枠工			状況写真
			止水板設置			状況写真
			足場工			状況写真
			コンクリート打設			状況写真
			コンクリート養生			状況写真、出来形管理写真
			（段階確認1）		○	（把握のための資料）
			打継面清掃			状況写真
			堤冠コンクリート打設			状況写真
			堤冠コンクリート養生			状況写真、出来形管理写真
			後片付け		○	状況写真
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図、完了写真
地すべり防止工						
	046	地すべり防止工--集水井工				
			機材搬入		○	着手前写真
			掘削設備組立			状況写真
			掘削		○	機械ボーリング作業日報、状況写真
			排土			状況写真
			土留材設置			状況写真
			昇降用設備設置			状況写真
			掘削設備解体			状況写真
			底版コンクリート解体			状況写真
			井戸蓋設置			状況写真
			防護柵設置			状況写真
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			機材搬出		○	完了写真
	047	地すべり防止工--集排水ボーリング工				
			機材搬入		○	着手前写真
			足場設置			状況写真
			ボーリングマシン据付			状況写真
			削孔	○	○	機械ボーリング作業日報、状況写真
			保孔管加工			状況写真
			保孔管挿入			状況写真
			ドリルパイプ引抜き			状況写真
			ボーリングマシン撤去			状況写真
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			足場撤去			状況写真
			機材搬出		○	完了写真
	048	地すべり防止工--水路工（明暗渠）				
			床堀		○	状況写真、着手前写真
			遮水シート設置			状況写真
			フィルター材設置			状況写真
			吸出し防止材設置			状況写真
			配管据付			状況写真
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			フィルター材設置			状況写真
			埋戻し			状況写真
			基礎			状況写真
			水路布設			状況写真
			埋戻し			状況写真
			表面コンクリート			状況写真
			（出来形管理実測、写真撮影）			出来形管理写真
			（出来形管理記録）	○		測定結果一覧表、出来形管理図
			残土処理		○	状況写真、完了写真

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
	049	地すべり防止工--かご工				
			機材搬入		○	着手前写真
			掘削・盛土			状況写真
			床掛え			状況写真
			基礎工			状況写真
			吸出し防止材設置			状況写真
			かご組立・据付			状況写真
			詰石			状況写真
			蓋設置			状況写真
			埋戻し			状況写真
			機械搬出		○	完了写真
	050	地すべり防止工--集排水ボーリング孔洗浄工（井内作業）				
			機材搬入		○	着手前写真
			機材据付			状況写真
			足場設置			状況写真
			水量計測			状況写真
			孔内洗浄			状況写真
			水量計測			状況写真
			足場撤去			状況写真
			機材撤去			状況写真
			機材搬出		○	完了写真
道路舗装						
	051	路盤工				
			（開始時）			
			着手前写真	○		
			機材搬入	○		状況写真
			不陸整正	○		状況写真
			下層路盤工	○		状況写真
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）			
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（段階確認） －プルーフローリング実施時		○	確認・立会願、段階確認書
			不陸整正	○		状況写真
			上層路盤工	○		状況写真
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）			
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（把握）			
			機材搬出	○		状況写真
			（完了時）			
			完了写真	○		
	052	アスファルト舗装工				
			（開始時）			
			機材搬入	○		状況写真
			表面清掃	○		状況写真
			型枠設置	○		状況写真
			瀝青材料散布	○		状況写真
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			砂散布	○		状況写真
			敷均し・締固め	○		状況写真
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（把握）			
			型枠撤去			

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			アスカーブ設置	○		状況写真
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（把握）			
			機材搬出	○		状況写真
			完了写真	○		
	053	排水性アスファルト舗装工				
			（開始時）			
			着手前写真	○		
			機材搬入	○		状況写真
			表面清掃	○		状況写真
			型枠設置	○		状況写真
			導水パイプ設置	○		状況写真
			瀝青材料散布			
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		状況写真
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			砂散布	○		状況写真
			敷均し・締固め	○		状況写真
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）			
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（把握）			
			型枠撤去	○		状況写真
			排水確認	○		状況写真
			（把握）			
			機材搬出	○		状況写真
			（完了時）			
			完了写真	○		
	054	透水性アスファルト舗装工				
			（開始時）			
			着手前写真	○		
			機材搬入	○		状況写真
			表面清掃	○		状況写真
			型枠設置	○		状況写真
			敷均し・締固め	○		状況写真
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		状況写真
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）			
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（把握）			
			型枠撤去	○		状況写真
			透水確認	○		状況写真
			（把握）			
			機材搬出	○		状況写真
			（完了時）			
			完了写真	○		
	055	コンクリート舗装工				
			（開始時）			
			着手前写真	○		
			アスファルト中間層路盤工	○		状況写真
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○	○	
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			機材搬入	○		状況写真
			型枠設置	○		状況写真

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			舗設機械設置	○		状況写真
			路盤清掃	○		状況写真
			バーアセンブリ設置	○		状況写真
			敷均し・締固め・下層			
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（把握）			
			鉄網・補強鉄筋設置	○		状況写真
			敷均し・締固め・上層	○		状況写真
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（把握）			
			打込目地	○		状況写真
			仕上げ	○		状況写真
			舗設機械撤去	○		状況写真
			養生	○		状況写真
			目地切り・清掃	○		状況写真
			目地材充填	○		状況写真
			型枠撤去	○		状況写真
			（把握）			
			機材搬出			
			（完了時）			
			完了写真	○		
	056	ローラ転圧コンクリート舗装工（RCCP工）				
			（開始時）			
			着手前写真	○		
			路盤工・アスファルト舗装工			
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）			
			出来形管理（写真）	○	○	
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（把握）			
			機材搬入	○		状況写真
			型枠設置	○		状況写真
			敷均し・締固め	○		状況写真
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）			
			出来形管理（写真）	○	○	
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（把握）			
			養生	○		状況写真
			型枠撤去	○		状況写真
			目地切り	○		状況写真
			目地材充填	○		状況写真
			機材搬出	○		状況写真
			（完了時）			
			完了写真	○		
道路付属施設						
	057	防護柵設置工・・・土中建込用（人力施工）				
			（開始時）			
			着手前写真	○		
			中間支柱・堀削	○		状況写真

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			中間支柱・建込み	○		状況写真
			中間支柱・埋戻し	○		状況写真
			端末支柱・堀削	○		状況写真
			端末支柱・建込み	○		状況写真
			端末支柱・基礎コンクリート打設	○		状況写真
			出来形管理（測定）			
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			端末支柱・埋戻し	○		状況写真
			ケーブル張	○		状況写真
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（完了時）			
			完了写真	○		
	058	防護柵設置工・・・土中建込用（機械施工）				
			（開始時）			
			着手前写真	○		
			中間支柱・打込み	○		状況写真
			端末支柱・堀削	○		状況写真
			端末支柱・建込み	○		状況写真
			端末支柱・基礎コンクリート打設	○		状況写真
			出来形管理（測定）			
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			端末支柱・埋戻し	○		状況写真
			ケーブル張	○		状況写真
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（完了時）			
			完了写真	○		
	059	防護柵設置工・・・コンクリート建込用				
			（開始時）			
			着手前写真	○		
			コンクリート基礎	○		状況写真
			中間支柱・建込み	○		状況写真
			充填	○		状況写真
			端末支柱・堀削	○		状況写真
			端末支柱・建込み	○		状況写真
			端末支柱・基礎コンクリート打設	○		状況写真
			端末支柱・埋戻し	○		状況写真
			出来形管理（測定）			
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			ケーブル張	○		状況写真
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（完了時）			
			完了写真	○		
	060	路側工				
			（開始時）			
			着手前写真	○		
			ブロック仮置	○		状況写真
			材料小運搬	○		状況写真
			モルタル製造	○		状況写真
			モルタル敷均し	○		状況写真
			ブロック敷設	○		状況写真
			ブロック目地詰め	○		状況写真
			後片付け	○		状況写真
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（完了時）			
			完了写真	○		
	061	しゃ音壁設置工				
			（開始時）			
			着手前写真	○		
			基礎工	○		状況写真
			支柱アンカー工	○		状況写真
			支柱建込工	○		状況写真
			土留板設置工	○		状況写真
			しゃ音板設置工	○		状況写真
			透光板設置工	○		状況写真
			笠木設置工	○		状況写真
			外装板設置工	○		状況写真
			水切り板設置工	○		状況写真
			出来形管理（測定）			
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（完了時）			
			完了写真	○		
道路維持修繕						
	062	道路除雪工				
			降雪			
			新設除雪	○		状況写真
			歩道除雪	○		状況写真
			凍結防止	○		状況写真
			使用材料確認	○	○	
			（把握）		○	確認・立会願
			待機			
			路面整正	○		状況写真
			拡幅除雪	○		状況写真
			圧雪処理	○		状況写真
			運搬除雪			
			除雪作業日報	○	○	作業内容、気象、道路状況
			運転記録	○	○	
			除雪月報	○	○	
共同溝						
	063	共同溝（1）				
			（開始時）			
			着手前写真	○		
			土留杭設置			状況写真
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			覆工板設置	○		状況写真
			掘削工			状況写真
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（段階確認）		○	確認・立会願、段階確認書
			基礎砕石工			状況写真
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			コンクリート工（均しコンクリート）			状況写真
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			足場・支保工	○		状況写真
			鉄筋工			
			材料確認	○		
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			出来形管理（記録）		○	
			（段階確認）		○	確認・立会願、段階確認書
			型枠工	○		状況写真
			防水工・防水層保護工内防水			状況写真
			出来形管理（測定）	○		状況写真
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			伸縮継手設置			状況写真
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			コンクリート工			状況写真
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）			
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			防水工・防水層保護工外防水			状況写真
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（段階確認）		○	確認・立会願、段階確認書
			埋戻工	○		状況写真
			覆工板撤去	○		状況写真
			土留杭撤去	○		状況写真
			路面復旧			状況写真
			（完了時）			
			完了写真	○		
トンネル工						
	064	トンネル工（NATM）（上半先進ベンチカット工法）				
			（開始時）			
			着手前写真	○		
			機械搬入（上半）	○		状況写真
			掘削工 ・穿孔 ・装薬 ・発破・換気 ・ずり出し	○		状況写真
			（把握）−施工状況			
			（段階確認）		○	確認・立会願、段階確認書
			支保工（上半）			
			・一時吹付コンクリート			
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）			
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			・鋼製支保建込			
			・金網取付			
			・二次吹付コンクリート			
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）			
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			・ロックボルト打設			
			品質管理（材料試験）	○		
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○	○	
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（把握）−施工状況			

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			（段階確認）		○	確認・立会願、段階確認書
			掘削工（下半） ・穿孔 ・装薬 ・発破・換気 ・ずり出し	○		状況写真
			（把握）-施工状況			
			支保工（下半）			
			・一時吹付コンクリート			
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			・鋼製支保建込			
			・金網取付			
			・二次吹付コンクリート			
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○	○	
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			・ロックボルト打設			
			品質管理（材料試験）	○		試験成績表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○	○	
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（把握）-施工状況			
			（段階確認）		○	確認・立会願、段階確認書
			防水シート張			
			（把握）-施工状況			
			覆工			
			品質管理（材料試験）	○		
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（把握）-施工状況			
			（段階確認）		○	確認・立会願、段階確認書
			機械搬出	○		状況写真
			（完了時）			
			完了写真	○		
橋梁						
	065	橋台・橋脚工				
			（開始時）			
			着手前写真	○		
			床堀	○		状況写真
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（段階確認）		○	確認・立会願、段階確認書
			杭頭処理	○		状況写真
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（段階確認）		○	確認・立会願、段階確認書
			基礎材敷設転圧	○		状況写真
			均しコンクリート型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生	○		状況写真
			出来形管理（測定）	○		

大別	NO	工種	作業分類	請負者における資料作成状況		資料名（文書、写真）
				作成・保管	作成・提出	
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			足場・支保設置	○		状況写真
			鉄筋加工・組立			
			材料確認	○	○	
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（段階確認）		○	確認・立会願、段階確認書
			型枠製作・設置	○		状況写真
			コンクリート打設・養生	○		状況写真
			品質管理（材料試験）	○		試験成果表
			品質管理（写真）	○		
			品質管理（記録）		○	品質管理表
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（把握）		○	確認・立会願
			型枠撤去			
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			（段階確認）		○	確認・立会願、段階確認書
			足場・支保撤去	○		状況写真
			埋戻し	○		状況写真
			資機材搬出	○		状況写真
			（完了時）			
			完了写真	○		
	066	鋼橋架設工				
			（開始時）			着手前写真
			着手前写真			
			機材搬入	○		状況写真
			登り桟橋	○		状況写真
			沓仮置	○		状況写真
			（段階確認）			確認・立会願、段階確認書
			地組立			
			本締前の確認結果		○	設計との適合の確認結果
			（段階確認）			確認・立会願、段階確認書
			主桁架設			
			出来形管理（測定）	○		
			出来形管理（写真）	○		
			出来形管理（記録）		○	出来形管理表
			足場設置	○		状況写真
			防護設置			
			ボルト本締			
			締付けボルト軸力試験	○		試験成果表
			沓据付	○		状況写真
			落橋防止装置取付	○		状況写真
			足場又は防護工撤去	○		状況写真
			機材搬出	○		状況写真
			（完了時）			
			完了写真	○		

巻末資料 1-3　フローチャートによる帳票の流れの整理結果（工事全体）

凡例

監督職員 通知書	帳票（鑑以外）、資料
工事打合簿	帳票（鑑帳票を着色して区分）
作成	作業（帳票の作成を伴う作業）
受領確認	作業（帳票の授受を伴う作業）
近接工区連絡体制の調整	作業（その他、帳票の作成・授受を伴わない作業）
協議	発注者−請負者間の協議
報告	帳票の流れ（行為）
重要？ Y N	分岐（条件によって作業が分岐するポイント）
工事カルテ作成、登録（105）へ	コネクタ（離れたプロセスを接続するポイント）

フローチャートによる帳票の流れの整理結果（工事全体）

作業分類（レベル2）	発注者	発注者−請負者間の書類の授受	請負者	備考

発注者：支出担当官／物品管理官／契約担当官／総括監督員／主任監督員／監督員

(1)工事開始手続（工事請負契約書の工事着手30日に必要な諸手続き等）【工事契約～14日】

101 契約締結

- 発注者：作成 → 設計図書 → 保管
- 発注者−請負者間の書類の授受：通知 → 契約書 → 契約締結通知書
- 請負者：受領確認 → 保管
- 備考：
  - ・特記仕様書
  - ・設計時調査資料
  - ・施工図
  - ・現場説明書
  - ・数量総括表

102 監督職員等通知

- 発注者：作成 → 監督職員通知書 → 保管／保管
- 発注者−請負者間の書類の授受：通知 → 工事打合簿（監督職員通知書）
- 請負者：受領確認 → 保管

103 現場代理人及び主任技術者等

- 発注者：確認 → 報告 → 確認 → 報告 → 受領確認 → 報告 → 受領確認 → 保管／保管
- 発注者−請負者間の書類の授受：工事打合簿（現場代理人等通知書、経歴書）提出
- 請負者：作成 → 保管
- 請負者：確認(適合の場合) → 工事カルテ作成、登録（105）へ

104 品質証明

- 発注者：確認 → 報告 → 確認 → 報告 → 受領確認 → 保管
- 発注者−請負者間の書類の授受：工事打合簿（現場代理人等通知書、経歴書）提出
- 請負者：作成 → 保管

105 工事カルテ作成、登録（工事契約後10日以内）

- 発注者：受領確認 → 保管／保管
- 発注者−請負者間の書類の授受：工事打合簿（工事カルテ）提出
- 請負者：現場代理人及び主任技術者等（103）から → 作成 → 保管
- 請負者：確認(適合の場合) → CORINS登録
- 発注者：受領確認 → 保管／保管
- 発注者−請負者間の書類の授受：工事打合簿（工事カルテ受領書）提出
- 請負者：保管
- 備考：CORINS登録（500万円以上）

106 建設副産物情報交換システム（登録）

- 発注者：確認 → 報告 → 確認 → 報告 → 受領確認 → 保管
- 発注者−請負者間の書類の授受：工事打合簿（システム登録資料）報告
- 請負者：作成 ← 建設副産物情報交換システム登録 → 保管

107 建設発生土情報交換システム（登録）

- 発注者：確認 → 報告 → 確認 → 報告 → 受領確認 → 保管
- 発注者−請負者間の書類の授受：工事打合簿（システム登録資料）報告
- 請負者：作成 ← 建設発生土情報交換システム登録 → 保管

108 請負代金内訳書及び工事費構成書（契約後14日以内）

- 発注者：確認 → 報告 → 確認 → 報告 → 受領確認 → 報告 → 受領確認 → 保管／保管
- 発注者−請負者間の書類の授受：工事打合簿（請負代金内訳書(FD)）提出
- 請負者：作成 ← 請負代金内訳書データベースシステム登録 → 保管
- 備考：契約書第3条に規定された場合に受注者が請負代金内訳書を契約後14日以内に提出

- 発注者：受領確認 → 保管
- 発注者−請負者間の書類の授受：工事打合簿 提示
- 請負者：作成 → 保管
- 備考：（条件：請負代金が1億以上で、6ヶ月を超える工期の場合、内訳書提出後に総括監督員に対して提出を求める）

- 発注者：作成 → 提出 → 受領確認 → 保管
- 発注者−請負者間の書類の授受：工事費構成書（工事打合簿）提出
- 請負者：受領確認 → 保管

109 前払金請求手続（契約プロセス）

- 請負者：保証契約（契約プロセス）から → 作成 → 保管
- 発注者−請負者間の書類の授受：前払金請求書 提出
- 発注者：請負代金の支払い（702）へ

作業分類(レベル2)	発注者	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考

支出担当官 / 物品管理官 / 契約担当官 / 総括監督員 / 主任監督員 / 監督員

(2)施工準備(施工計画立案に必要な準備・調整事項)【工事契約～30日、及び箇所別施工前】

201 設計図書照査



202 工事測量

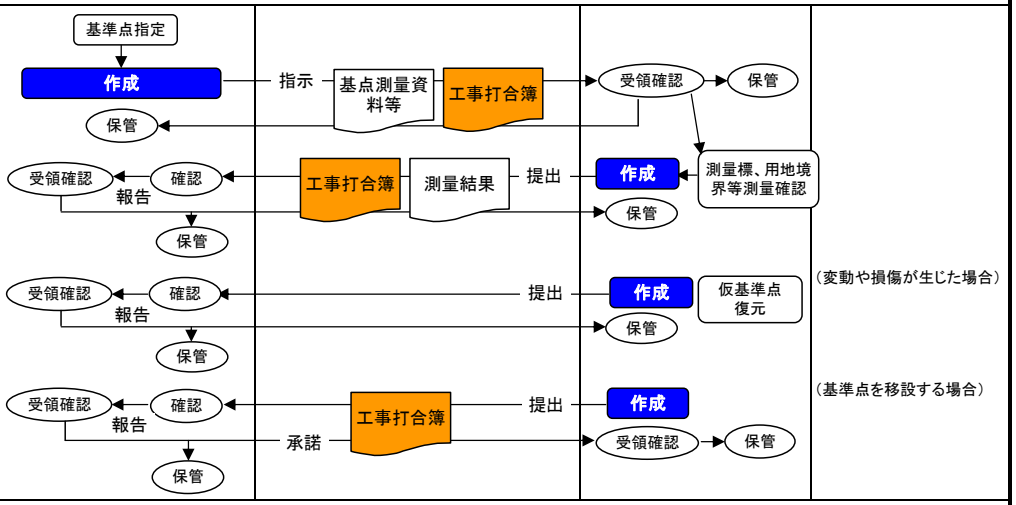

203 施工体制台帳



下請負額3000万円以上の時

204 請負者相互の協力



205 保険の付保及び事故の補償



(建設業退職金共済制度に該当する場合)

206 官公庁等への手続等

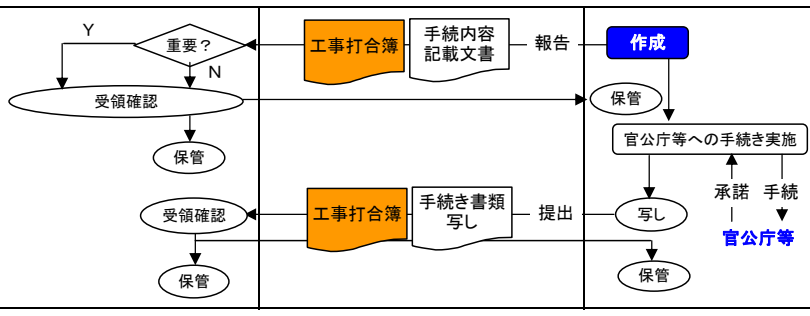

207 支給材料及び貸与物件(支給材料及び貸与品)

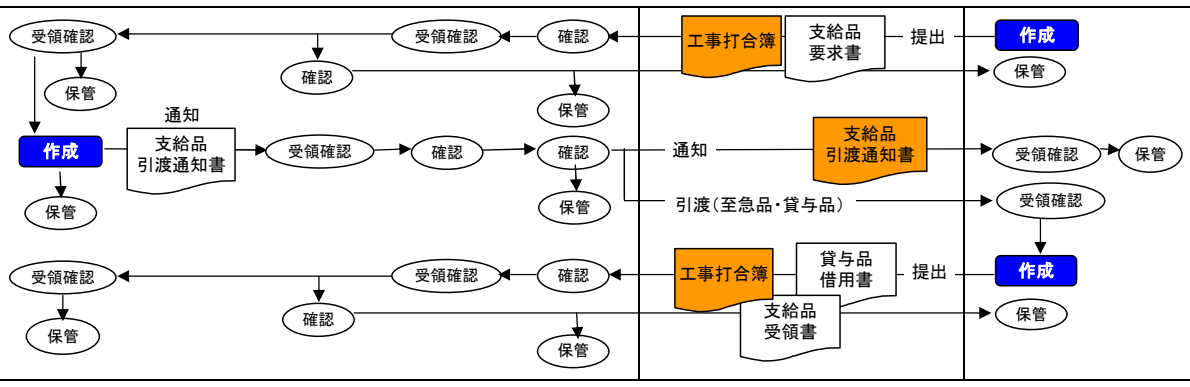

208 支給材料及び貸与物件受領(建設機械借用)



209 監督職員による検査(確認)及び立会等(品質管理-工事材料)

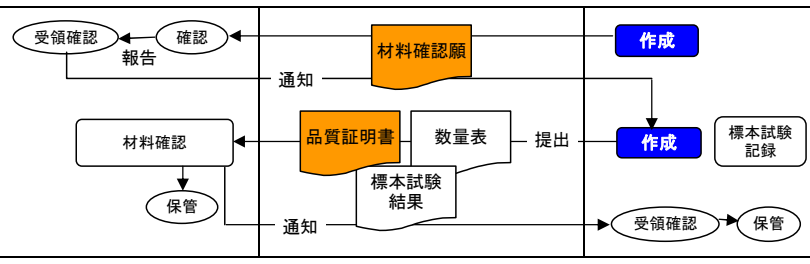

210 工事用地等の使用



作業分類(レベル2)	発注者	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
	支出担当官 / 物品管理官 / 契約担当官 / 総括監督員 / 主任監督員 / 監督員			
(3)施工計画【工事契約～30日、及び箇所・工種別施工計画】				
301 施工計画書作成	受領確認 ← 確認 ← 確認 (報告 / 報告) → 保管	工事打合簿 / 施工計画書 提出	作成 → 保管	各計画(工事基本、組織、工程、品質、安全・衛生、環境、資材、機械、労務、施工方法、再資源利用、交通管理)の検討、作成
(4)工事施工、施工管理【工事契約　30日(最遅)～、及び箇所・工種別施工管理】				
401 本工事	**別途(巻末資料1-4参照)**			・工種別施工フロー ・段階確認 ・出来形管理 ・品質管理 ・受発注者間確認行為 ・その他
402 安全管理	受領確認 ← 確認 ← 確認 (報告 / 報告) → 保管	工事打合簿 / 施工計画書 提出	作成 → 保管	安全教育 安全訓練計画
	受領確認 → 保管	工事打合簿 / 記録資料 提出	作成 → 保管	安全施策 実施報告
	受領確認 ← 確認 ← 確認 (報告 / 報告) → 保管 → 占用者全体立会 管理者明確化 → 保管	工事打合簿 / 確認・立会願 報告	作成 → 保管	(監督職員の請求があった場合) (不明の地下埋設物を発見した場合)
	受領確認 ← 確認 ← 確認 (報告 / 報告) → 保管	工事打合簿 / 調査資料 報告	作成 → 保管	物件位置、深さ調査 (地下埋設物件等が予想される場合)
	受領確認 ← 確認 ← 確認 (報告 / 報告) → 保管	工事打合簿 / 調査資料 報告	作成 → 保管	応急措置 補修 関係機関連絡 (地下埋設物等に損害を与えた場合)
	受領確認 → 保管	工事打合簿 提出	作成 → 保管	交通安全等輸送に関する計画 (交通安全輸送に関する計画)
403 環境管理	Y 重要？ N → 受領確認 → 保管	工事打合簿 報告	作成 ← 応急措置 → 保管	(環境への影響が予知または発生した場合)
	指示 → 保管	工事打合簿	受領確認 → 保管	
	Y 重要？ N → 受領確認 → 保管	工事打合簿 報告	作成 ← 対応 → 保管	(環境問題に関する苦情発生の場合)
	指示 → 保管	工事打合簿	受領確認 → 保管	
	協議確認	協議	協議	(排出ガス対策型施工機械を使用し難い場合)
	受領確認 ← 確認 ← 確認 (報告 / 報告) → 保管	工事打合簿 提出	作成 → 保管	通知
	受領確認 → 保管	建設機械写真 報告	作成 ← 写真撮影 → 保管	(環境対応型建設機械を使用する場合)
404 工程管理	受領確認 → 保管	工事打合簿 / 進捗状況表 / 工事工程表 提出	作成 ← 進捗状況 → 保管	
	把握 指示 → 保管	工事打合簿	受領確認 → 保管	
	受領確認 → 保管	工事打合簿 報告	作成 → 保管	(休日、夜間に作業を行う場合)
	受領確認 ← 受領確認 ← 確認 ← 確認 (報告 / 報告) → 保管	工事打合簿 / 変更工事工程表 提出	作成 → 保管	(工事工程の変更を行う場合)

作業分類(レベル2)	発注者	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
	支出担当官 / 物品管理官 / 契約担当官 / 総括監督員 / 主任監督員 / 監督員			
405 品質管理	受領確認 / 確認 / 報告 / 保管	工事打合簿 / 品質管理記録 / 提出 / 提示	作成 / 標本試験記録 / 保管 / 作成 / 保管	品質管理基準に定める試験項目に対して実施 完成検査時までに監督職員に提出 監督職員から請求があった場合に提示
406 品質管理-工事材料-立会「監督職員による検査(確認)及び立会等」	受領確認 / 確認 / 報告 / 材料確認(立会) / 保管	確認・立会願 / 通知 / 提出 / 品質証明書 / 標本試験結果 / 数量表 / 提出	作成 / 作成 / 保管	品質管理基準に定める試験項目に対して実施
407 出来形管理	受領確認 / 確認 / 報告 / 保管	工事打合簿 / 出来形管理記録 / 提出 / 提示	作成 / 検測 写真撮影 / 保管 / 作成 / 保管	出来形管理基準に定める測定項目に対して実施 完成検査時までに監督職員に提出 監督職員から請求があった場合に提示
408 出来形管理-段階確認「監督職員による検査(確認)及び立会等」	受領確認 / 確認 / 報告 / 確認(現場) / 保管 / 通知	段階確認書 / 提出 / 通知 / 出来形管理表 / 出来形管理図 / 提出 / 測定結果一覧表 / 通知	作成 / 作成 / 受領確認 / 保管	出来形管理基準に定める測定項目に対して実施
409 工事の一時中止	作成 / 通知 / 確認 / 確認 / 確認 / 工事の中止について / 保管 / 受領確認 / 確認 / 確認 / 報告 / 報告 / 保管	通知 / 工事の中止について / 工事打合簿 / 工事打合簿 / 維持管理に関する基本計画書 / 提出	受領確認 / 保管 / 工事中止 / 作成 / 保管	
410 工事の再開通知	作成 / 通知 / 確認 / 確認 / 確認 / 工事の再開について / 保管	通知 / 工事の再開について / 工事打合簿	受領確認 / 保管 / 工事再開	
411 設計図書の変更	作成 / 通知 / 確認 / 確認 / 確認 / 設計図書の変更について / 保管	指示 / 変更指示書 / 工事打合簿	受領確認 / 保管	発注者が設計図書の変更を行う
412 工期変更	協議 / 受領確認 / 確認 / 報告 / 保管 / 確認 / 提出 / 作成 / 契約変更等決議書 / 保管 / 保管 / 受領確認 / 受領確認 / 確認 / 確認 / 報告 / 報告 / 保管 / 保管	工期変更協議 / 工事打合簿 / 提出 / 通知 / 工期変更協議対象確認通知書 / 工期延期願 / 変更工程表 / 提出 / 変更日数算出根拠	協議 / 作成 / 保管 / 受領確認 / 保管 / 作成 / 保管	
413 契約変更	確認 / 提出 / 作成 / 契約変更等措置請求及び契約変更等決議書 / 保管 / 保管 / 受領確認 / 記名押印 / 作成 / 保管	通知 / 契約変更等通知及び協議書 / 現場説明 / 変更現場説明書 / 工事請負変更契約書(案) / 変更見積書 / 提出 / 通知 / 契約締結通知書 / 契約請書 / 契約書	受領確認 / 保管 / 受領確認 / 保管 / 記名押印 / 作成 / 受領確認 / 保管	

作業分類(レベル2)	発注者	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
	支出担当官 / 物品管理官 / 契約担当官 / 総括監督員 / 主任監督員 / 監督員			
414 建設副産物	協議確認 / 受領確認 / 保管 / 承諾 / 工事打合簿 / 提出 / 産業廃棄物管理票 / 施工計画書 / 再生資源利用計画書 / 施工計画書 / 再生資源利用促進計画書	協議 / 提出	協議 / 本体工事 指定仮設工事 / 作成 / 設計図書に明示の / 受領確認 / 保管 / 処理確認	(発生材料を工事に用いる場合) / (産業廃棄物が搬出される工事の場合) / (土砂、採石、加熱アスファルト混合物を搬入する場合) / (建設発生土、コンクリート塊等または建設混合廃棄物を搬出する場合)
415 工事履行報告	受領確認 / 確認 / 報告 / 保管	工事履行報告書 / 提出	作成 / 工事履行 / 保管	月毎提出
	受領確認 / 確認 / 報告 / 保管	工事履行報告書 / 請求内訳書 / 提出	作成 / 工事履行 / 保管	指定部分払い、又は既済部分払い確認請求を行う場合
416 部分払い請求	受領確認 / 確認 / 報告 / 保管 / 検査命令書 / 技術検査(604)へ / 認定 / 通知 / 作成 / 認定調書 / 請負代金の支払い(702)へ	請負工事既済部分検査請求書 / 提出 / 通知 / 認定調書 / 中間前払金請求書 / 提出	作成 / 工事履行 / 保管 / 受領確認 / 作成	
417 部分使用	作成 / 通知 / 工事の部分使用について(協議) / 受領確認 / 確認 / 報告 / 保管 / 検査命令書 / 技術検査(604)へ / 承認	通知 / 工事の部分使用について(協議) / 工事の部分使用について(承諾) / 指定部分引渡書 / 指定部分完成通知書 / 提出 / 通知 / 工事の部分使用について(承諾)	受領確認 / 保管 / 作成	
418 建設機械使用実績報告	受領確認 / 確認 / 報告 / 保管	建設機械使用実績報告書 / 提出	作成 / 工事履行 / 保管	建設機械が貸与されている場合(月毎提出)
419 監督職員の変更	監督職員変更通知書 / 作成 / 通知 / 受領確認 / 確認 / 保管	通知 / 監督職員変更通知書 / 工事打合簿	受領確認 / 保管	
420 現場代理人及び主任技術者等の変更	受領確認 / 確認 / 報告 / 保管	工事打合簿 / 現場代理人等変更通知書 / 経歴書 / 提出	作成 / 保管 / 工事カルテ変更登録(422)へ	
421 品質証明の変更	受領確認 / 確認 / 報告 / 保管	工事打合簿 / 現場代理人等変更通知書 / 経歴書 / 提出	作成 / 保管	

作業分類(レベル2)	発注者	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
	支出担当官 / 物品管理官 / 契約担当官 / 総括監督員 / 主任監督員 / 監督員			
422 工事カルテ変更登録	受領確認→保管	工事打合簿 工事カルテ 提出	現場代理人及び主任技術者等の変更(420)から 作成→保管	CORINS登録(500万円以上)
	確認(適合の場合)		CORINS登録	
	受領確認→保管	工事打合簿 工事カルテ受領書 提出	保管	
423 建設副産物情報交換システム(入力・変更)	受領確認←報告←確認←報告←確認 →保管	工事打合簿 システム登録資料 報告	作成←建設副産物情報交換システム入力 →保管	
424 建設発生土情報交換システム(入力・変更)	受領確認←報告←確認←報告←確認 →保管	工事打合簿 システム登録資料 報告	作成←建設発生土情報交換システム入力 →保管	
425 事故報告書	受領確認←受領確認←報告←確認←報告←確認 →保管	事故発生報告書 提出	作成→保管	
426 天災等による損害発生時	受領確認←受領確認←報告←確認←報告←確認 →保管	天災その他の不可抗力による損害の通知について 被災内訳及び内容確認書 提出	作成→保管	
	決議→作成 通知 受領確認→確認→確認 →保管	通知 天災その他不可抗力による損害の確認の通知について 被災内訳及び内容確認書	受領確認→保管	
	受領確認→保管 決議→作成	天災その他の不可抗力による損害額について(請求) 損害額内訳書 提出	作成→保管	
		通知 天災その他の不可抗力による損害の協議の通知について	受領確認→承諾	
	受領確認←受領確認←報告←確認←報告←確認 →保管 承認→作成→保管	天災その他の不可抗力による損害の協議の通知について 損害額承諾書 提出	作成→保管	
	請負代金の支払い(702)へ	通知 天災その他の不可抗力による損害額について(通知) 支払い請求書 提出	受領確認→保管 作成→保管	
(5)精算				
501 支給材料及び貸与物件受領(建設機械返納)	受領確認←受領確認←報告←確認←報告←確認 →保管	建設機械返納書 機械引渡	作成←工事引渡 →保管	建設機械を貸与した場合
502 支給品精算	受領確認←受領確認←報告←確認←報告←確認 →保管	支給品精算書 支給品返還	作成←工事引渡 →保管	
503 支給材料精算	受領確認←受領確認←報告←確認←報告←確認 →保管	支給材料受払簿 提出	作成←工事引渡 →保管	
504 現場発生品引渡し	受領確認 受領確認←受領確認←報告←確認←報告←確認 →保管	現場発生品調書 現場発生品引渡	作成←工事引渡 →保管	指示された場所で引渡し

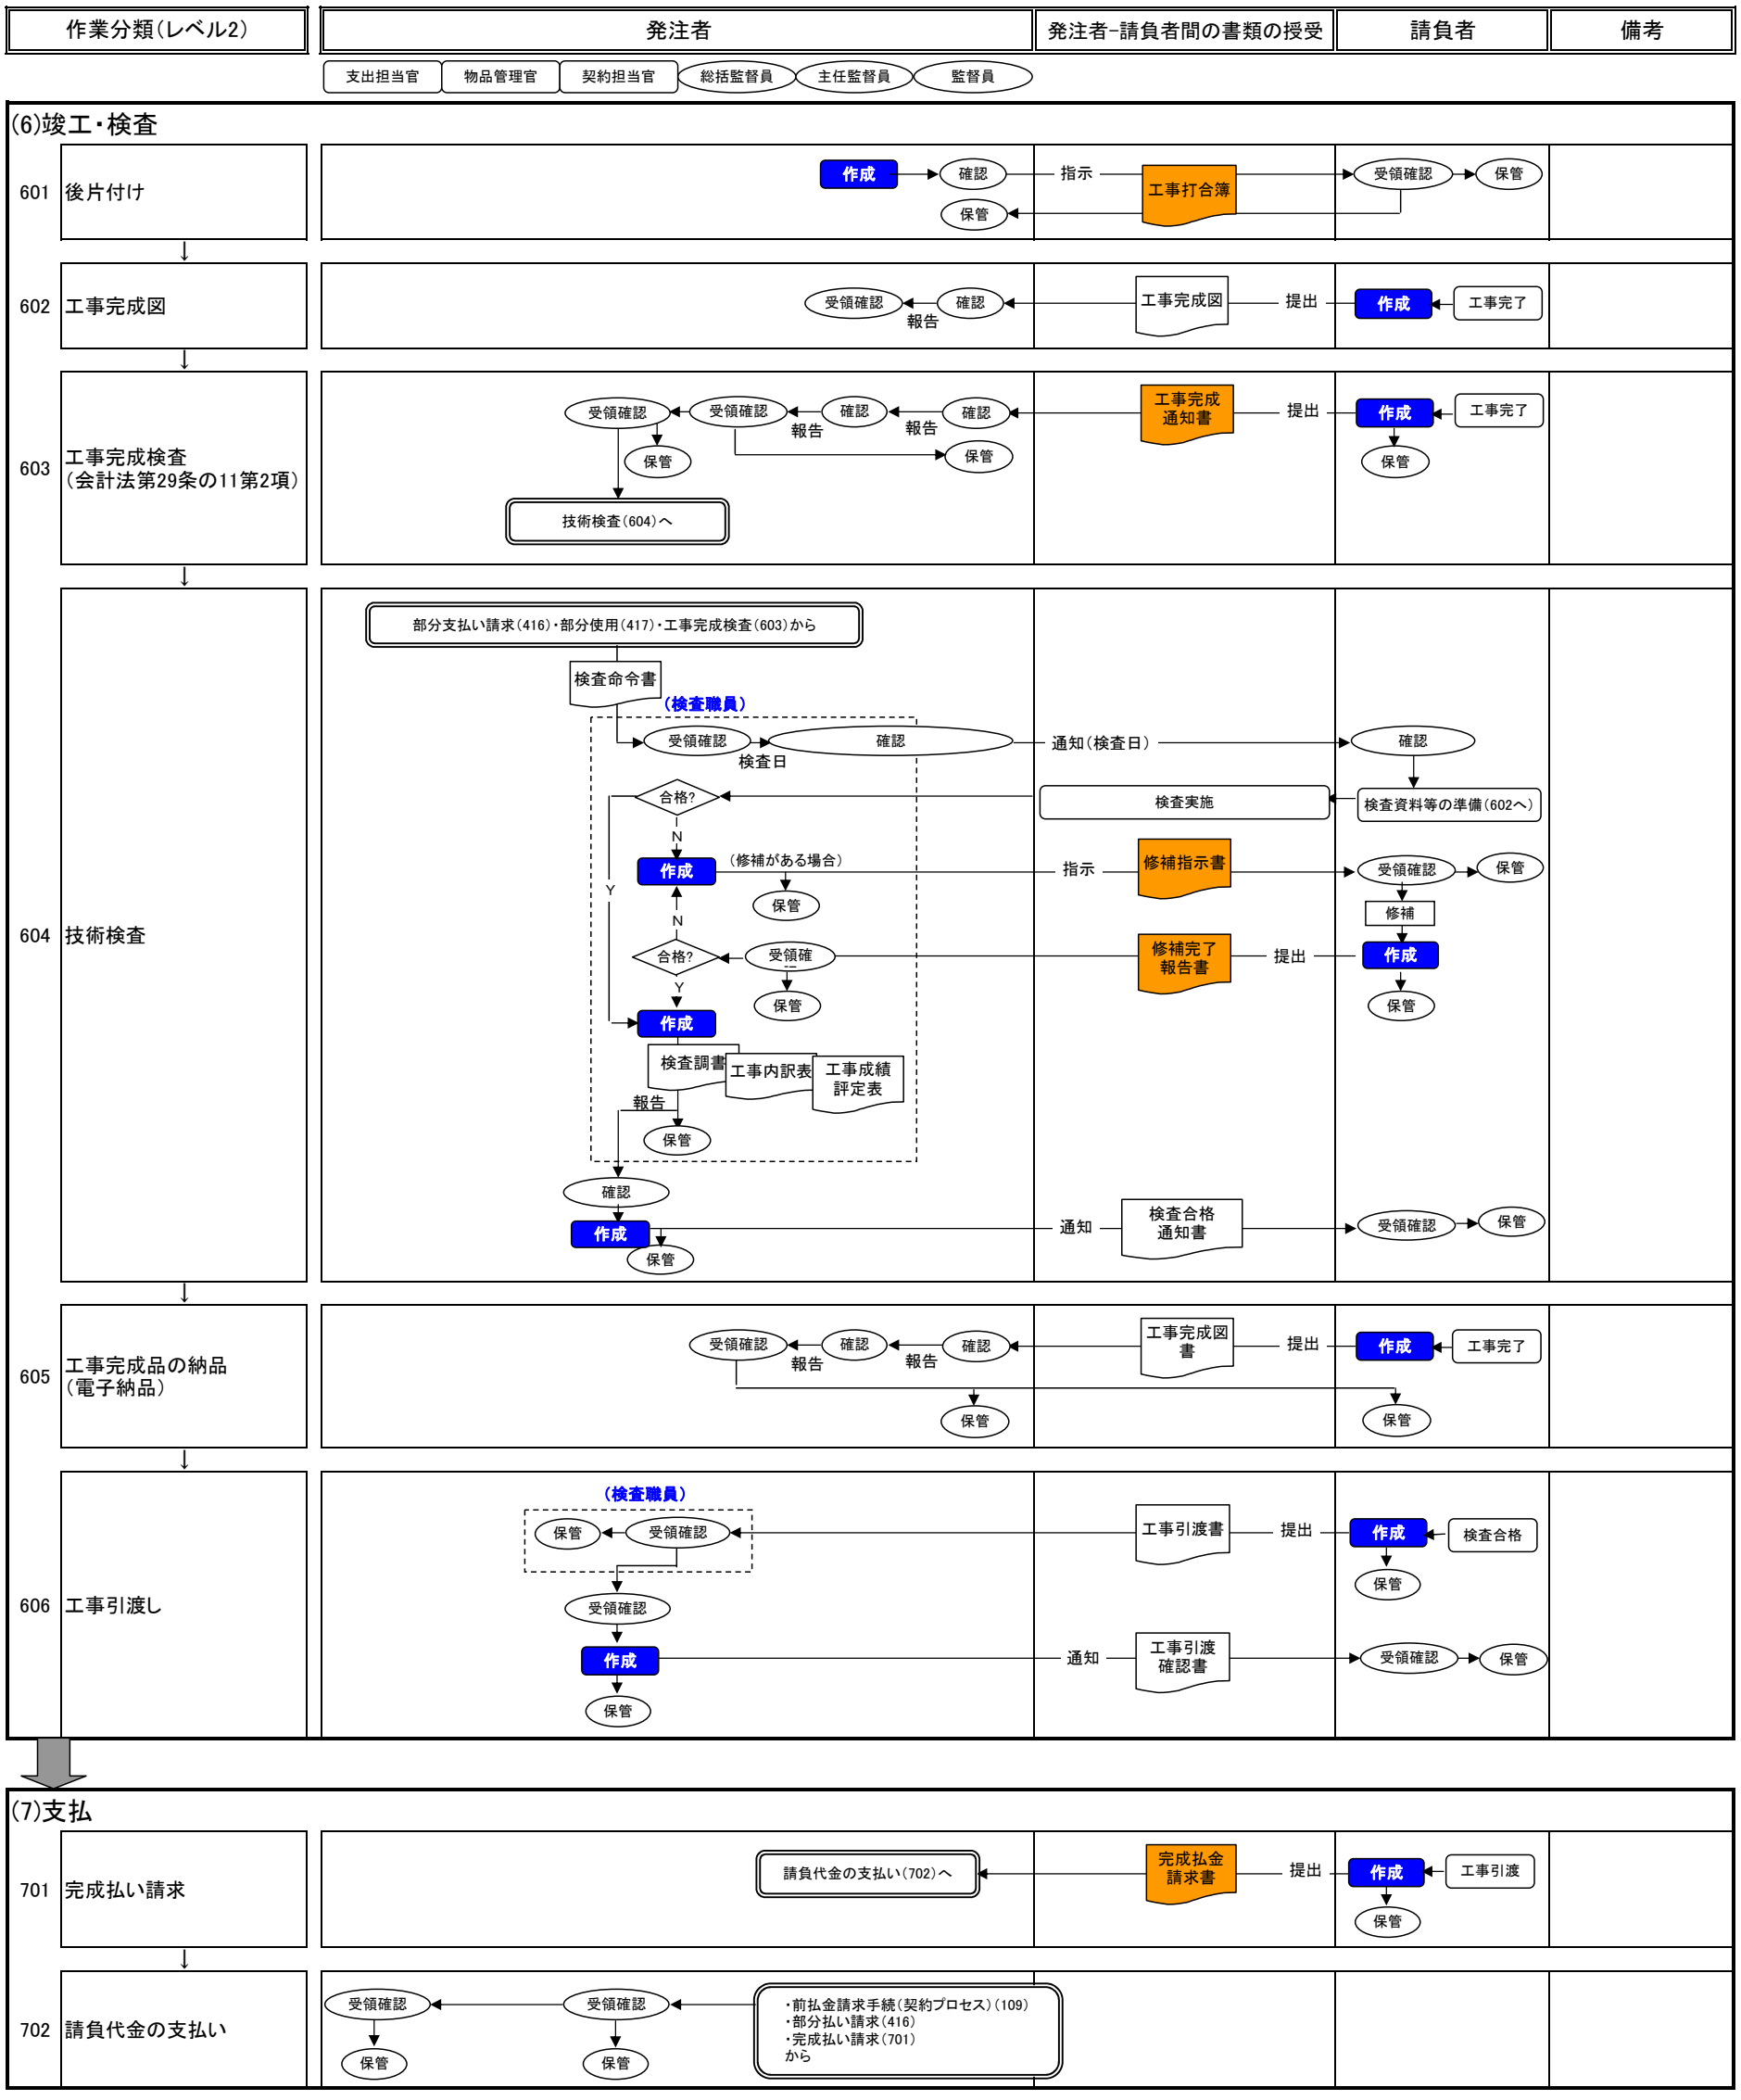
作業分類(レベル2)
発注者
発注者-請負者間の書類の授受
請負者
備考
支出担当官
物品管理官
契約担当官
総括監督員
主任監督員
監督員
(6)竣工・検査
601 後片付け
作成
確認
保管
指示
工事打合簿
受領確認
保管
602 工事完成図
受領確認
報告
確認
工事完成図
提出
作成
工事完了
603 工事完成検査
(会計法第29条の11第2項)
受領確認
受領確認
報告
確認
報告
確認
保管
保管
技術検査(604)へ
工事完成
通知書
提出
作成
工事完了
保管
604 技術検査
部分支払い請求(416)・部分使用(417)・工事完成検査(603)から
検査命令書
(検査職員)
受領確認
確認
検査日
通知(検査日)
確認
検査資料等の準備(602へ)
検査実施
合格?
N
作成
(修補がある場合)
保管
指示
修補指示書
受領確認
保管
修補
Y
N
合格?
受領確
保管
修補完了
報告書
提出
作成
保管
Y
作成
検査調書
工事内訳表
工事成績
評定表
報告
保管
確認
作成
保管
通知
検査合格
通知書
受領確認
保管
605 工事完成品の納品
(電子納品)
受領確認
報告
確認
報告
確認
保管
工事完成図
書
提出
作成
工事完了
保管
606 工事引渡し
(検査職員)
保管
受領確認
受領確認
作成
保管
工事引渡書
提出
作成
検査合格
保管
通知
工事引渡
確認書
受領確認
保管
(7)支払
701 完成払い請求
請負代金の支払い(702)へ
完成払金
請求書
提出
作成
工事引渡
保管
702 請負代金の支払い
受領確認
保管
受領確認
保管
・前払金請求手続(契約プロセス)(109)
・部分払い請求(416)
・完成払い請求(701)
から

巻末資料 1-4 フローチャートによる帳票の流れの整理結果（工種別）

凡　例

	帳票、資料
	帳票（鑑帳票を着色して区分）
	作業
	作業（帳票の作成を伴う作業を着色して区分）
	発注者−請負者間の協議（利用する書類含む）
	帳票の流れ（行為）
	分岐（条件によって作業が分岐するポイント）
	書類提出・提示時に説明を伴う場合

※ 工種ごとに付されている番号（例：No.001）は、「表3−6 調査対象工種一覧」（共通仕様書から抽出した工種）の番号と一致する。

河川土工・海岸土工・砂防土工(No.001)－1／3

『掘削工』

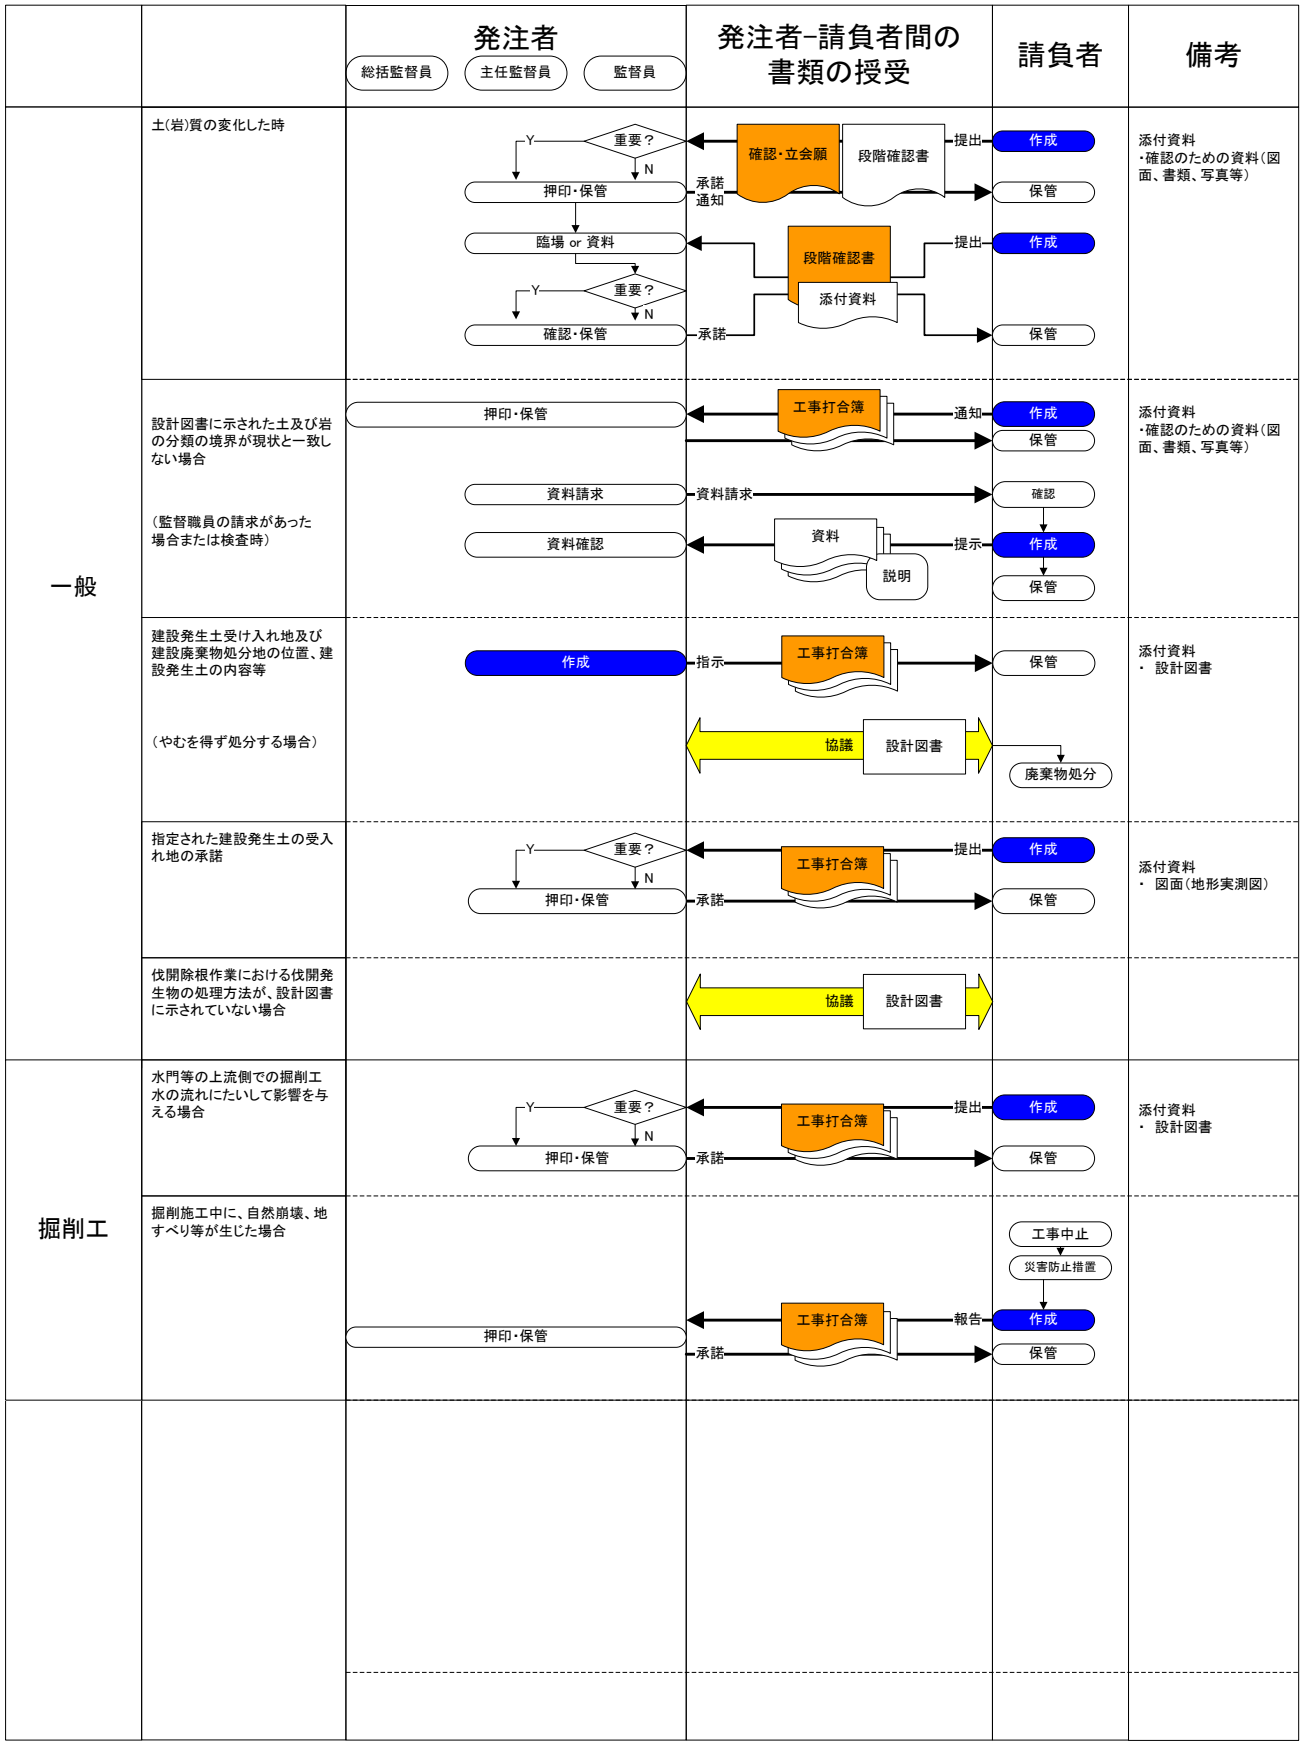

河川土工・海岸土工・砂防土工(No.001)－2／3

『盛土工』

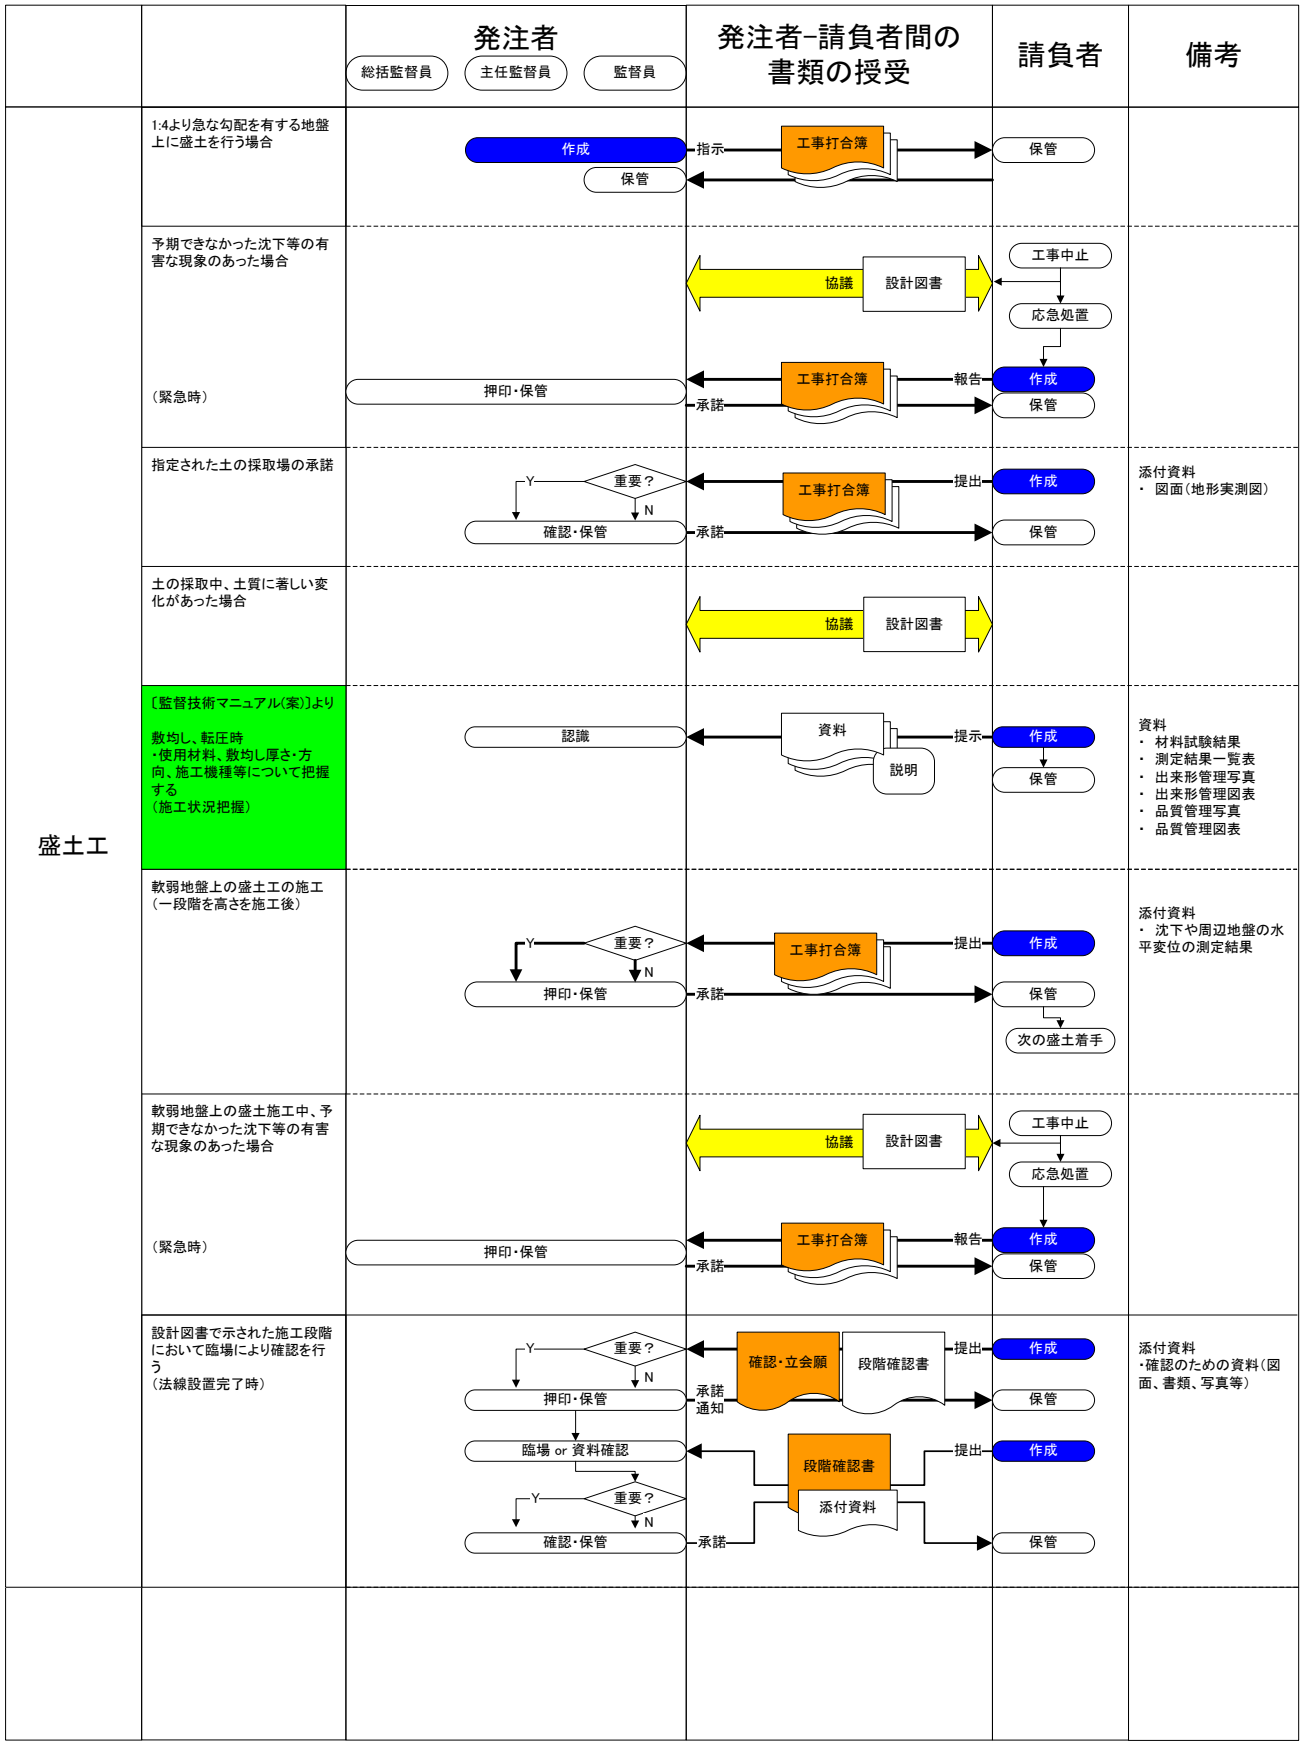

河川土工・海岸土工・砂防土工(No.001)－3／3

『盛土補強工、法面整形工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
盛土補強工	盛土材のまきだしに先立ち、予定している盛土材料の確認および設計図書に関する承諾	重要？ Y N 押印・保管	工事打合簿 提出 承諾	作成 保管	添付資料 ・設計図書
	基盤面の排水処理工		協議 設計図書		
	面状補強材の内継ぎ目をやむを得ず設ける場合		協議 設計図書		
	設計図書に示された方法で補強材を設置することが困難な場合		協議 設計図書		
	盛土に先行して組み立てられる壁面工が2段を越える場合	重要？ Y N 押印・保管	工事打合簿 提出 承諾	作成 保管	添付資料 ・設計図書
	壁面工や隅角部の締め堅めにおいて、設計図書や各補強工法のマニュアルに従い難い場合		協議 設計図書		
	壁面の直線性や変形について許容値を超える壁面変位が観測された場合		協議 設計図書	工事中止	
法面整形工	浮き石が大きく取り除くことが困難な場合		協議 設計図書		
	崩壊、湧水、軟弱地盤等の不良箇所の法面整形		協議 設計図書		

補足：【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。

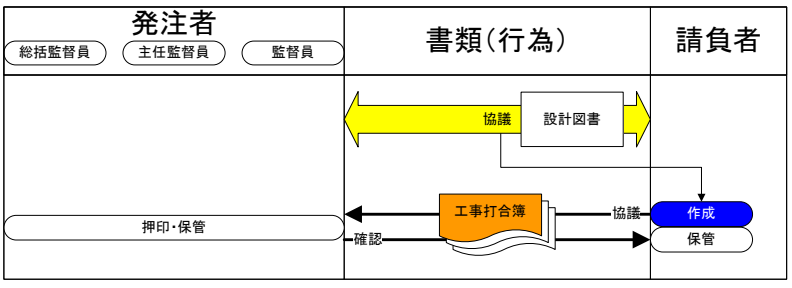

道路土工(No.002)－1／2

『掘削工（切土工）、路体盛土工』

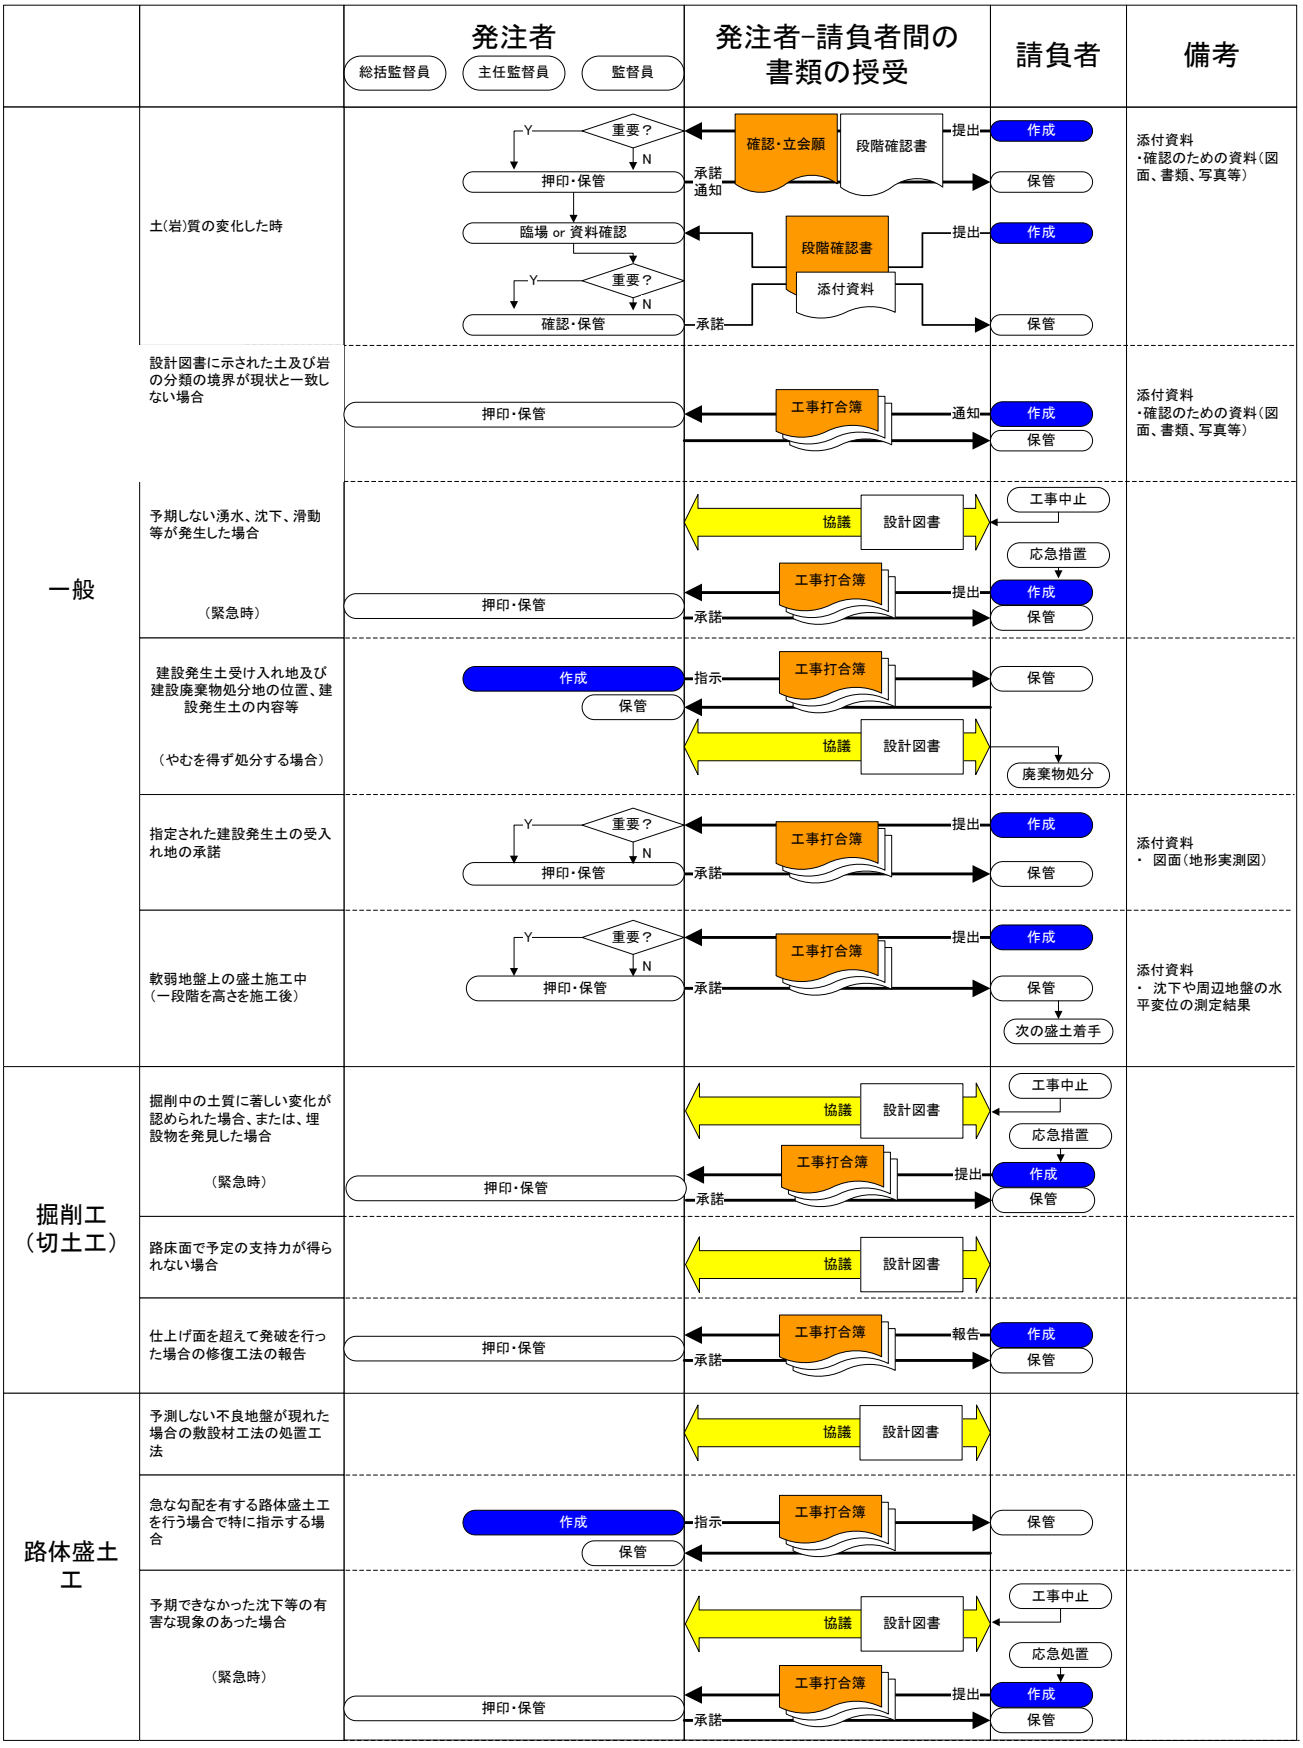

道路土工(No.002)－2／2

『路体盛土工、路床盛土工、法面整形工』

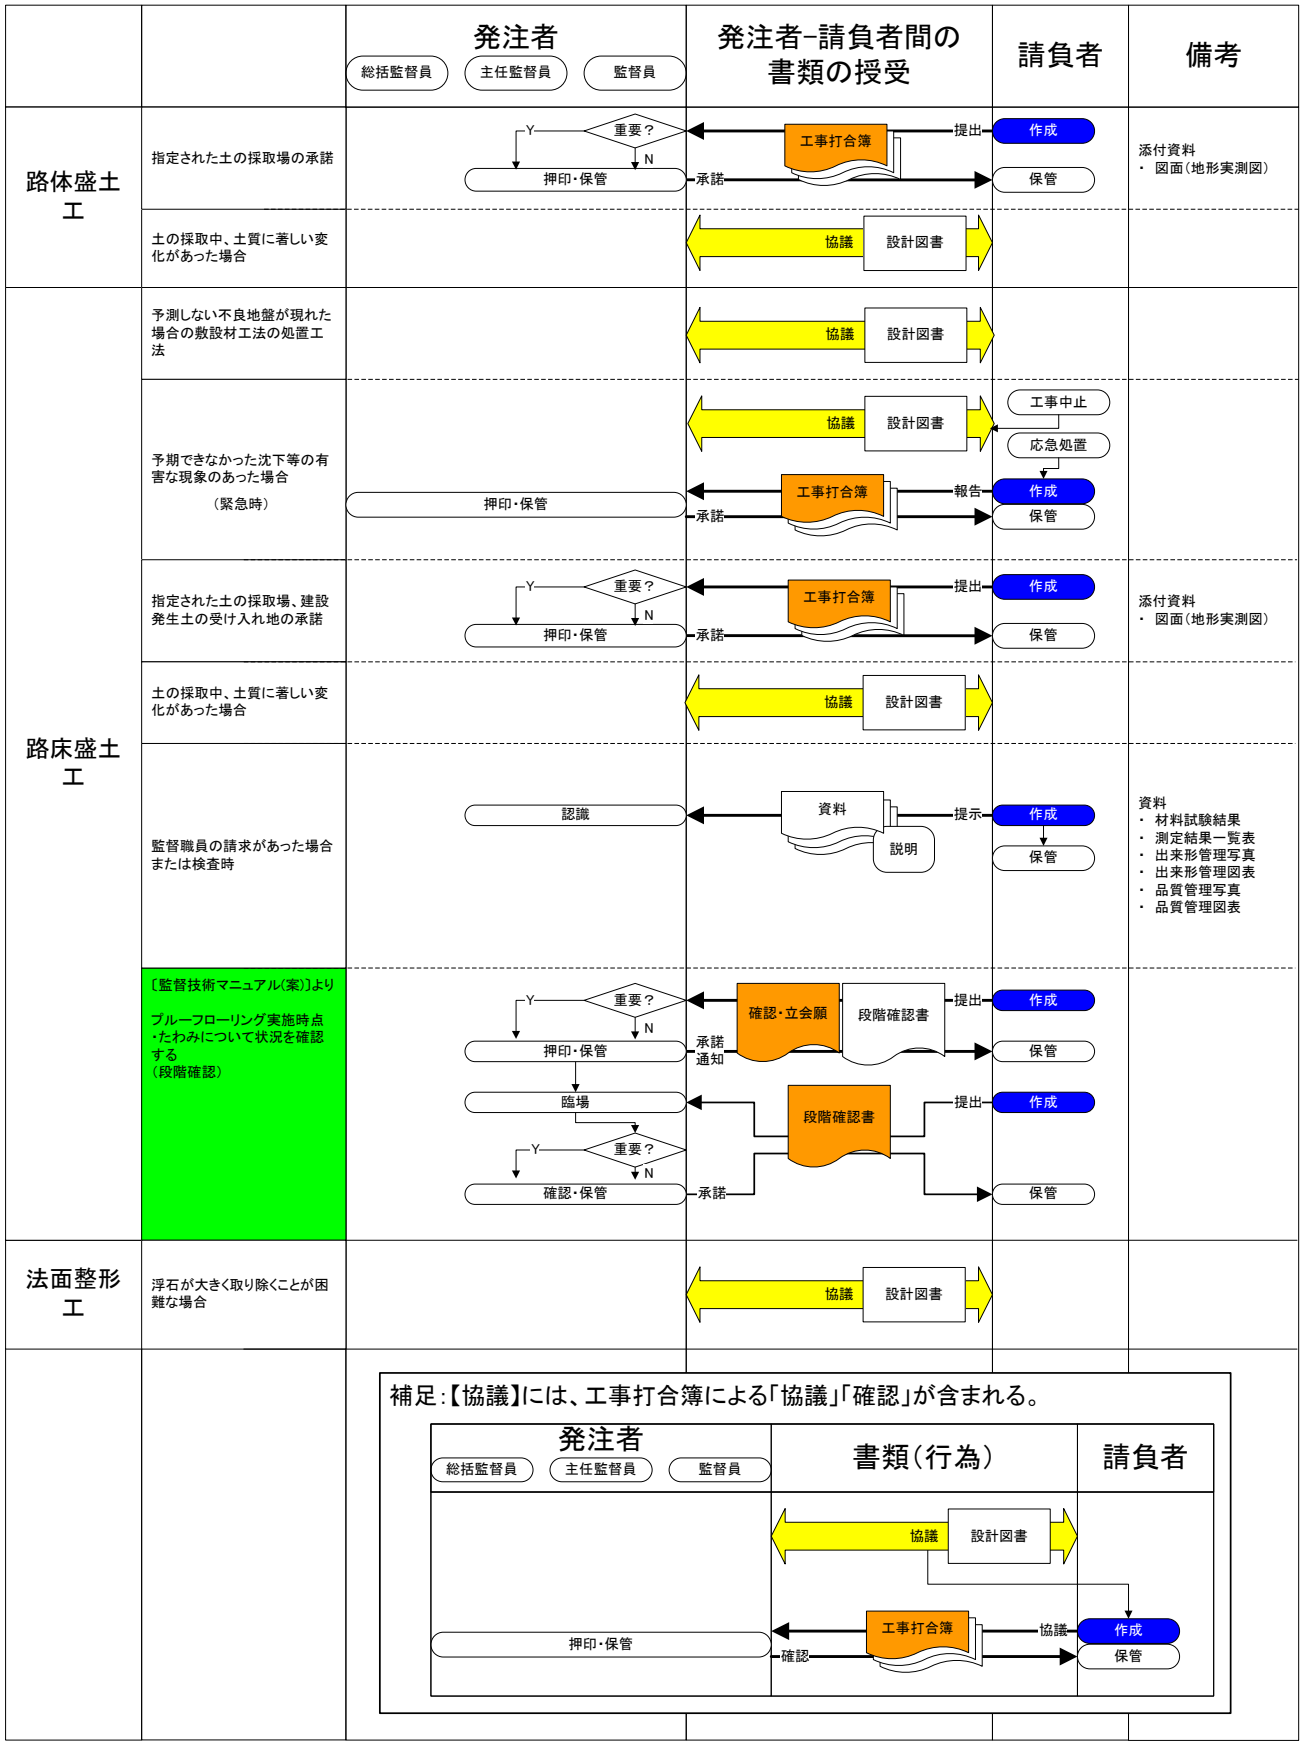

レディーミクストコンクリート(No.003)

『工場の選定、配合』

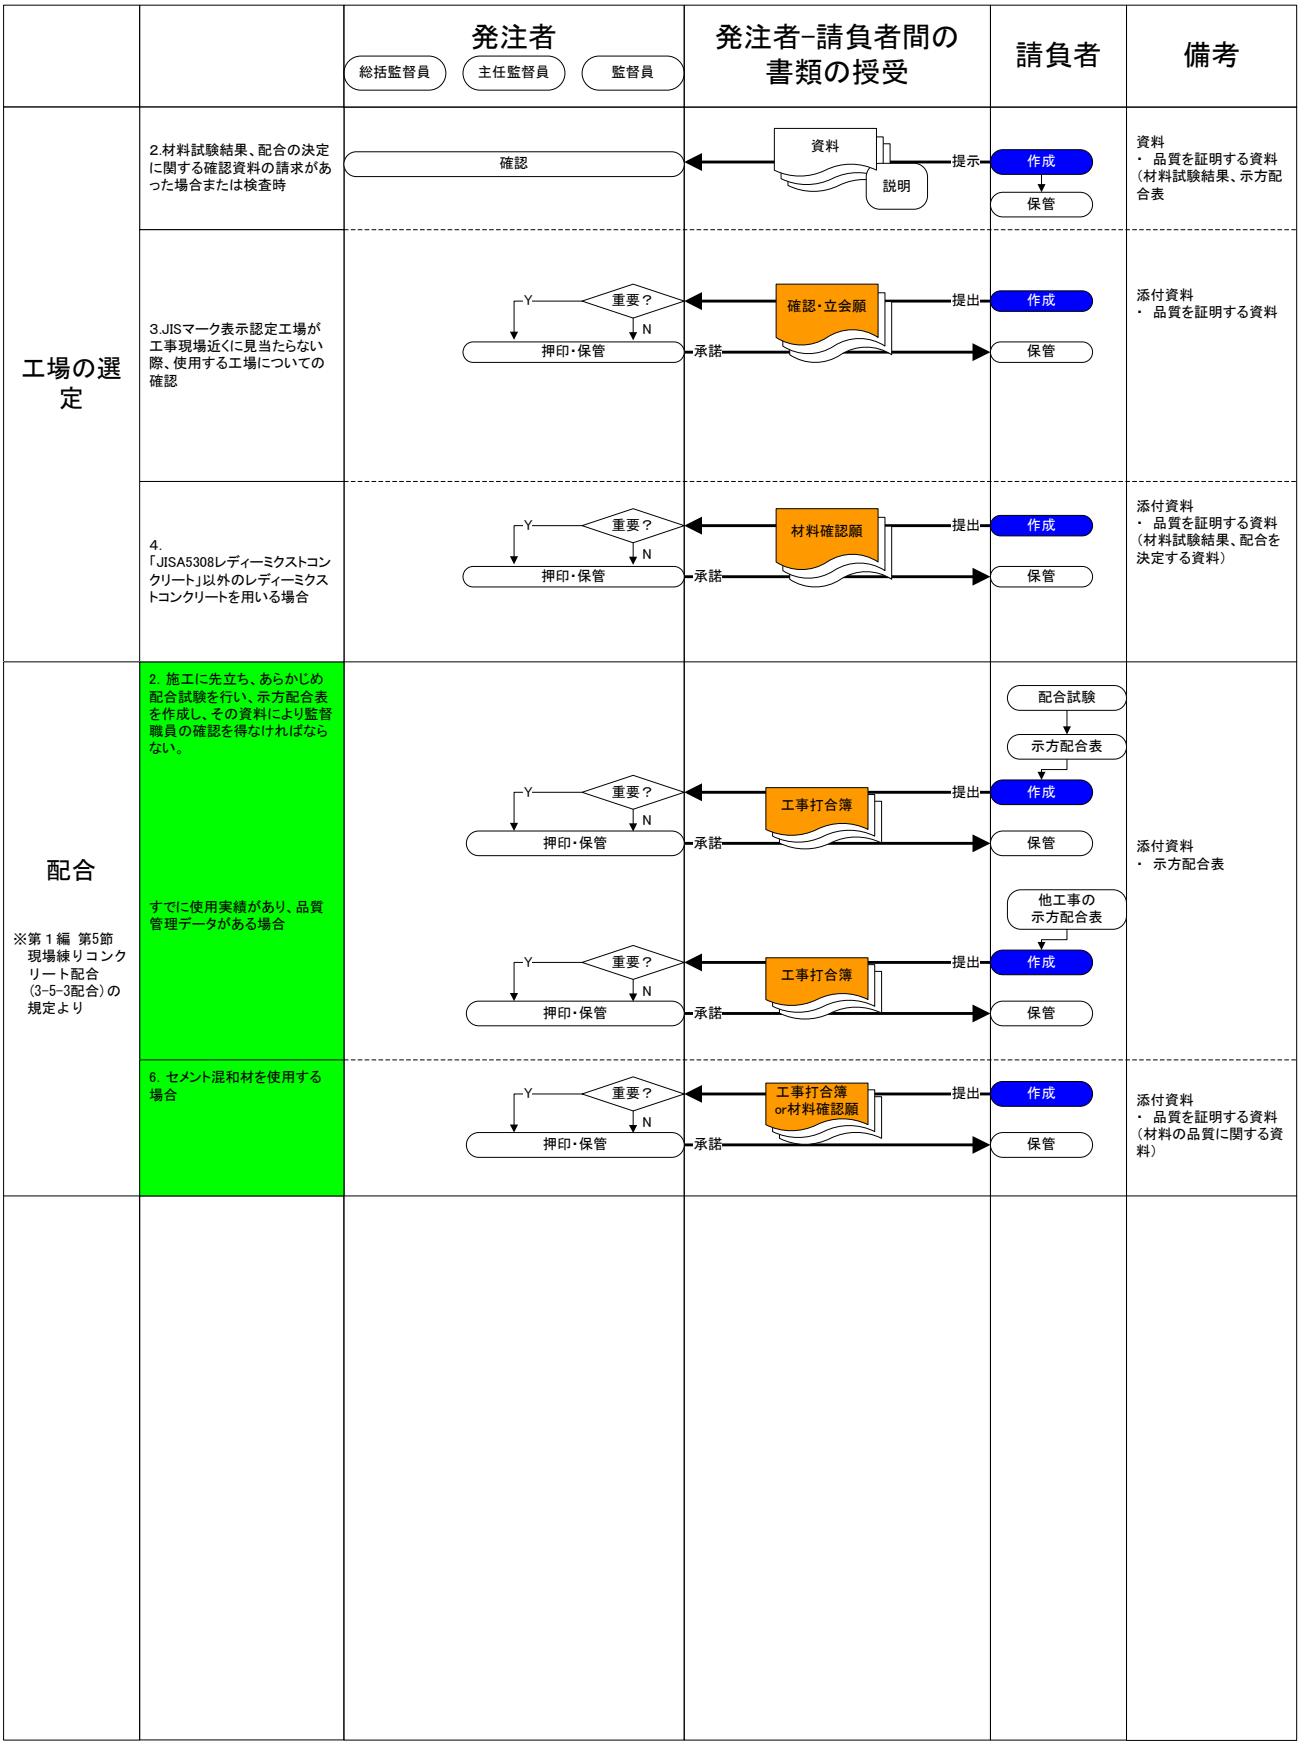

運搬・打設(No.006)

『運搬、打設、打継目、養生』

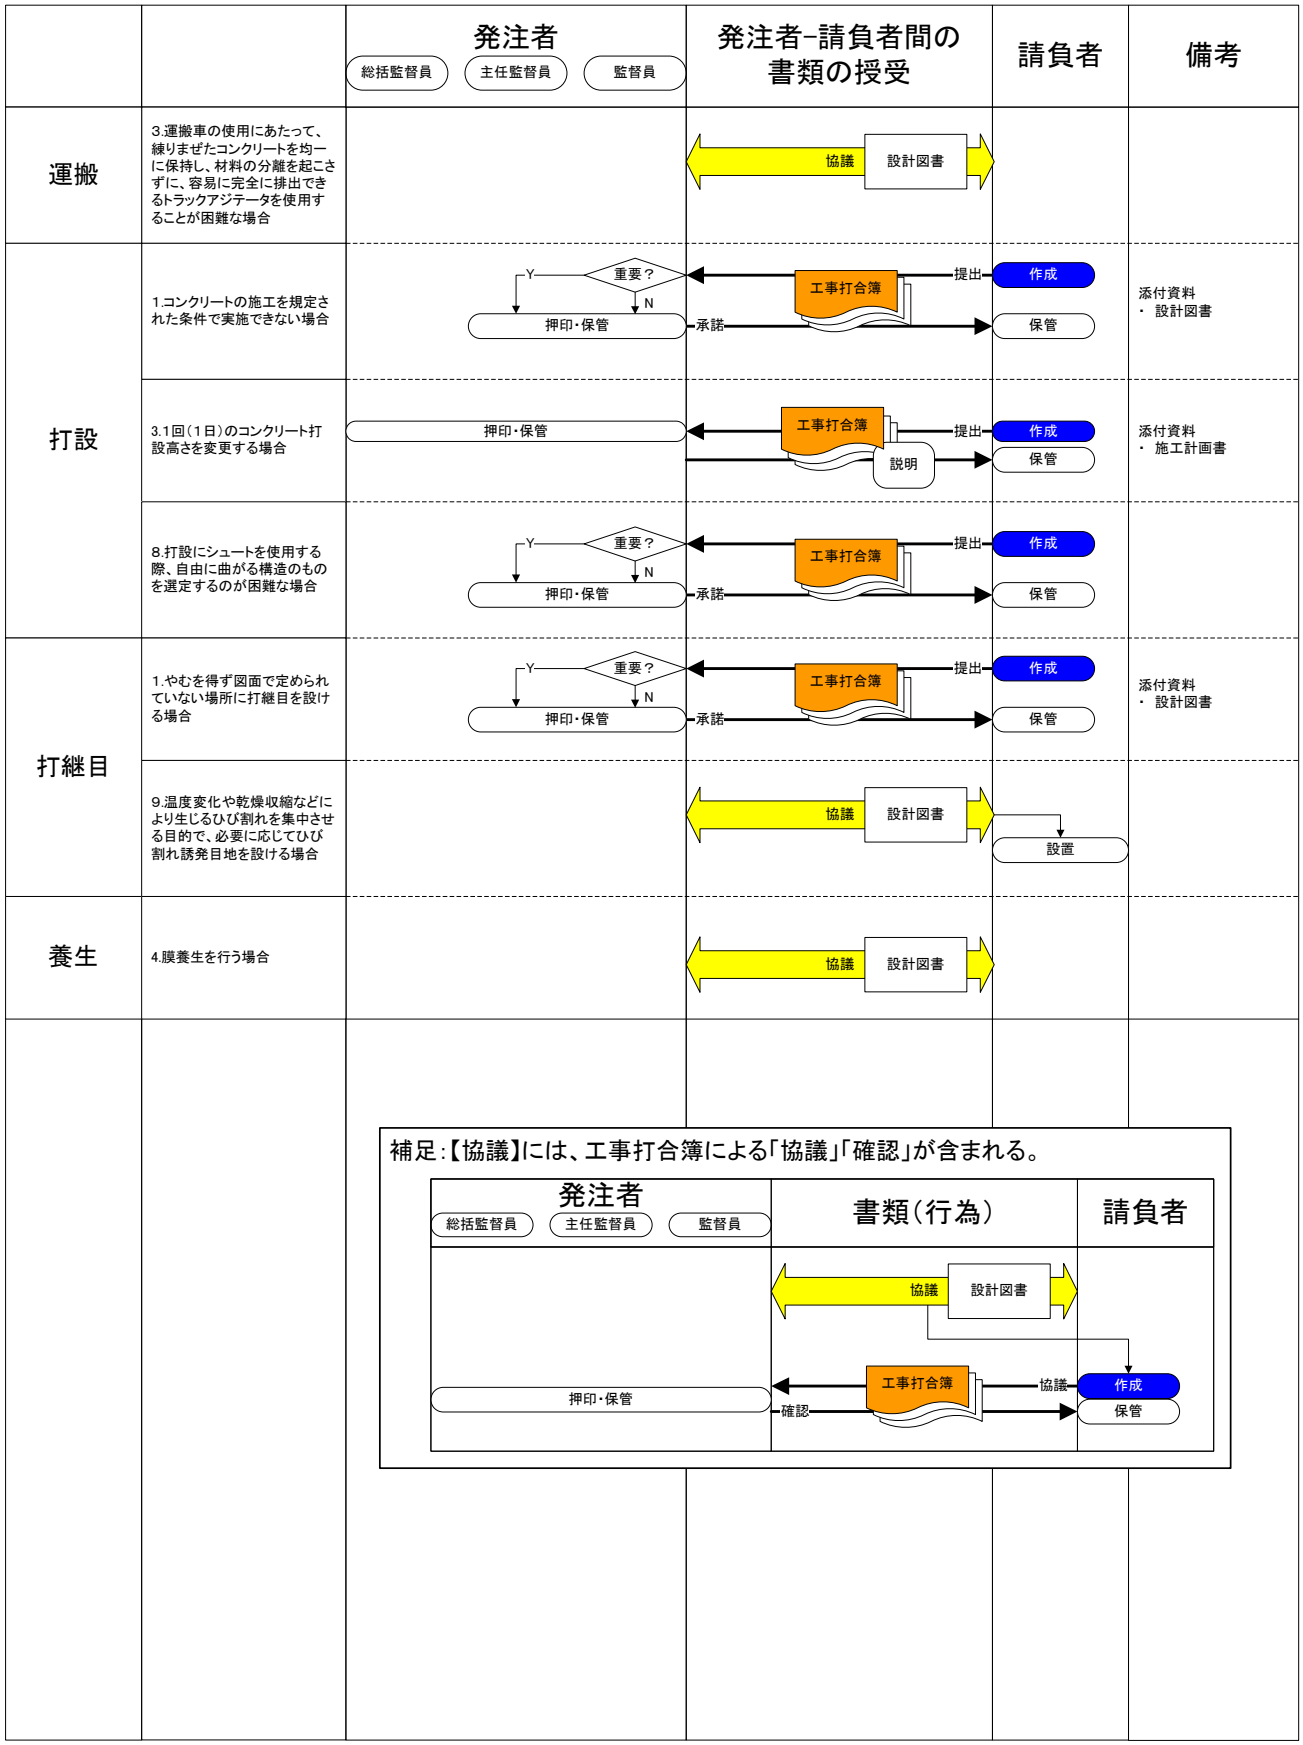

鉄筋工(No.007)

『加工、組立、継手、ガス圧接』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者−請負者間の書類の授受	請負者	備考
一般	2.施工前に、配筋図、鉄筋組立図、及びかぶり詳細図により組立可能か、 また配力鉄筋および組立筋を考慮したかぶりとなっているかを照査し、不備を発見した時				添付資料 ・ 事実が確認できる資料
加工	2.調査・試験及び確認資料に関して監督職員の請求があった場合または検査時				添付資料 ・ 調査・試験及び確認資料
組立	3.型枠に接するスペーサーについてはコンクリート製あるいはモルタル製で本体コンクリートと同等以上の品質を有するものを使用するのが困難な場合				添付資料 ・ 品質が確認できる資料
	設計図書に示された施工段階において臨場により確認を行う (重要構造物等の鉄筋組立て時)				添付資料 ・確認のための資料(図面、書類、写真等)
継手	1.設計図書に示されていない鉄筋の継手を設ける時				添付資料 ・ 設計図書
	4.鉄筋の継手にねじふし鉄筋継手、ねじ加工継手、溶接金属充填継手、モルタル充てん継手、自動ガス圧接継手、エンクローズ溶接継手などを用いる場合				添付資料 ・ 品質を証明する資料
ガス圧接	1.ガス圧接の施工方法を、熱間押し抜き法とする場合				添付資料 ・ 設計図書 ・ 技術者取得資格証明書の写し
	2.鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どおりに施工できない場合				

補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。

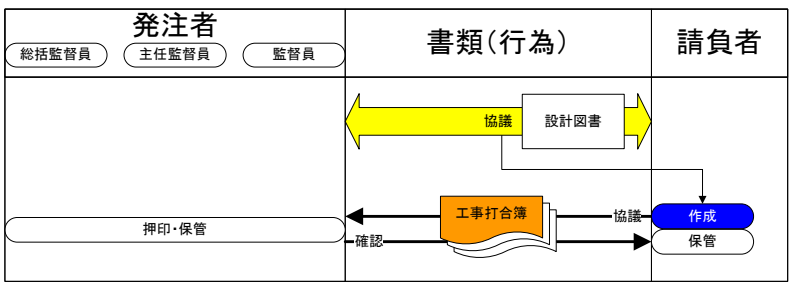

型枠・支保(No.008)

『構造、組立て、取外し』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
		発注者-請負者間の書類に関する記載無し			

作業土工（床掘り・埋戻し）(No.016)

『作業土木工（床堀り・埋戻し』

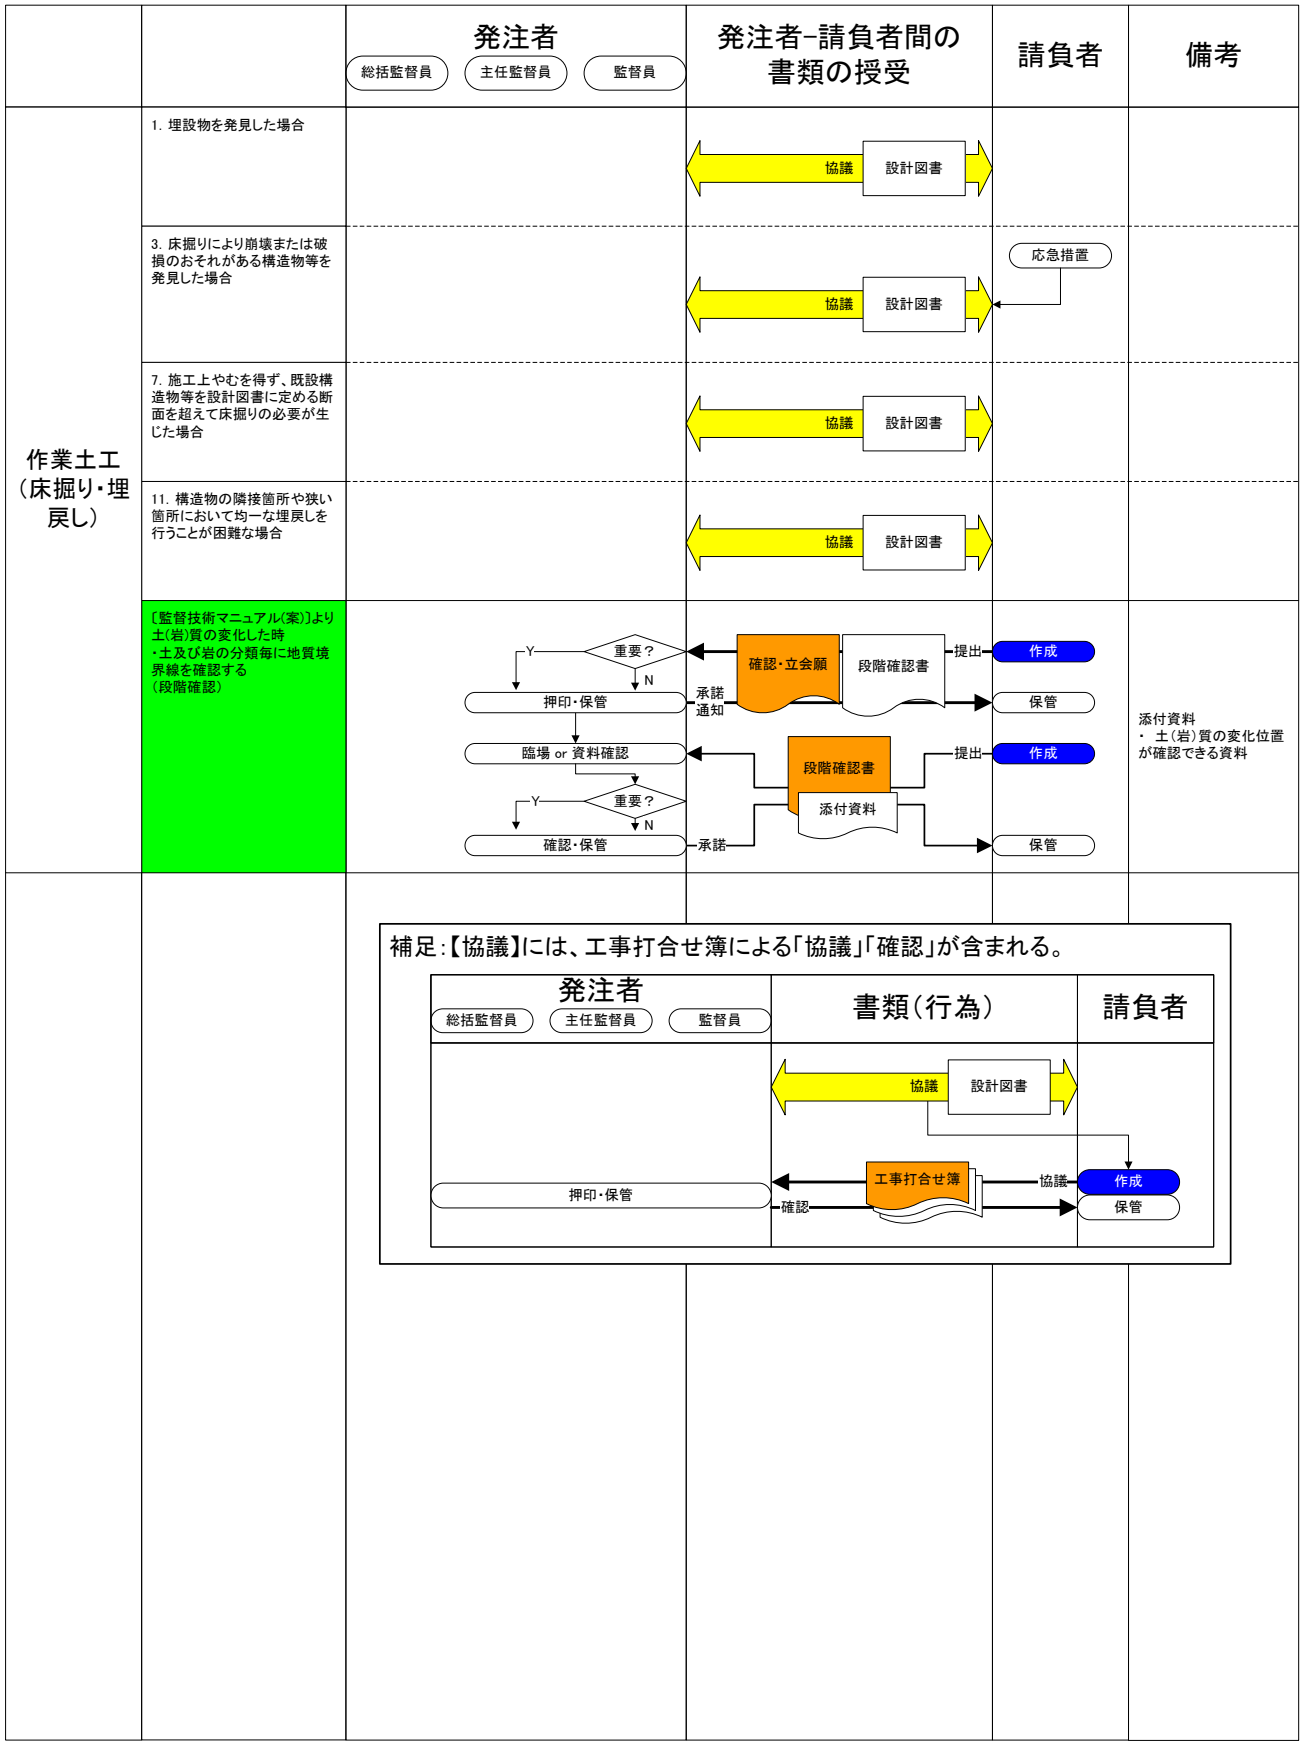

矢板工(No.017)

『矢板工』

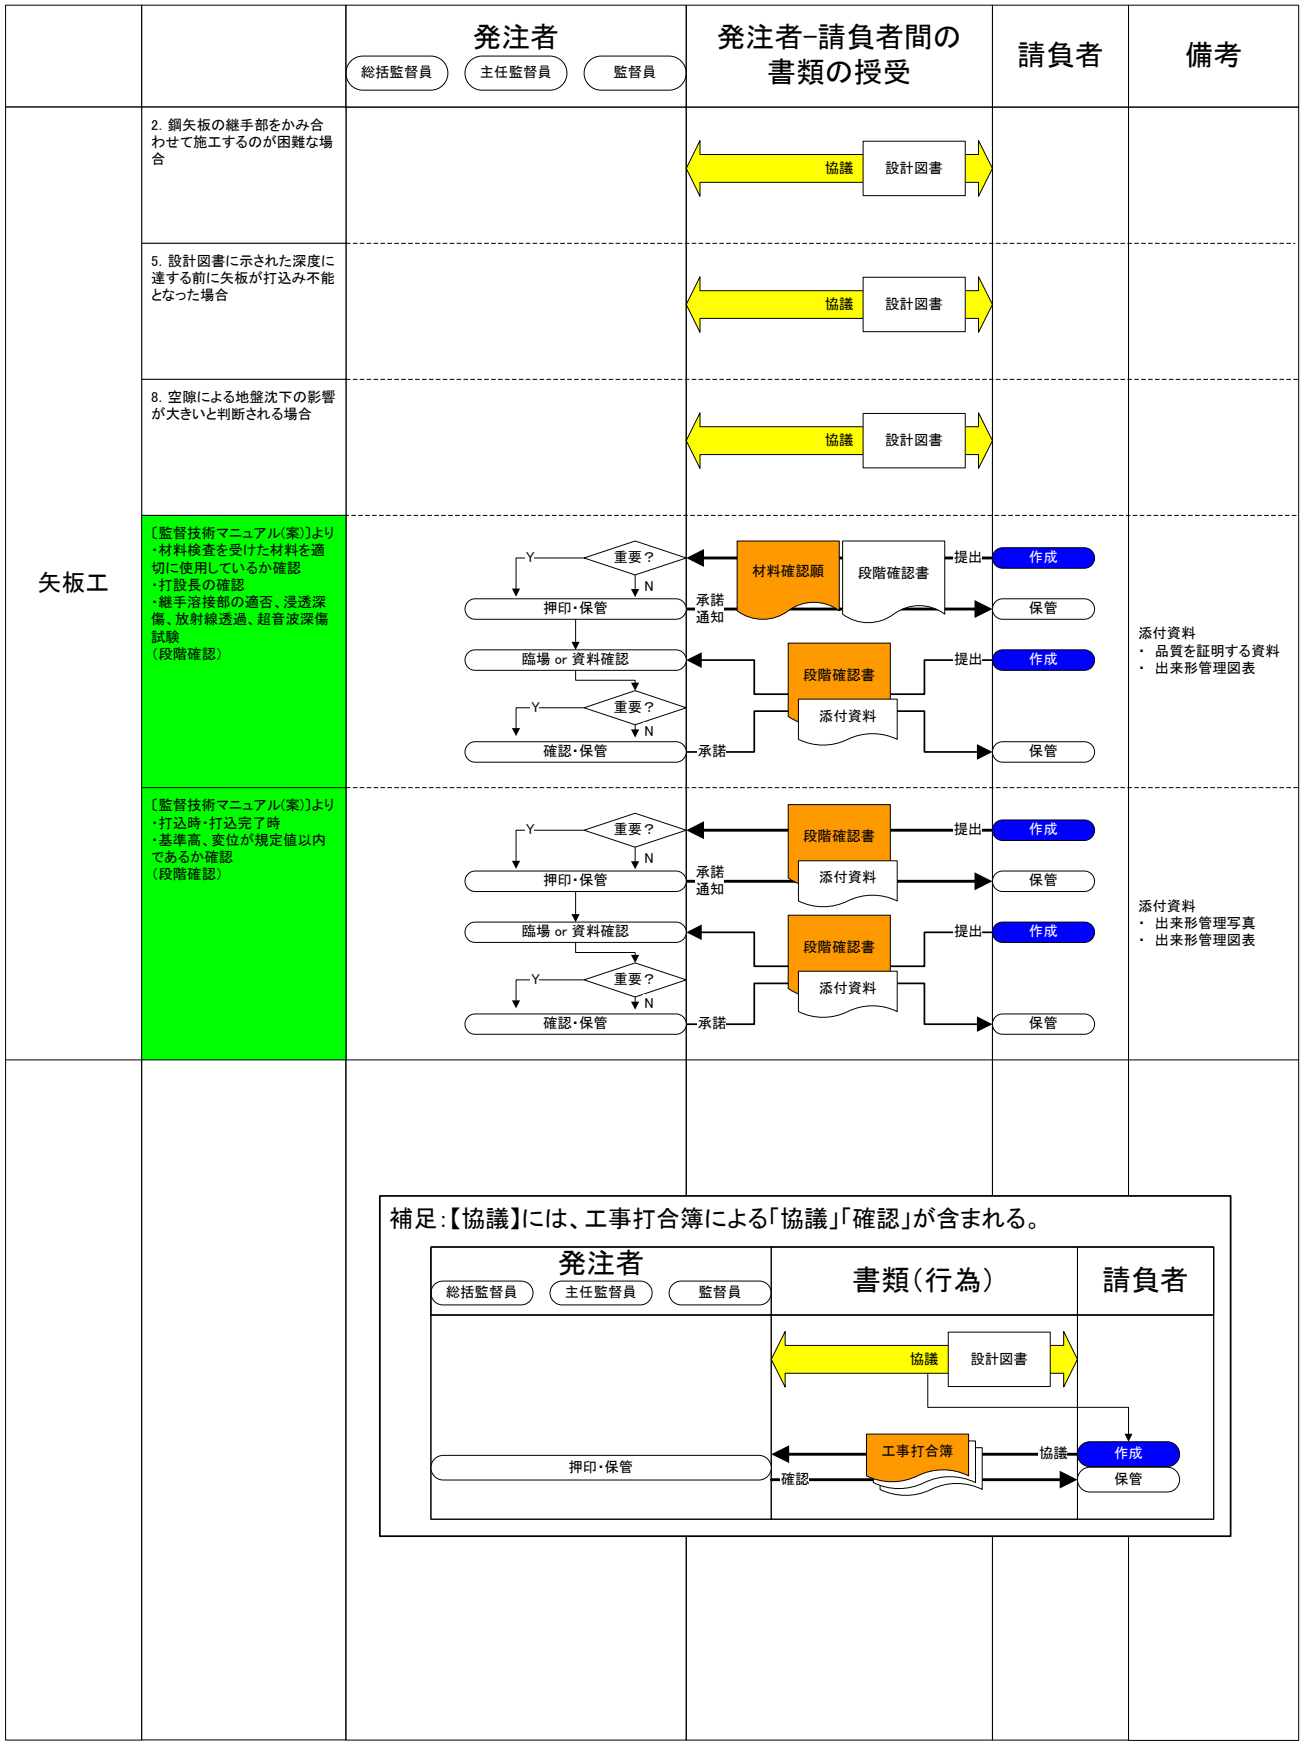

法枠工(No.018)

『法枠工』

<table>
<tr><th></th><th></th><th>発注者
総括監督員　主任監督員　監督員</th><th>発注者−請負者間の
書類の授受</th><th>請負者</th><th>備考</th></tr>
<tr><td rowspan="2">法枠工</td><td>4. 浮石が大きく取除くことが困難な場合</td><td></td><td> 
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14. 吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、またはそのおそれがあると予測された場合</td><td></td><td> 
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。
 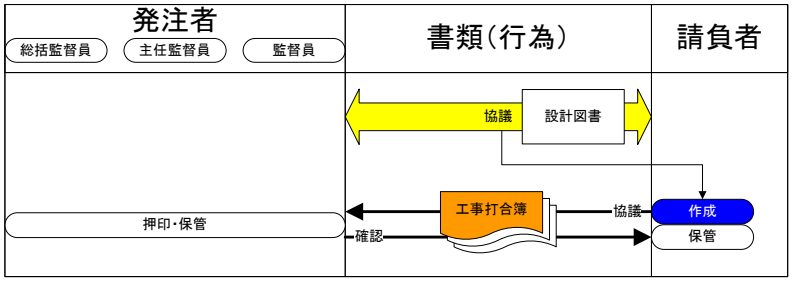
</td></tr>
</table>

吹付工(No.019)

『吹付工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
吹付工	3. 吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、またはそのおそれがあると予測された場合				
		補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。 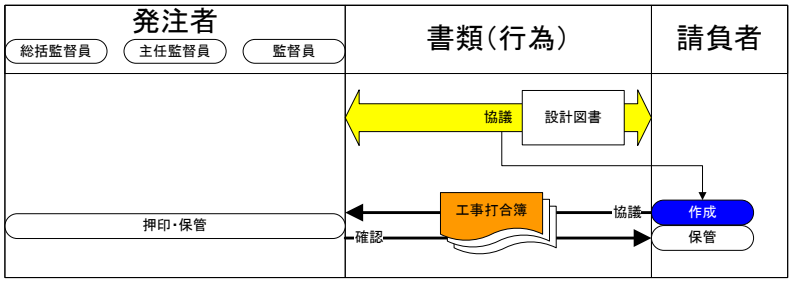			

植生工（No.020）

『植生工』

		発注者 総括監督員　主任監督員　監督員	発注者−請負者間の書類の授受	請負者	備考
植生工	2.使用する材料の種類、品質、配合についての承諾	重要？ Y / N 押印・保管	工事打合簿 提出 / 承諾	作成 保管 配合決定	添付資料 ・ 設計図書
	3.肥料が設計図書に示されていない場合の確認	重要？ Y / N 押印・保管	確認・立会願 添付資料 提出 / 承諾	作成 保管	添付資料 ・ 品質証明書等
	3.工事完了引渡しまでに芝が枯死した場合	重要？ Y / N 押印・保管 押印・保管	工事打合簿 報告 / 確認 工事打合簿 報告 / 確認	調査 作成 保管 再施工 作成 保管	添付資料 ・ 事象が確認できる資料
	11.工事完了引渡しまでに、種子が発芽不良または枯死した場合	重要？ Y / N 押印・保管 押印・保管	工事打合簿 報告 / 確認 工事打合簿 報告 / 確認	調査 作成 保管 再施工 作成 保管	添付資料 ・ 事象が確認できる資料

縁石工(No.021)

『縁石工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
縁石工	2.アスカーブの施工について	参照：共仕 第3編 2-6-5 アスファルト舗装工、フローNo.033			
		補足：【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。 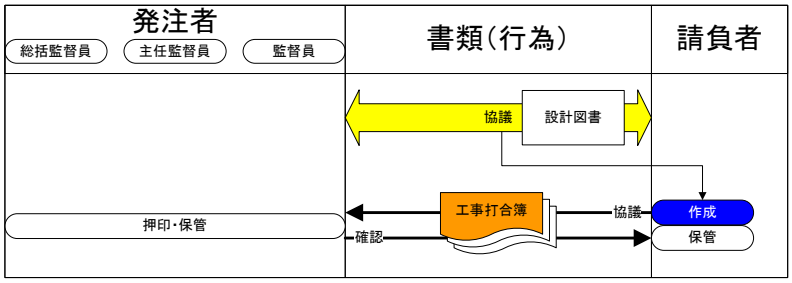 			

小型標識工(No.022)

		発注者 総括監督員　主任監督員　監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
	4.反射シートの貼付けは、真空式加熱圧着機以外の機器で実施する場合	押印・保管		作成 保管	添付資料 ・ 施工計画書

防止柵工(No.023)

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
	1.防止柵を設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合				
		補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。 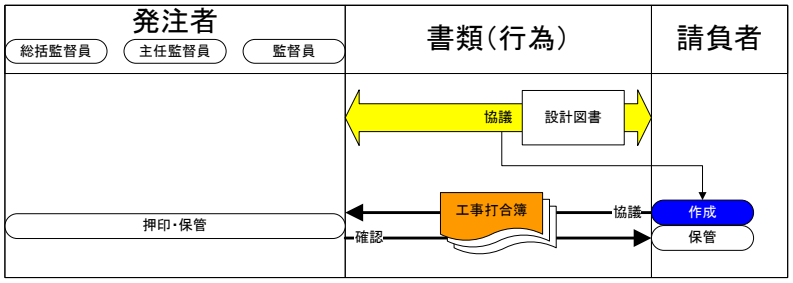			

路側防護柵工(No.024)

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
	3.支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中に防護柵を設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合				
		補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。 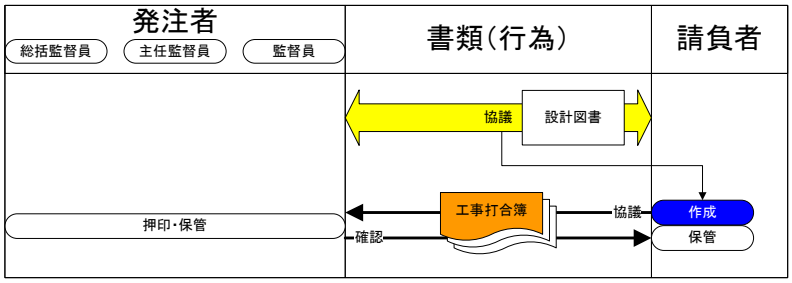			

区画線工(No.025)

		発注者 総括監督員　主任監督員　監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
	2.施工箇所、施工時間帯、施工種類について				

道路付属物工(No.026)

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
	4.視線誘導標の施工にあたって、支柱を橋梁、擁壁、函渠などのコンクリート中に設置する場合に、設計図書に定めた位置に支障がある時				
	5.距離標を設置する際に、障害物などにより所定の位置に設置できない場合				
	6.道路鋲を設置する際に設置位置が明示されていない場合				
		補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。 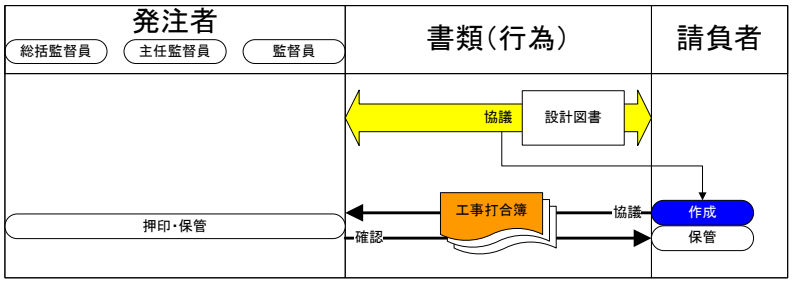		

桁製作工(No.027)-1／2

規定-1／2『原寸・工作・溶接施工・溶接施工試験・材片の組み合わせ精度・溶接の検査』

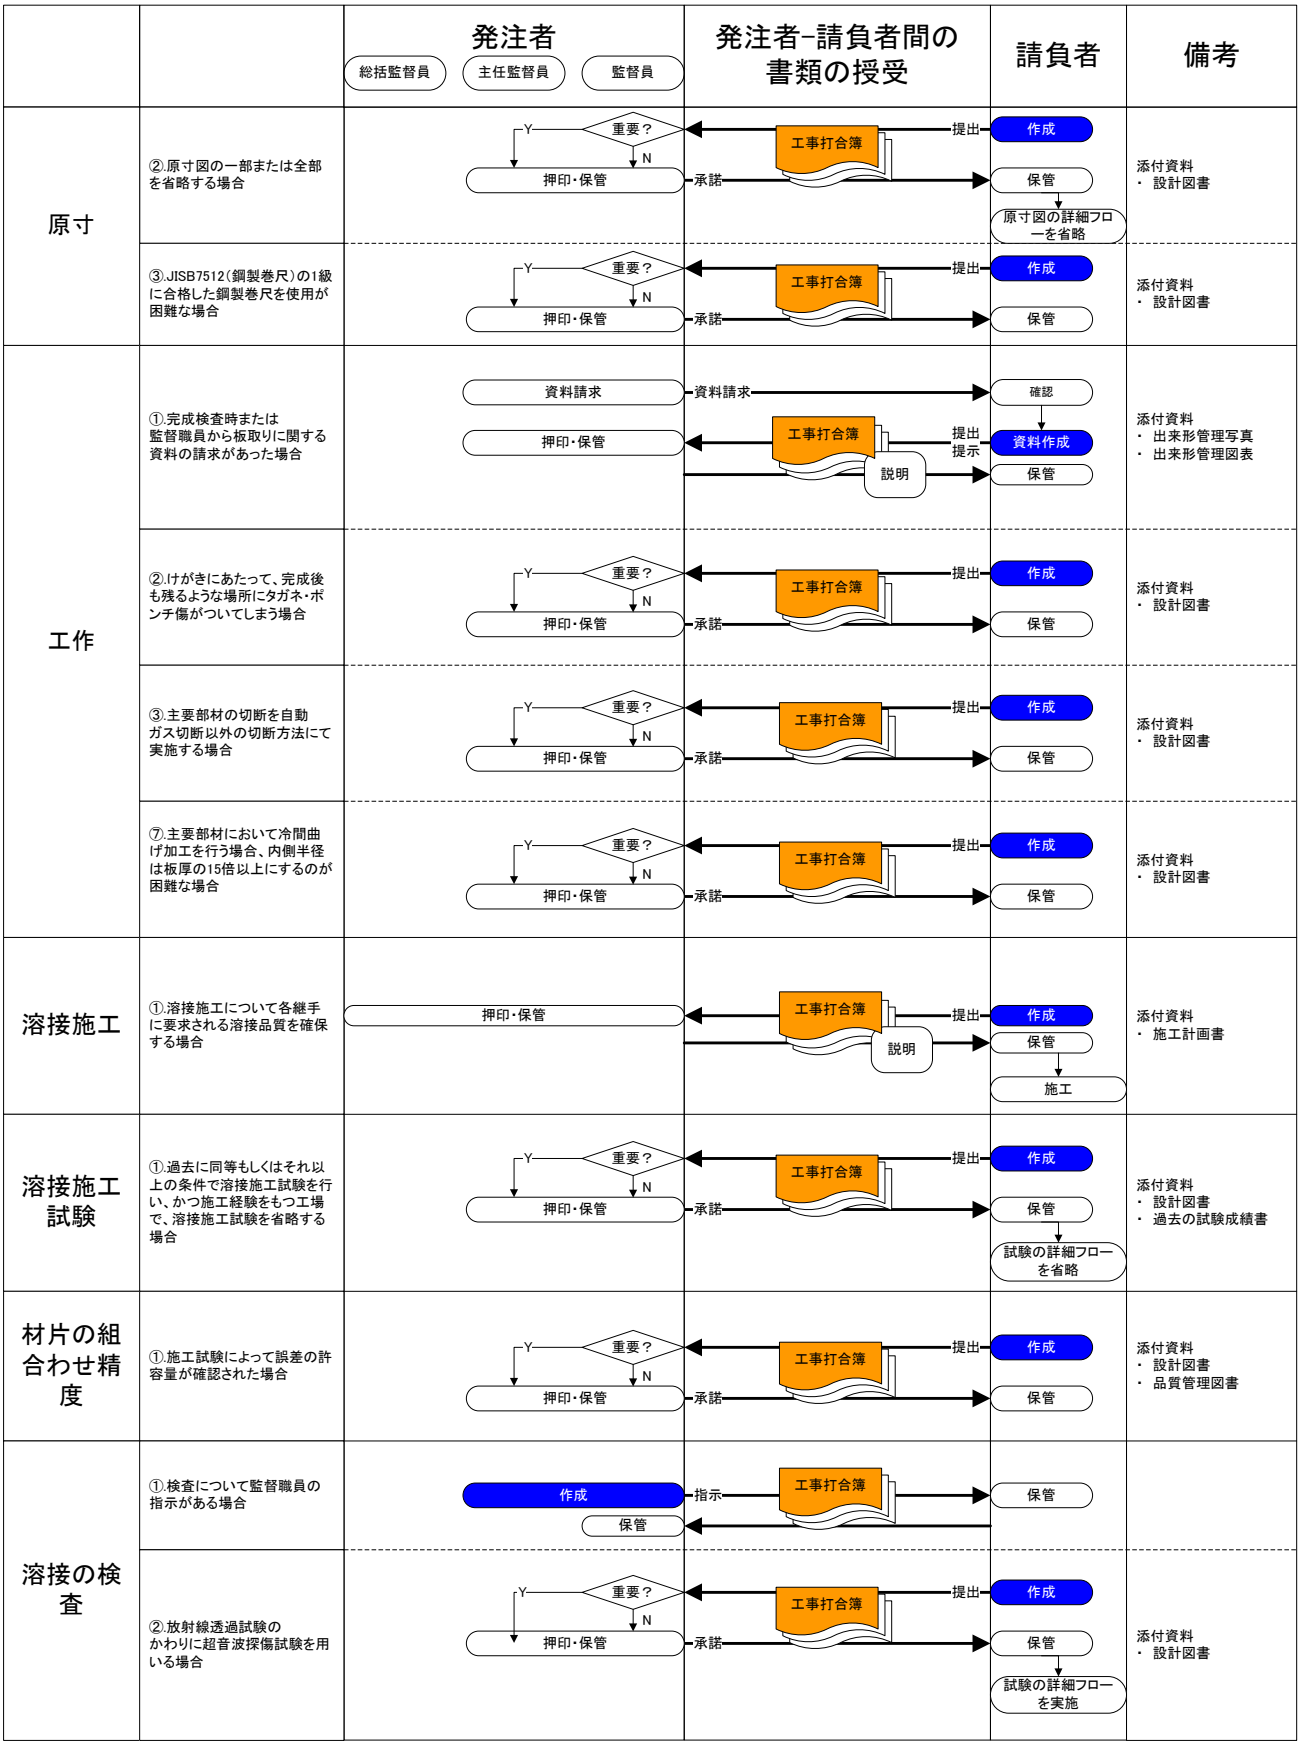

桁製作工(No.027)-2／2

規定-2／2

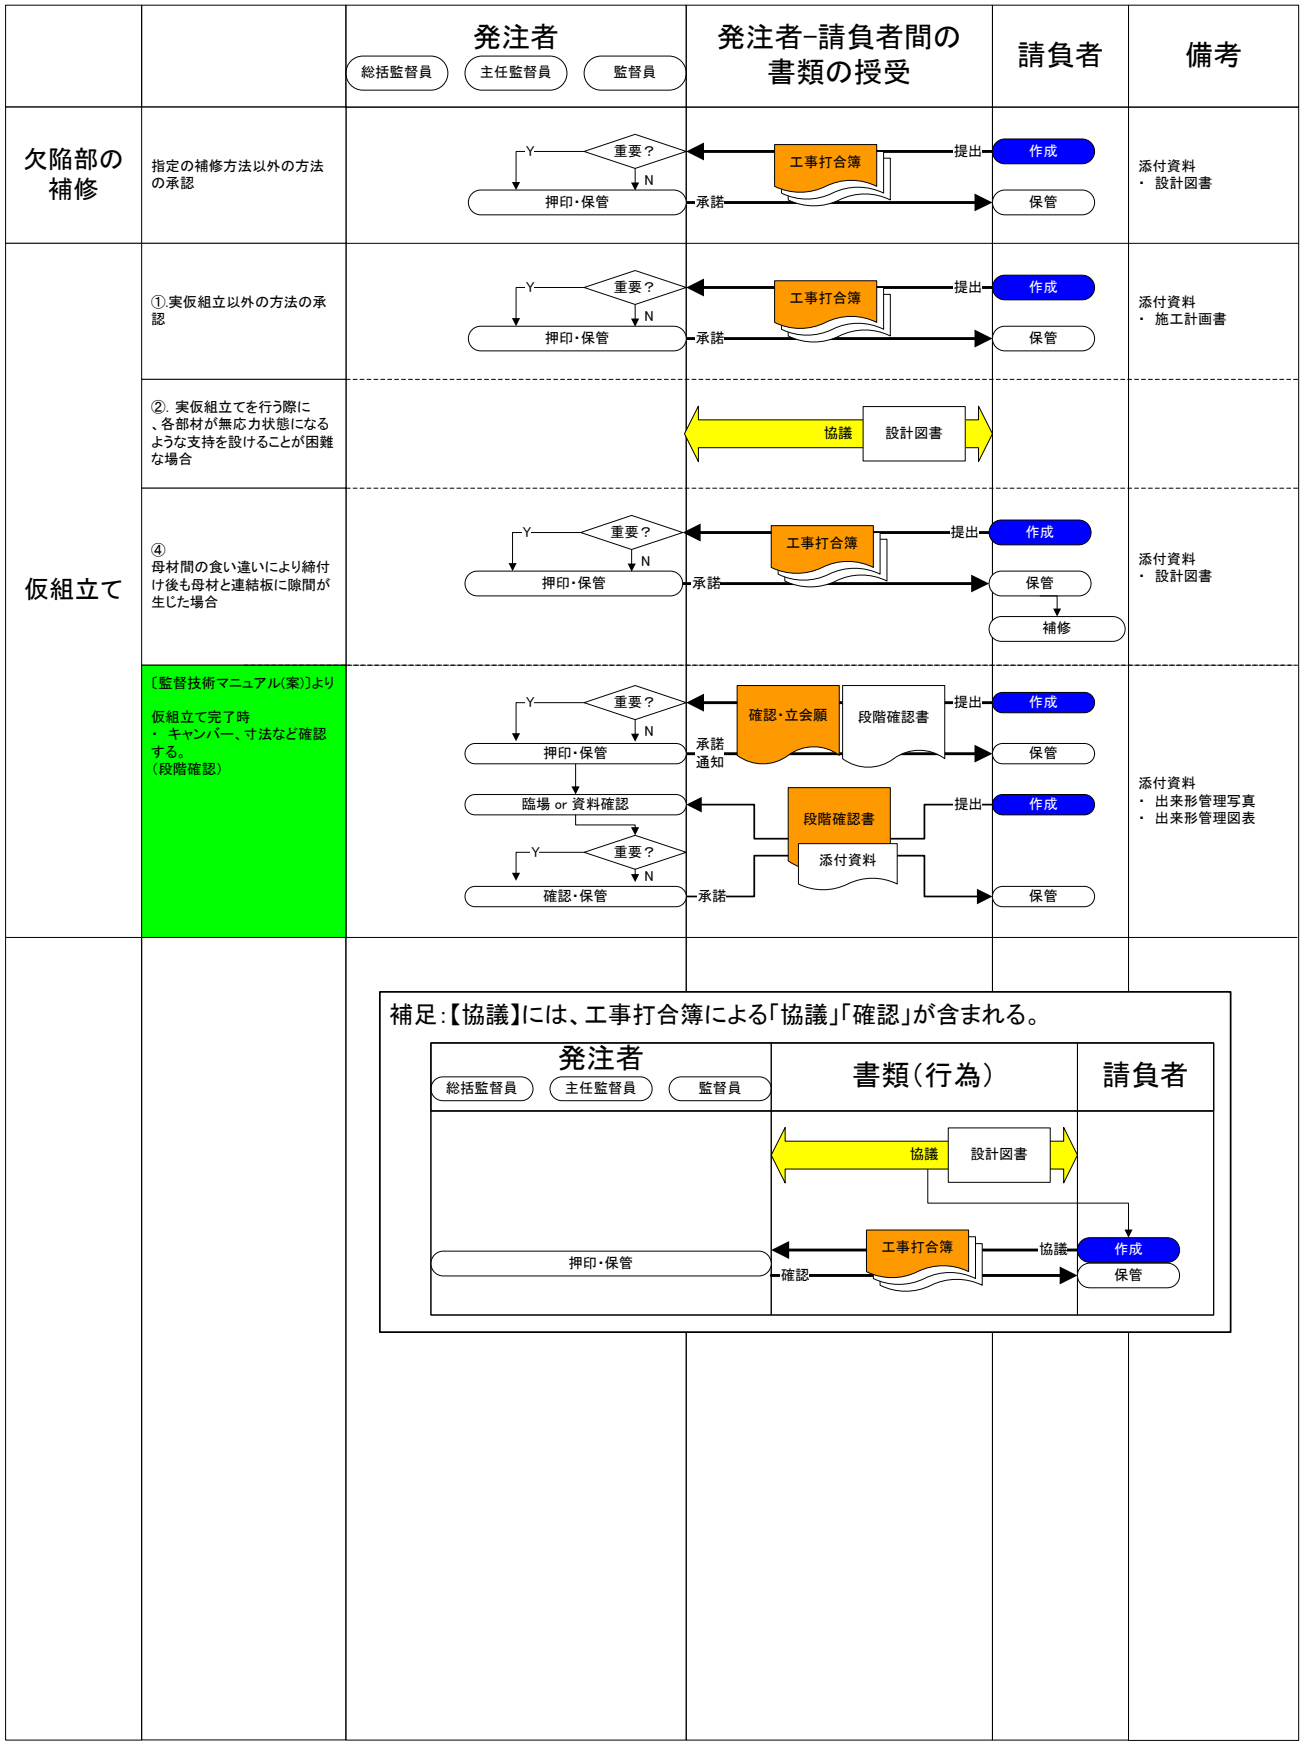

工場塗装工(No.028)

		発注者 総括監督員　主任監督員　監督員	発注者−請負者間の書類の授受	請負者	備考
	3.気温、湿度の条件が指定されたケース以外の場合		協議　設計図書		
	10. 下塗−(4):塗装作業にローラーブラシを使用する場合		協議　設計図書		
	12. 検査−(1): 塗膜厚測定記録の請求があった場合	資料請求 押印・保管	資料請求 工事打合簿　提出 提示 説明	確認 資料作成 保管	添付資料 ・塗装膜厚測定表 ・塗膜厚測定成績表
	12. 検査−(7):塗料の情報 (出荷証明書、塗料成績表の請求があった場合)	資料請求 押印・保管	資料請求 工事打合簿　提出 提示 説明	確認 資料作成 保管	添付資料 ・出荷証明書 ・試験成績書

補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。

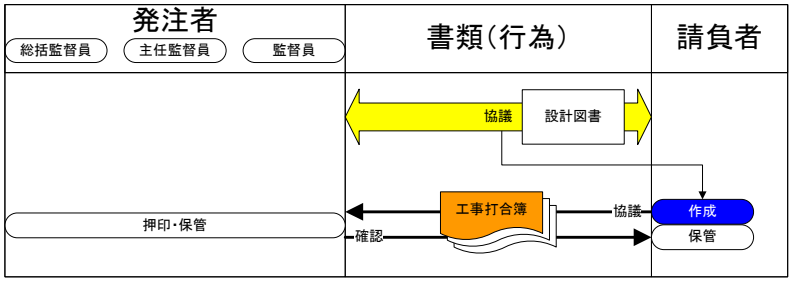

コンクリート面塗装工(No.029)

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
		発注者-請負者間の書類に関する記載無し			

支給品運搬工(No.030)

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
		発注者-請負者間の書類に関する記載無し			

基礎工(No.031)－1／9

『既製杭工』

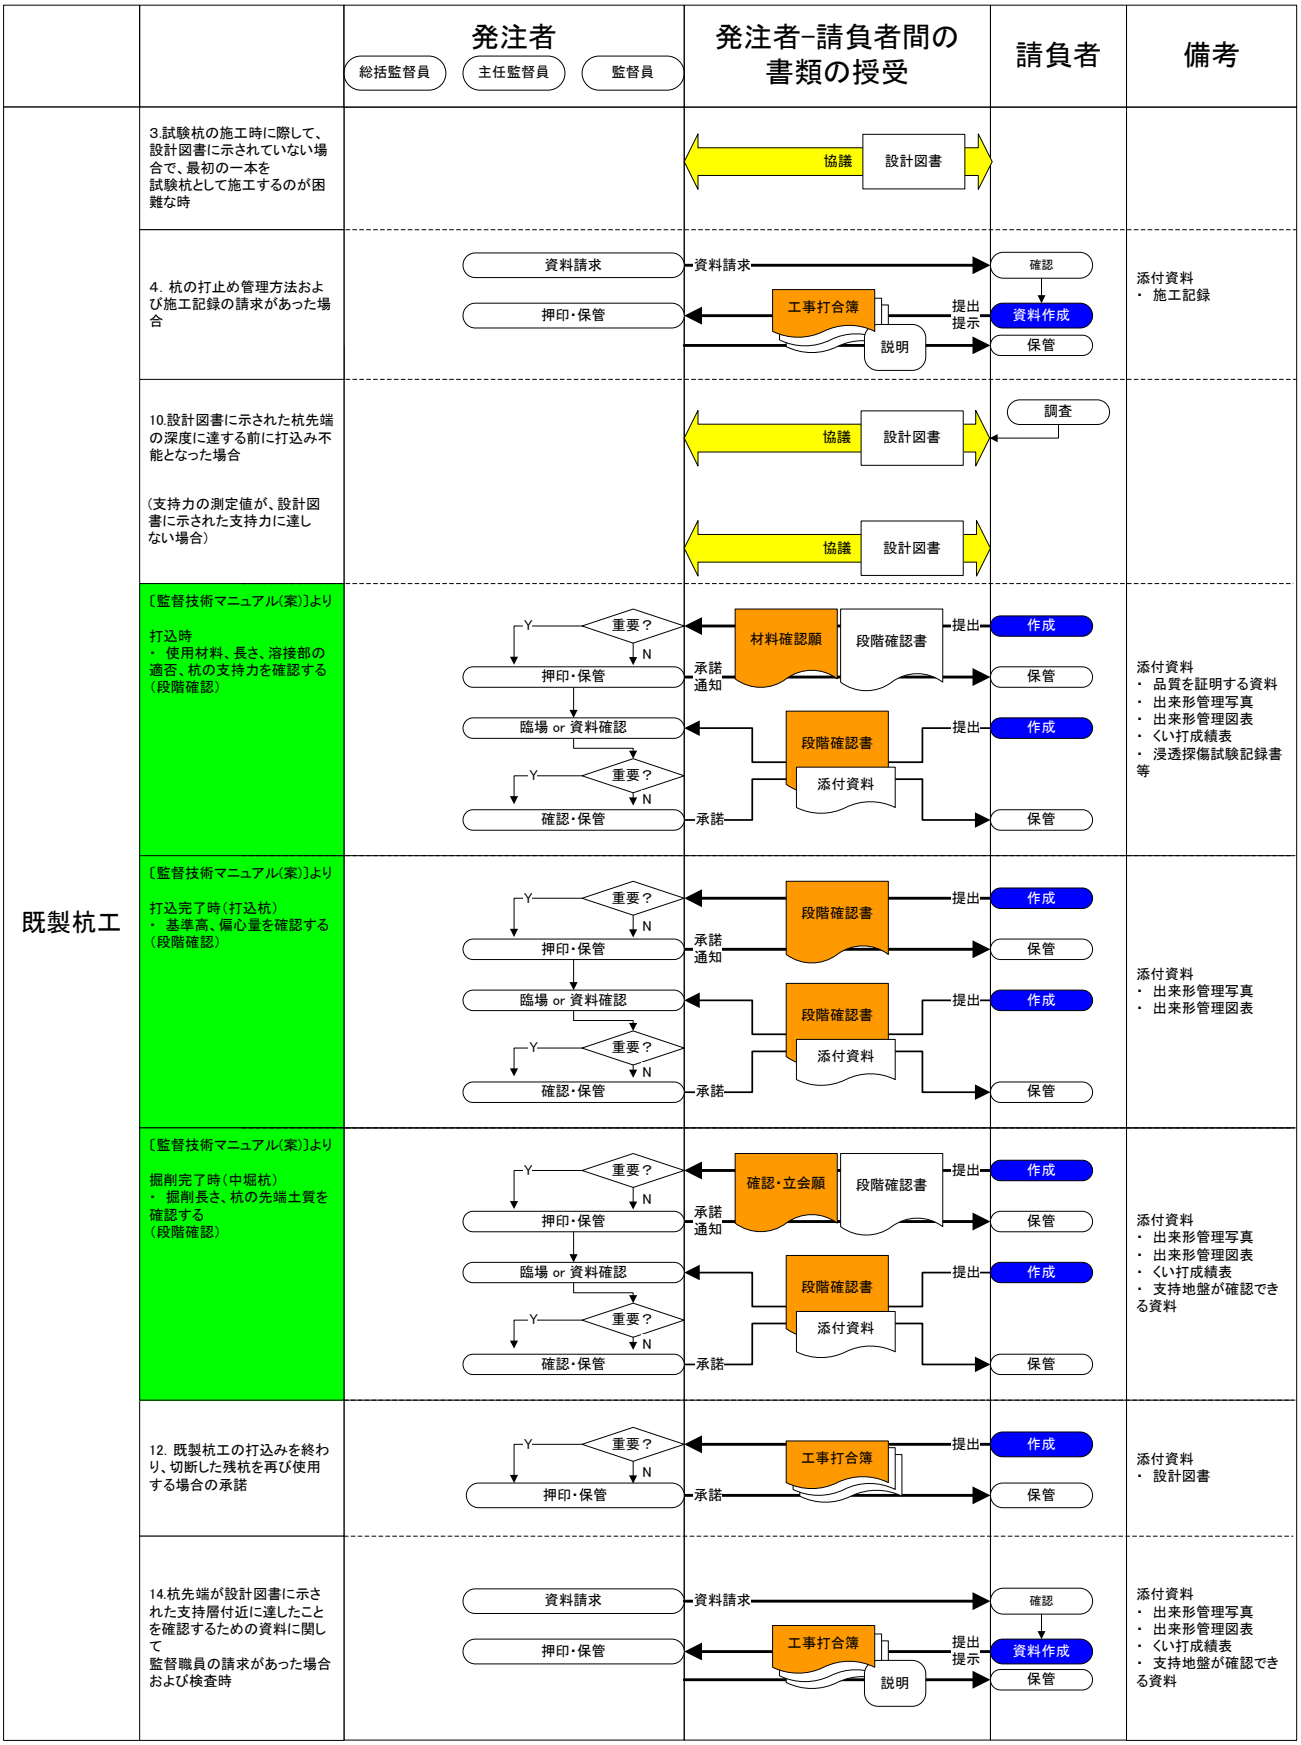

基礎工(No.031)－2／9

『既製杭工』

		発注者 総括監督員 / 主任監督員 / 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
既製杭工	15 既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出撹拌方式による場合				
	21. 既製杭工における鋼管杭及びH鋼杭の現場継手について (3)溶接工の資格証明書の写しの提出・提示				添付資料 ・ 技術者取得資格証明書の写し
	21. 既製杭工における鋼管杭及びH鋼杭の現場継手について (5) 降雪雨時、強風時に露天で作業が可能なように、遮へいした場合				添付資料 ・ 設計図書
	21. 既製杭工における鋼管杭及びH鋼杭の現場継手について (10)溶接箇所に関する記録の提出				添付資料 ・ 浸透探傷試験記録書等
	〔監督技術マニュアル(案)〕より 施工完了時(中堀杭) ・ 基準高、偏心量を確認する (段階確認)				添付資料 ・ 出来形管理写真 ・ 出来形管理図表
	〔監督技術マニュアル(案)〕より 杭頭処理完了時 ・ 杭頭処理を確認する (段階確認)				添付資料 ・ 杭頭処理が確認できる資料

基礎工(No.031)－3／9

『場所打杭工』

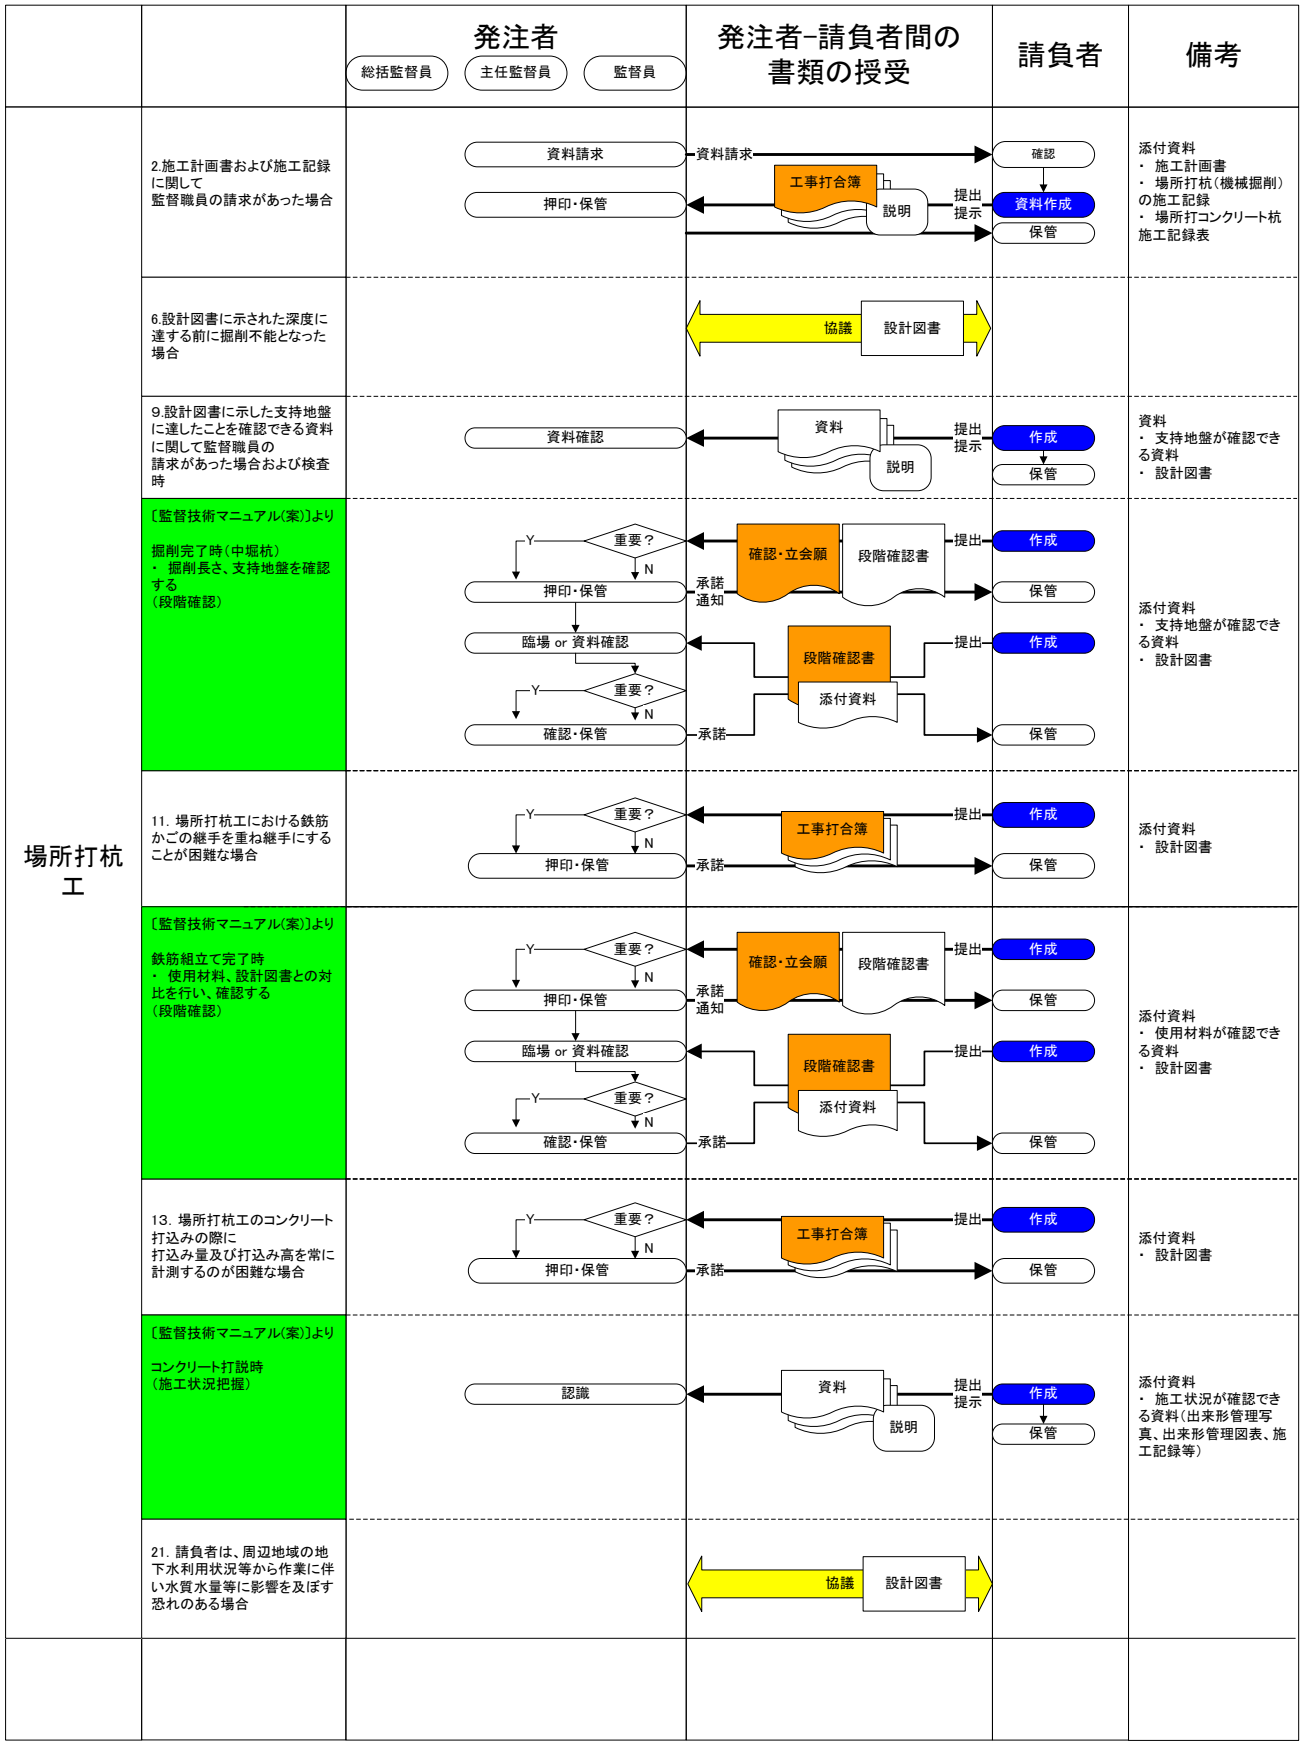

基礎工(No.031)－4／9

『場所打杭工、深礎工』

		発注者 総括監督員 / 主任監督員 / 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
場所打杭工	〔監督技術マニュアル(案)〕より 施工完了時 ・ 基準高、偏心量、杭径を確認する (段階確認)				添付資料 ・ 出来形管理写真 ・ 出来形管理図表 ・ 設計図書
	〔監督技術マニュアル(案)〕より 杭頭処理完了時 ・ 杭頭処理状況を確認する (段階確認)				添付資料 ・ 杭頭処理が確認できる資料 ・ 設計図書
深礎工	3.掘削孔の全長にわたって土留工を行うことが困難な場合				
	〔監督技術マニュアル(案)〕より 土(岩)質の変化した時 ・土質の変化位置を確認する (段階確認)				添付資料 ・ 土(岩)質の変化位置が確認できる資料 ・ 設計図書
	〔監督技術マニュアル(案)〕より 掘削完了時 ・ 掘削長さ、支持地盤を確認する (段階確認)				添付資料 ・ 支持地盤が確認できる資料 ・ 設計図書
	4. 孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを示す資料の請求があった場合もしくは検査時				添付資料 ・ 出来形管理写真 ・ 出来形管理図表 ・ 場所打杭(機械掘削)の施工記録
	7. 鉄筋かごの継手を、重ね継手とするのが困難な場合				

基礎工(No.031)－5／9

『深礎工』

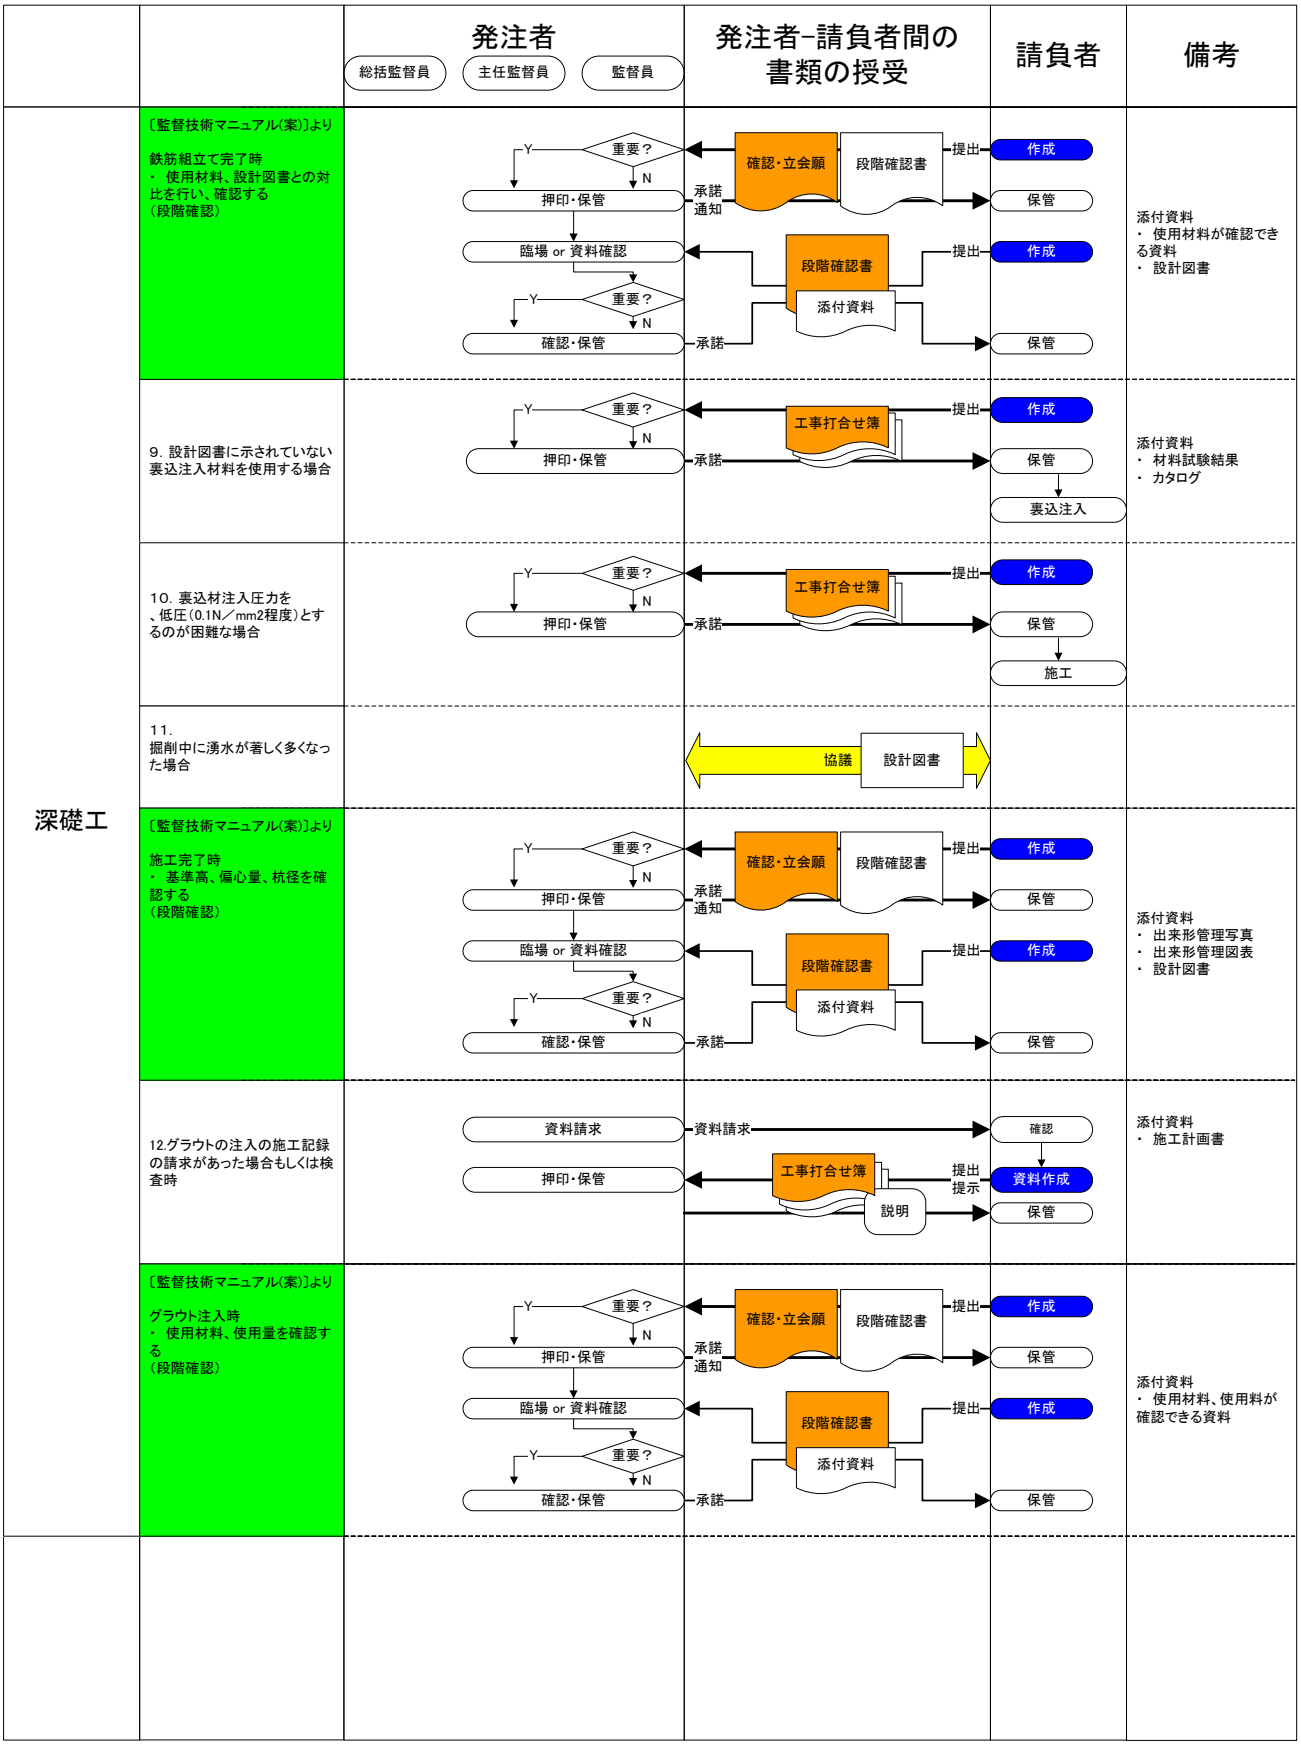

基礎工(No.031）－6／9

『オープンケーソン基礎工』

		発注者 総括監督員　主任監督員　監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
オープンケーソン基礎工	〔監督技術マニュアル(案)〕より 鉄沓据え付け完了時 ・ 使用材料、施工位置を確認する。 （段階確認）				添付資料 ・ 使用材料、施工位置が確認できる資料 ・ 設計図書
	〔監督技術マニュアル(案)〕より 本体設置前 ・ 沈設前の支持地盤について設計図書と対比・確認する （段階確認）				添付資料 ・ 支持地盤が確認できる資料 ・ボーリング柱状図
	4. オープンケーソンの施工記録の請求があった場合もしくは検査時				
	5. オープンケーソン基礎工の掘削沈下を行うにあたり、火薬類を使用する必要が生じた場合				
	7. オープンケーソンの沈下促進にあたり、著しく沈下が困難な場合				
	9. オープンケーソンの底面の支持地盤条件が設計図書を満足することを確認できる資料の請求があった場合もしくは検査時				添付資料 ・ 施工記録 ・ 品質管理図書 ・ 出来形管理写真 ・ 出来形管理図表 ・ 設計図書
	〔監督技術マニュアル(案)〕より 土(岩)質の変化した時 ・土質の変化位置を確認する （段階確認）				添付資料 ・ 土(岩)質の変化位置が確認できる資料 ・ 設計図書
	〔監督技術マニュアル(案)〕より 鉄筋組立て完了時 ・ 使用材料、設計図書との対比を行い、確認する （段階確認）				添付資料 ・ 使用材料が確認できる資料 ・ 設計図書

『オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工』

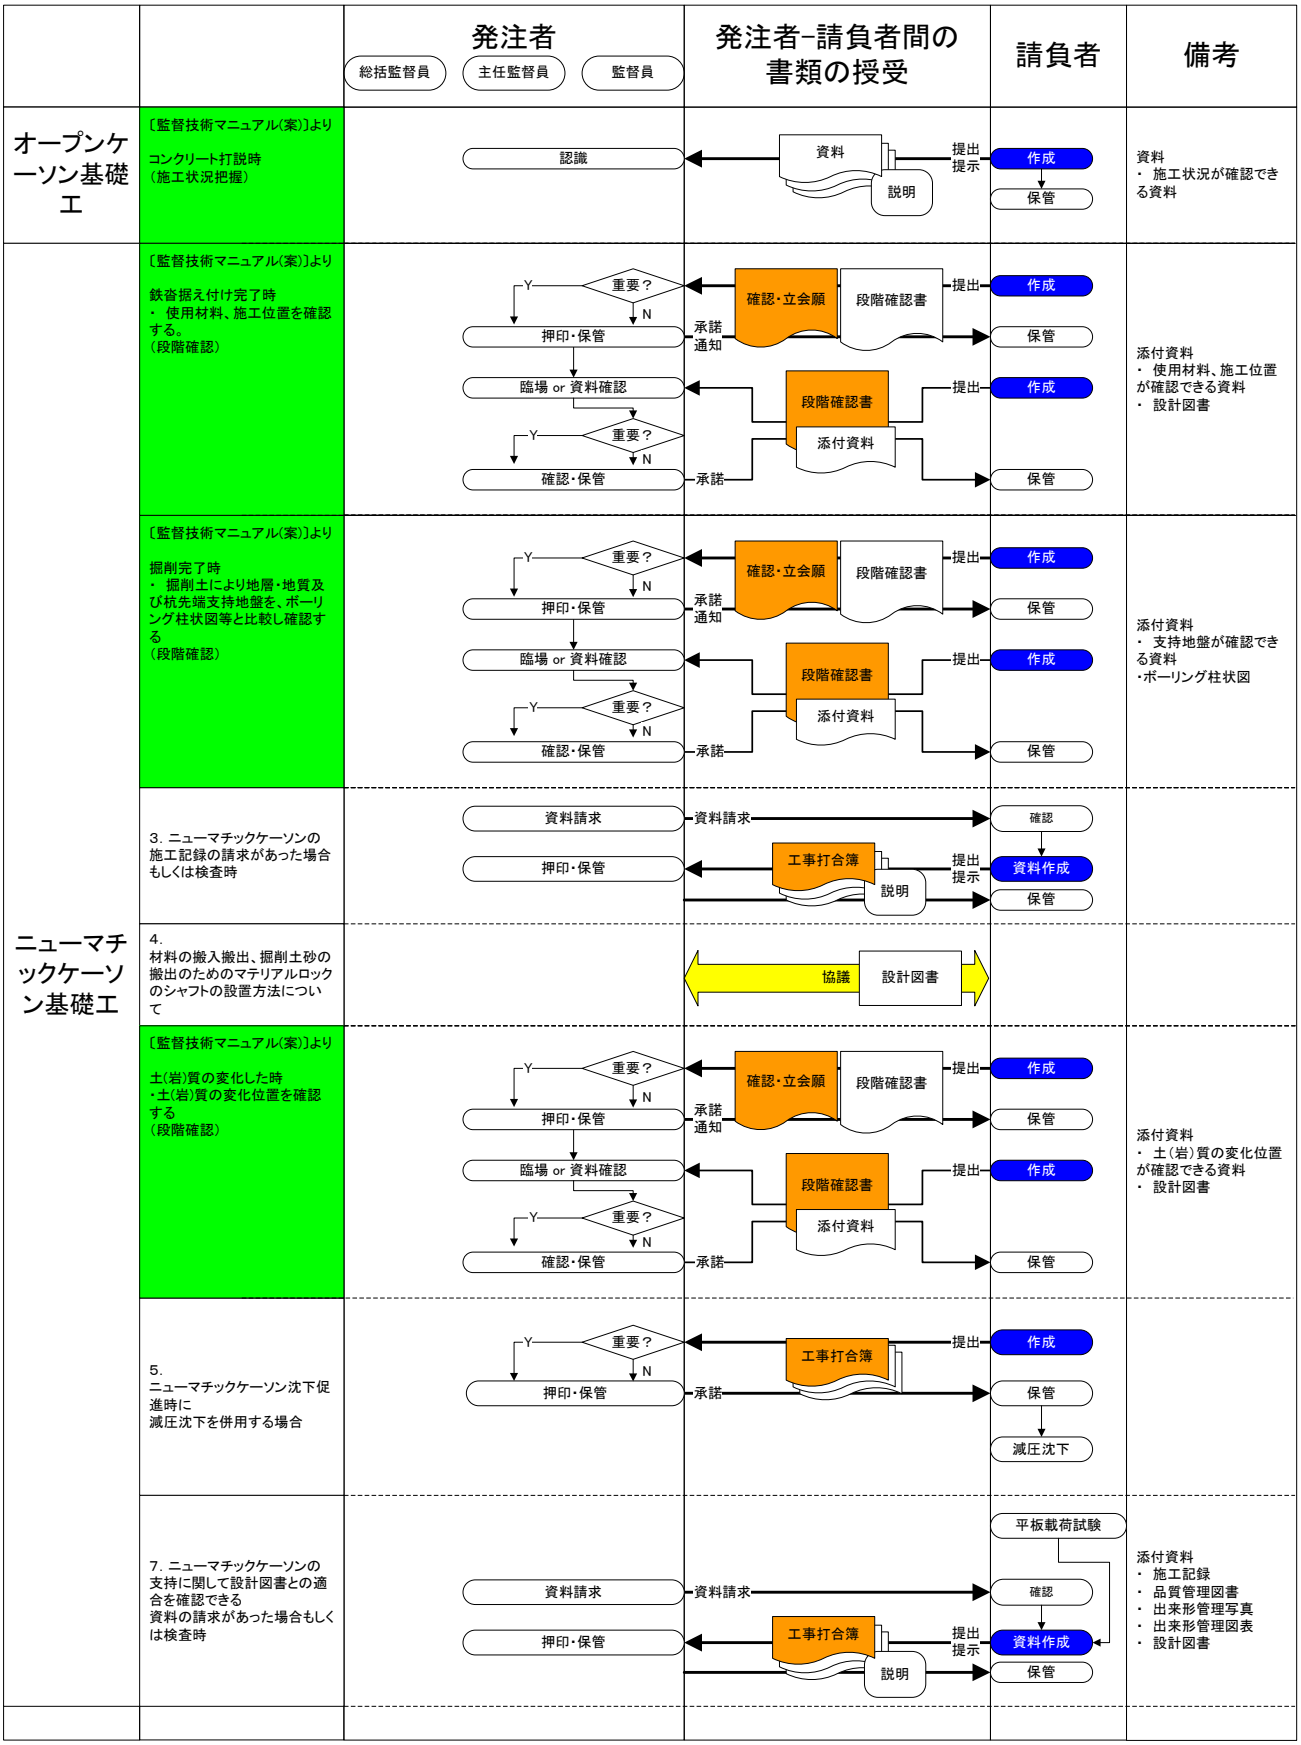

基礎工(No.031）－8／9

『ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢板基礎工』

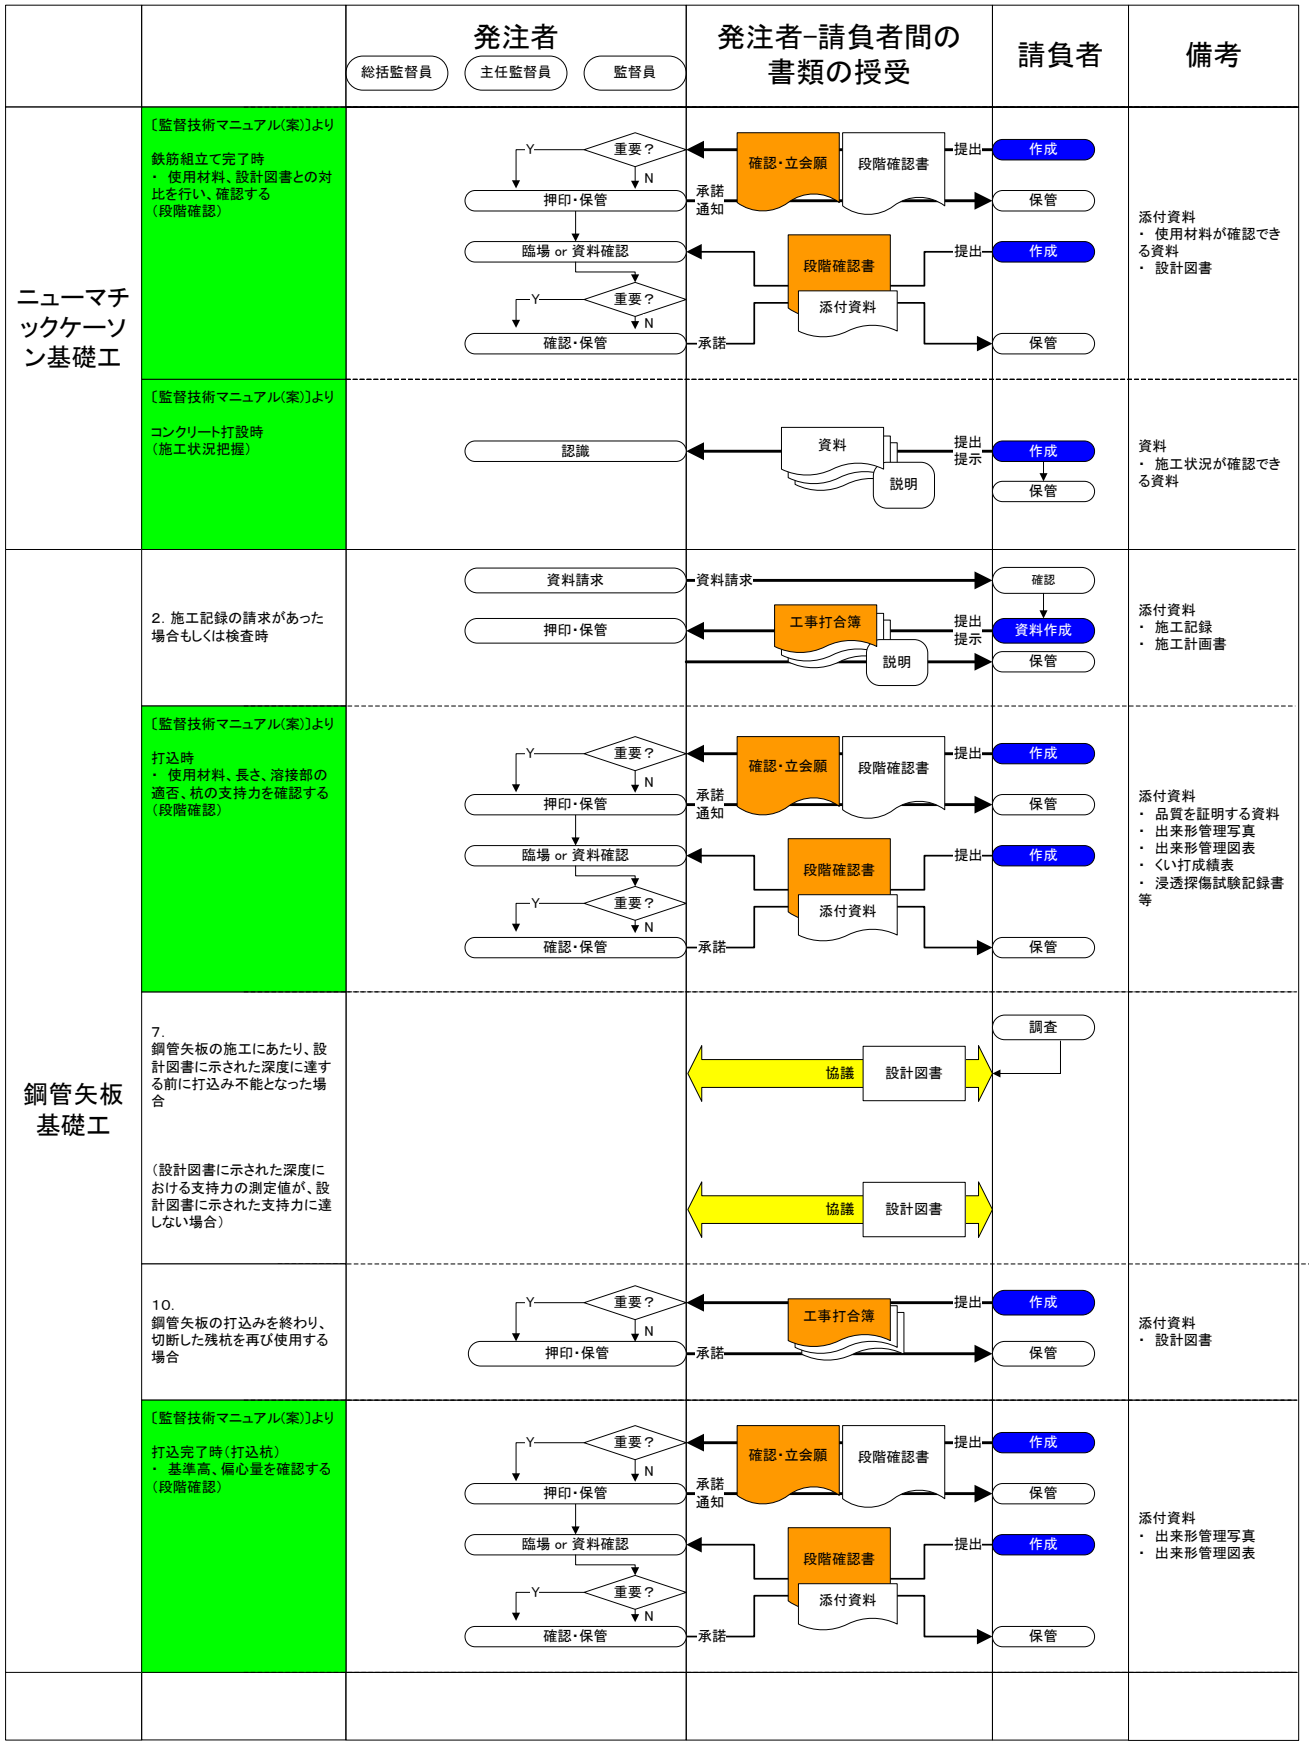

基礎工(No.031)－9／9

『鋼管矢板基礎工』

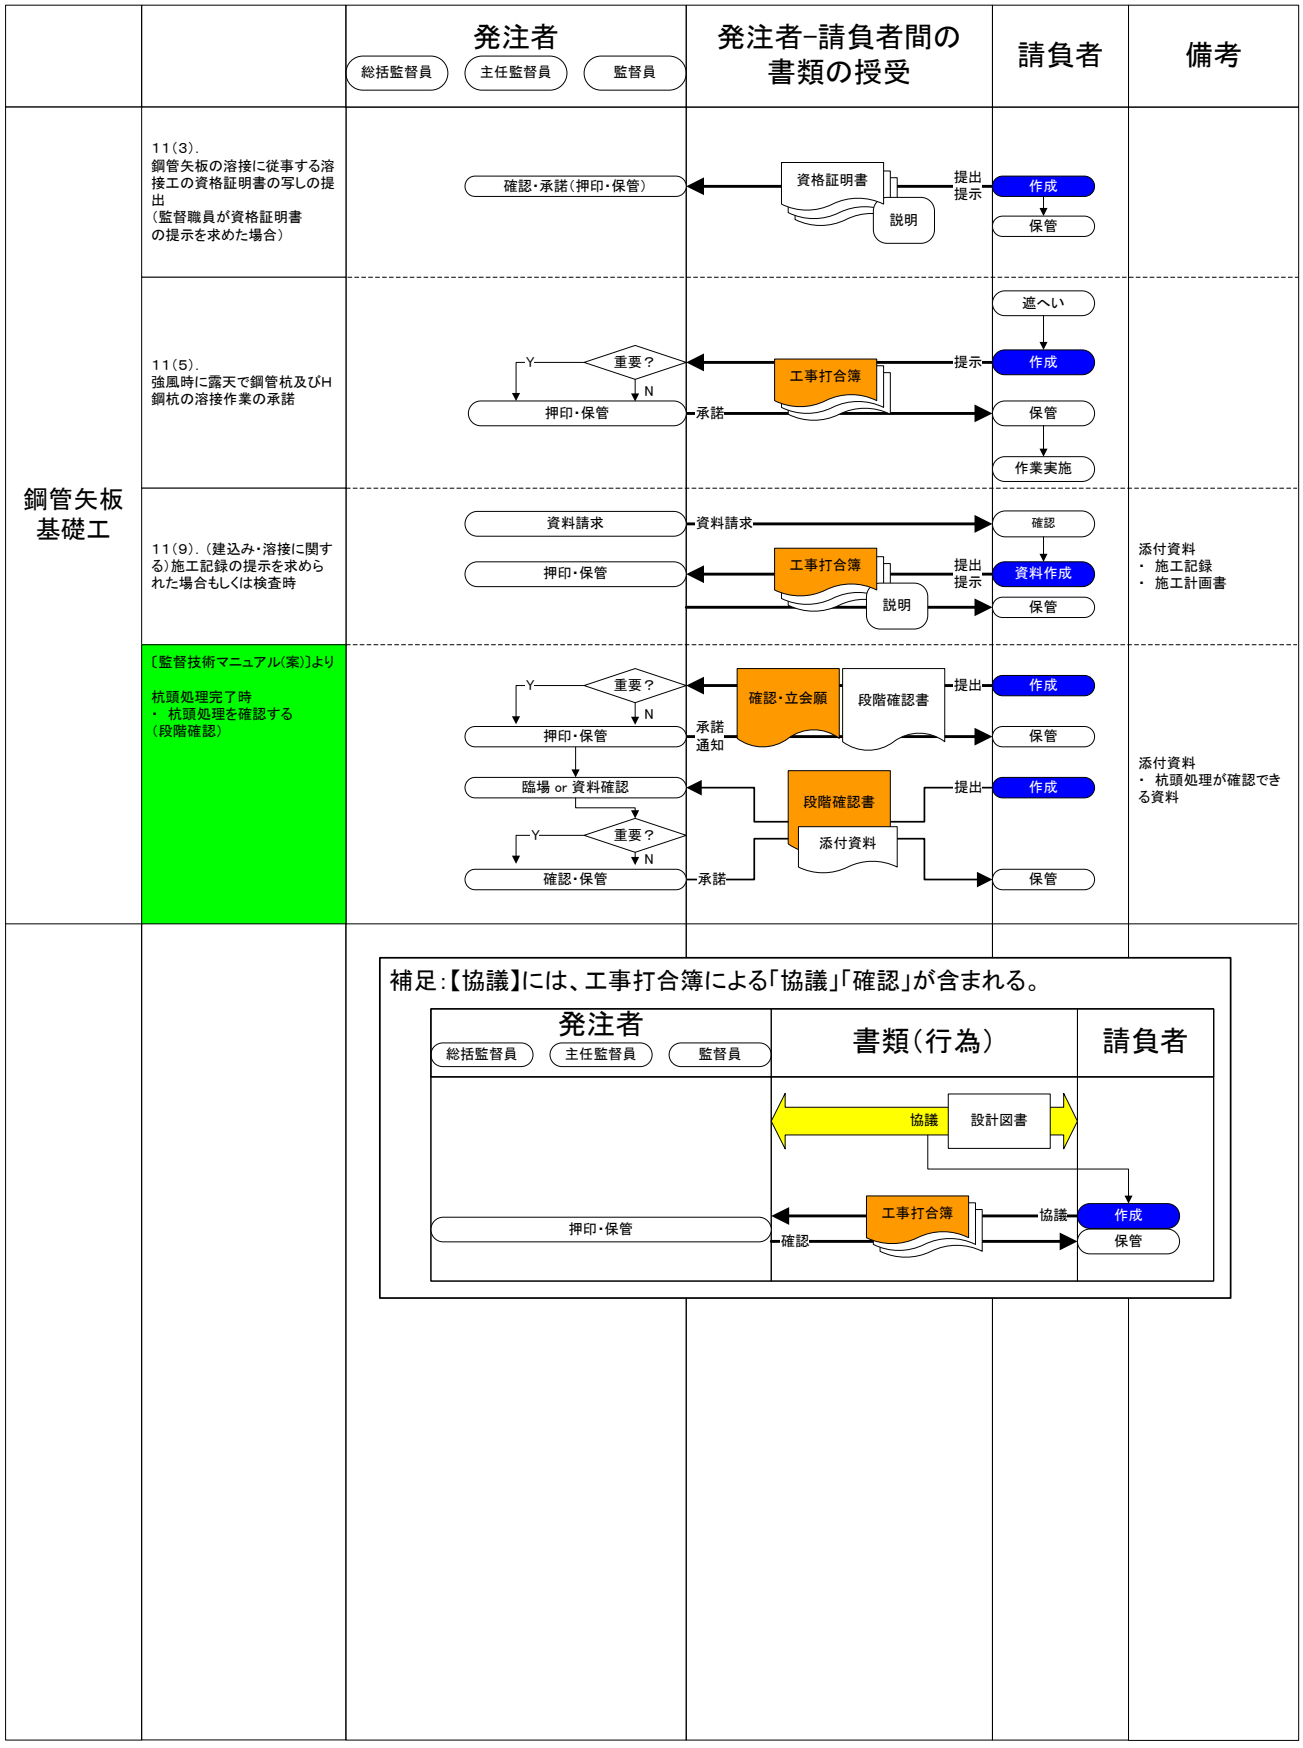

石・ブロック積（張）工（一般事項）（No.032）

『作業土工、コンクリートブロック工、石積（張）工』

		発注者 総括監督員　主任監督員　監督員	発注者−請負者間の書類の授受	請負者	備考
一般事項	1. 勾配について定めがない場合には、2%程度の勾配で設置しなければならないが、これにより難い場合		協議　設計図書		
作業土工（床掘り・埋戻し）		参照：共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016			
コンクリートブロック工	6. コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めておけない場合		協議　設計図書		
	7. 施工位置については設計図書に従って施工できない場合		協議　設計図書		
	8. コンクリートブロック工の練積または練張における合端の施工前	重要？　Y　N 押印・保管	工事打合簿 承諾	提出　作成 保管	添付資料 ・ 設計図書
石積（張）工	3. 、コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めておくものとする。なお、これにより難い場合		協議　設計図書		

補足：【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。

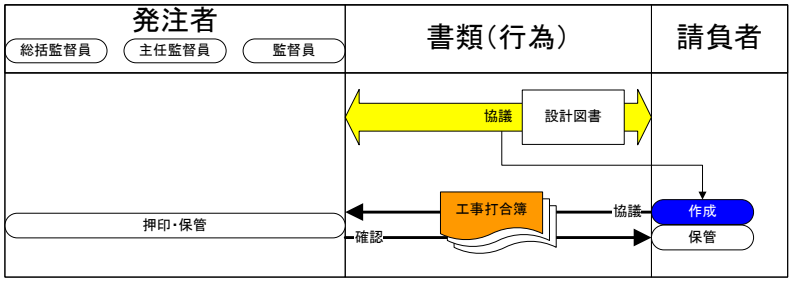

一般舗装工(No.033)－1／7

『アスファルト舗装の材料』

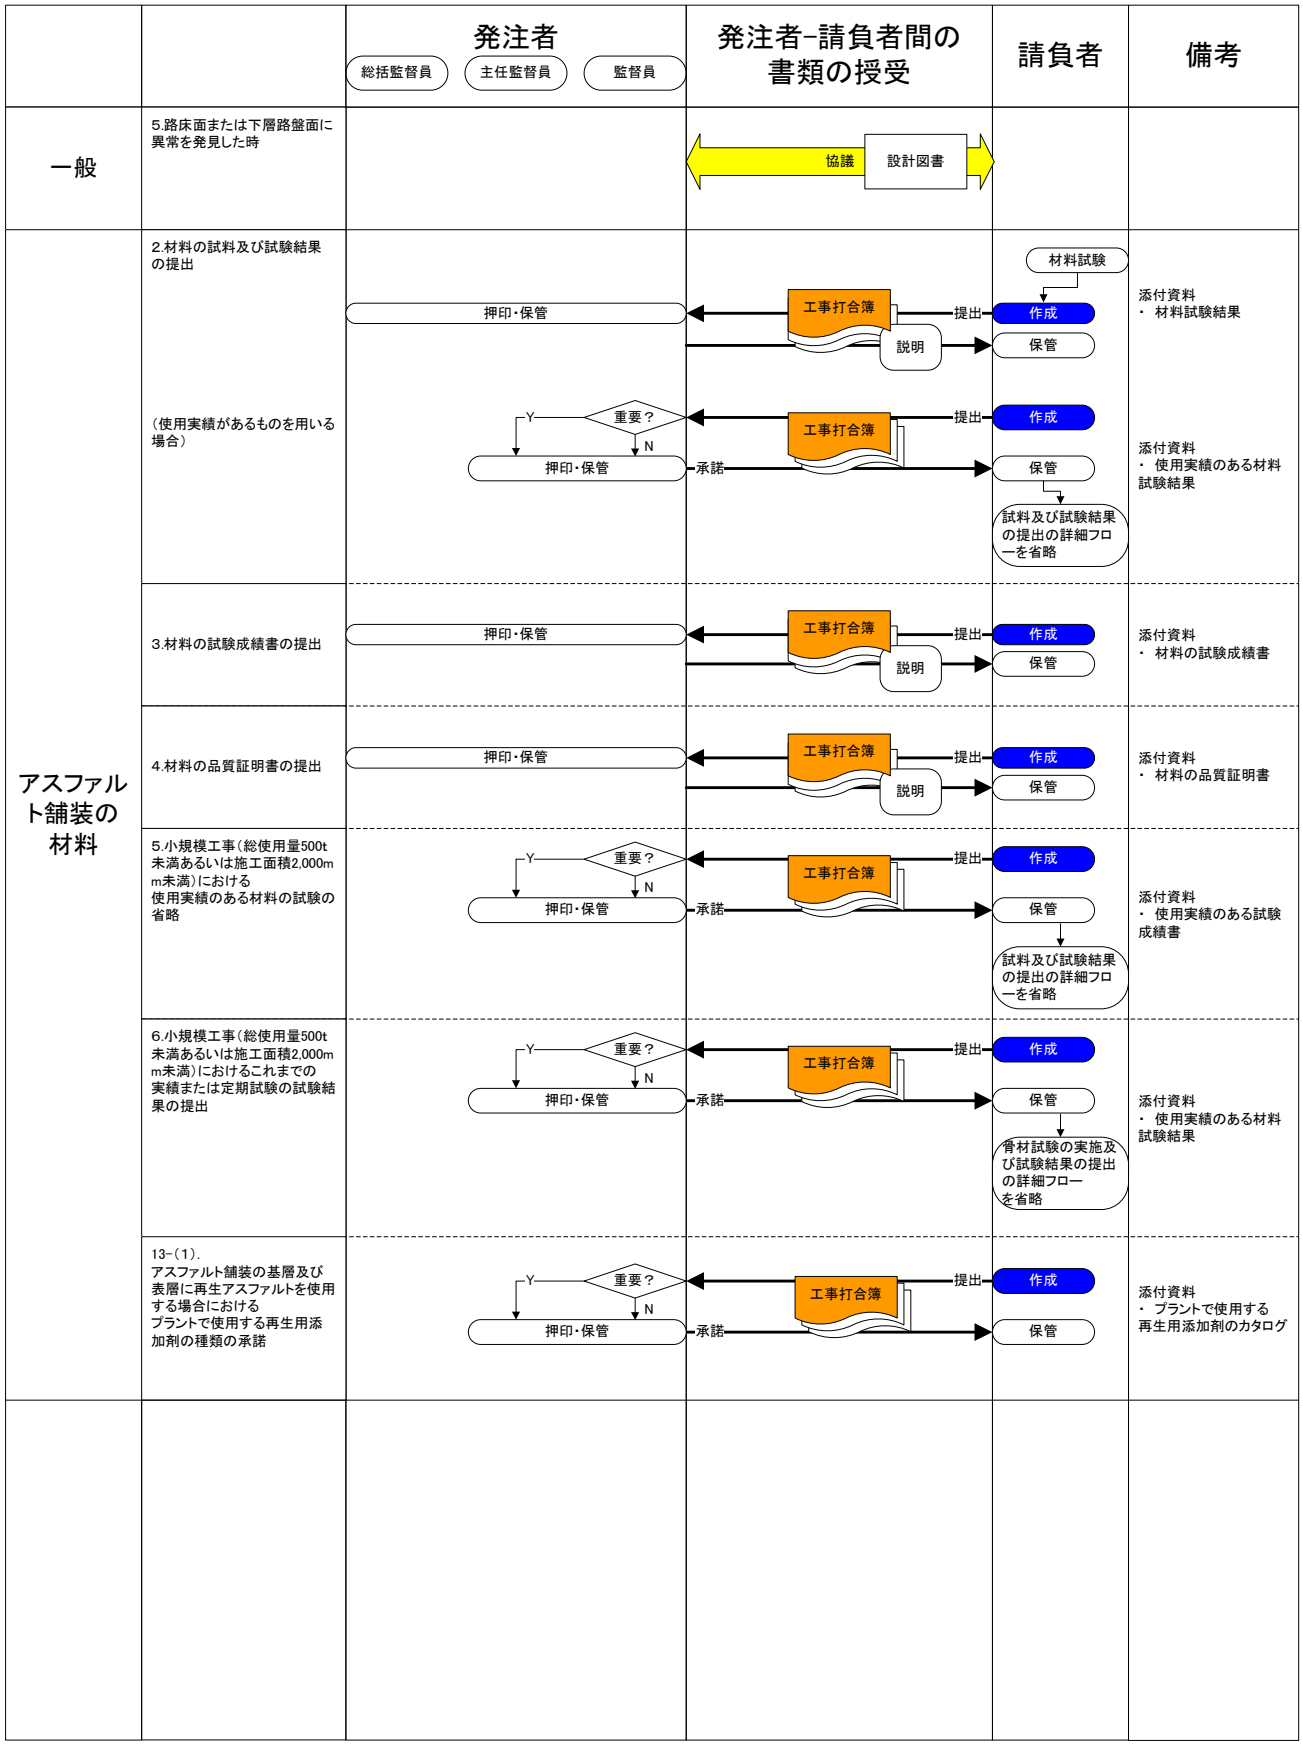

一般舗装工(No.033)－2／7

『舗装準備工、アスファルト舗装工』

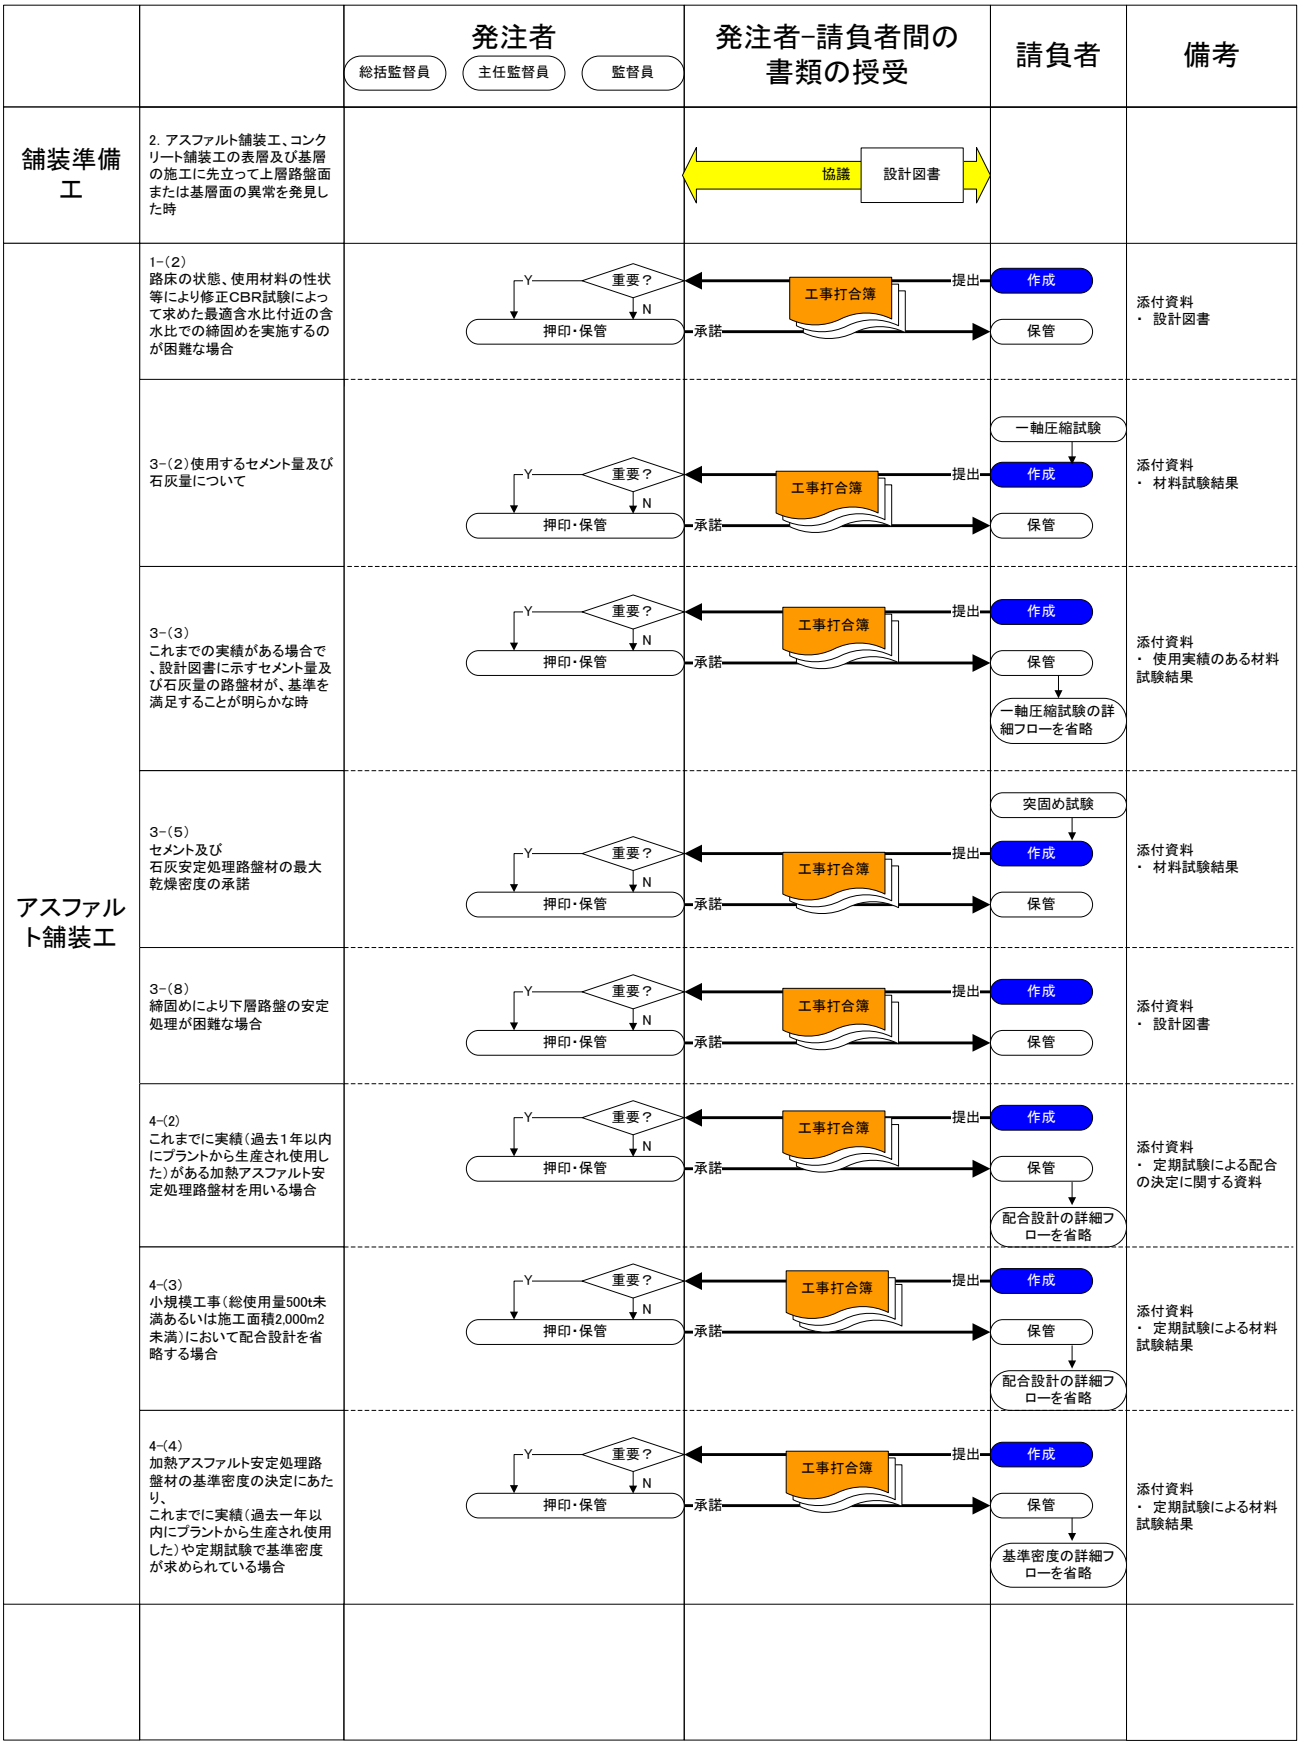

一般舗装工(No.033)－3／7

『アスファルト舗装工』

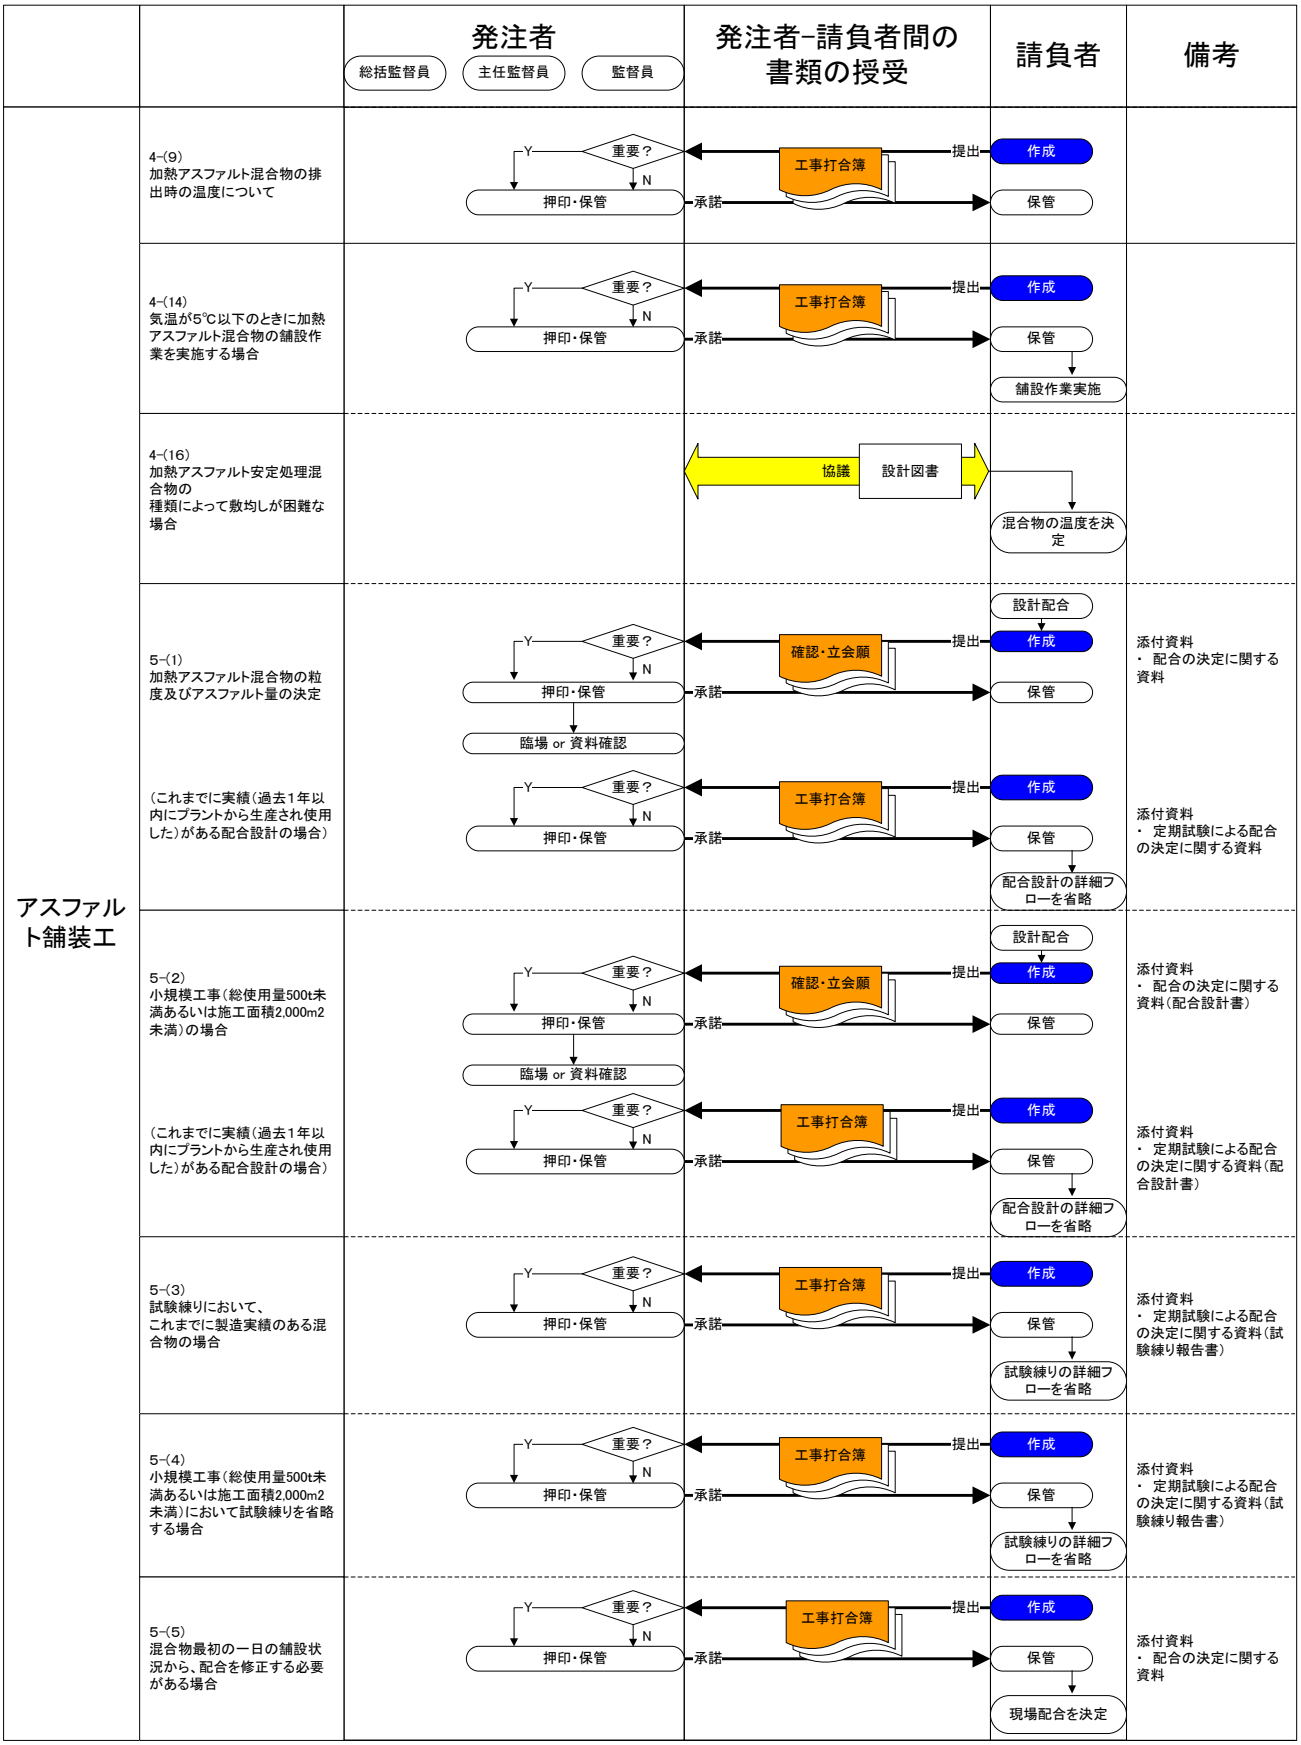

一般舗装工(No.033)－4／7

『アスファルト舗装工、コンクリート舗装工』

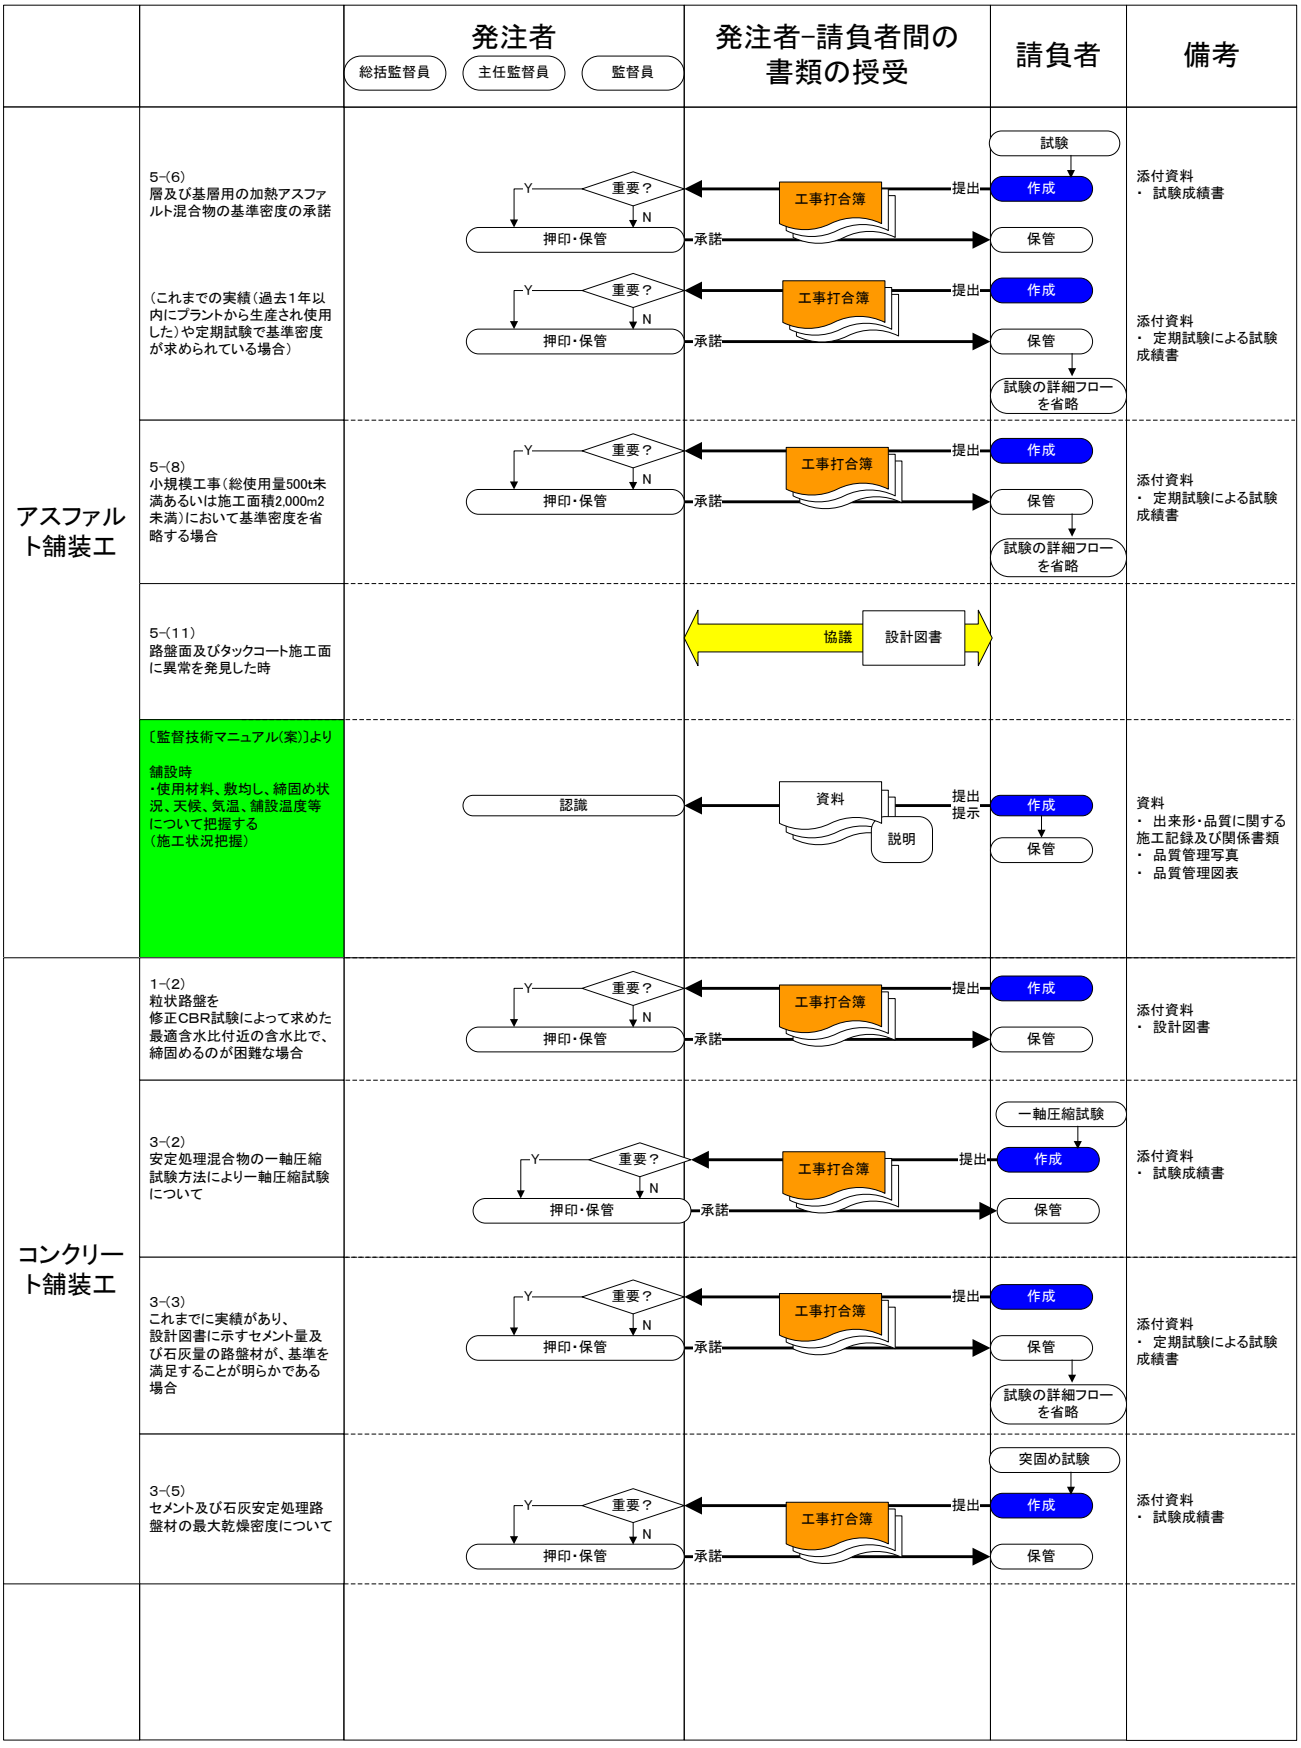

一般舗装工(No.033)－5／7

『コンクリート舗装工』

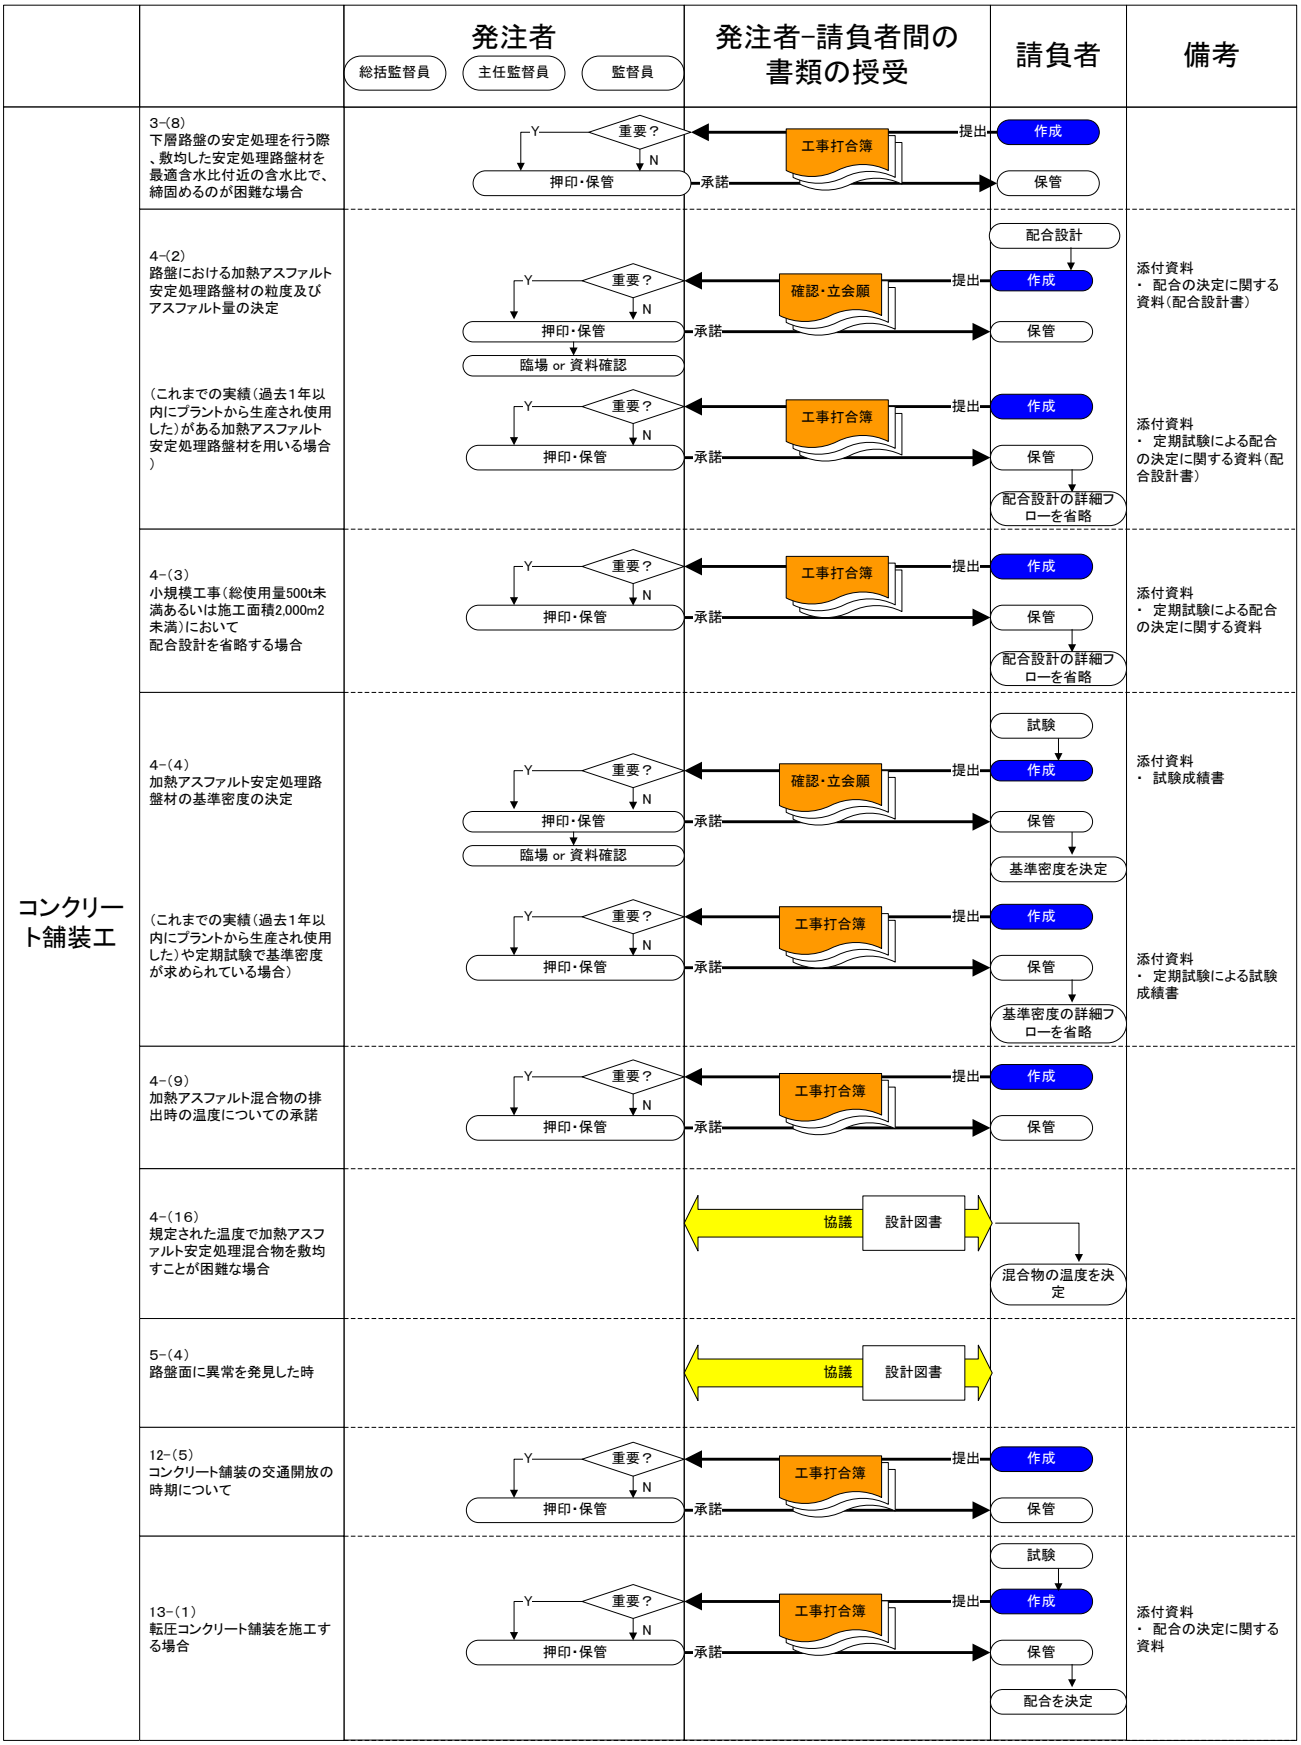

一般舗装工(No.033)－6／7

『コンクリート舗装工』

		発注者 総括監督員　主任監督員　監督員	発注者−請負者間の書類の授受	請負者	備考
コンクリート舗装工	13−(2) 転圧コンクリート舗装において、下層路盤、上層路盤にセメント安定処理工を使用する際、これまでの実績があり、設計図書に示すセメント安定処理混合物の路盤材が、基準を満足することが明らかである場合	重要？ Y／N 押印・保管	工事打合簿 提出／承諾	作成 保管 一軸圧縮試験の詳細フローを省略	添付資料 ・ 定期試験による試験成績書
	13−(3) 配合条件の承諾	重要？ Y／N 押印・保管	工事打合簿 提出／承諾	配合条件を決定 作成 保管	添付資料 ・ 配合の決定に関する資料
	13−(4) 示方配合の決定	重要？ Y／N 押印・保管	工事打合簿 提出／承諾	示方配合の決定 作成 保管	添付資料 ・ 示方配合表
	13−(5) 設計図書に示されない場合で、粗骨材の最大寸法を25mmとする時	重要？ Y／N 押印・保管	工事打合簿 提出／承諾	作成 保管	
	13−(8) 転圧コンクリートにおけるコンクリートの練りまぜ量の決定	重要？ Y／N 押印・保管	工事打合簿 提出／承諾	試験練り 作成 保管	添付資料 ・ 配合の決定に関する資料(試験練り報告書)
	13−(16) 養生期間終了後、転圧コンクリートを交通に開放する場合	重要？ Y／N 押印・保管	工事打合簿 提出／承諾	作成 保管	
	16 アスファルト混合物の事前認定審査を受けた混合物を、認定書の写しを提出することによって、配合設計、基準密度、試験練りに変える場合	重要？ Y／N 押印・保管	工事打合簿　認定書の写し 提出／承諾	作成 保管 配合設計、基準密度、試験練りの詳細フローを省略	添付資料 ・ 配合の決定に関する資料 (アスファルト混合物の事前認定審査認定書)
	〔監督技術マニュアル(案)〕より 舗設時 ・使用材料、敷均し、締固め状況、天候、気温、舗設温度等について把握する (施工状況把握)	認識	資料 説明 提出／提示	作成 保管	資料 ・ 出来形・品質に関する施工記録及び関係書類 ・ 品質管理写真 ・ 品質管理図表

一般舗装工(No.033)－7／7

『薄層カラー舗装工、ブロック舗装工』

		発注者 総括監督員　主任監督員　監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
薄層カラー舗装工	2. 基盤面に異常を発見した時				
ブロック舗装工	4. ブロック舗装工の施工について、基準類と設計図書に相違がある際に疑義がある場合			作成 保管	添付資料 ・設計図書

補足：【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。

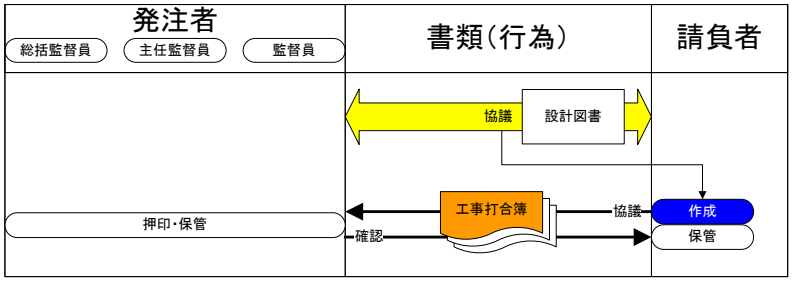

仮設工(No.037)

『電力設備工、防塵対策工』

		発注者 総括監督員 / 主任監督員 / 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
一般事項	設計図書の定めまたは監督職員の指示がある場合	作成 保管	指示 設計図書 工事打合簿	保管 指示に従った施工	
	設計図書の定めまたは監督職員の指示がある場合の仮設物の撤去	作成 保管	指示 設計図書 工事打合簿	保管 指示に従った施工	
電力設備工	電気事業法において定める自家用電気工作物施設の維持管理保守を行う場合の電気事業主任技術者	押印・保管	工事打合簿 通知 承諾	作成 保管	
防塵対策工	1. 工事車輌が車輪に泥土、土砂を付着したまま工事区域から外部に出る恐れがある場合の対策		協議 設計図書		
	2. 工事用機械及び車輌の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼすおそれがある場合の、散水あるいは路面清掃について		協議 設計図書		

補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。

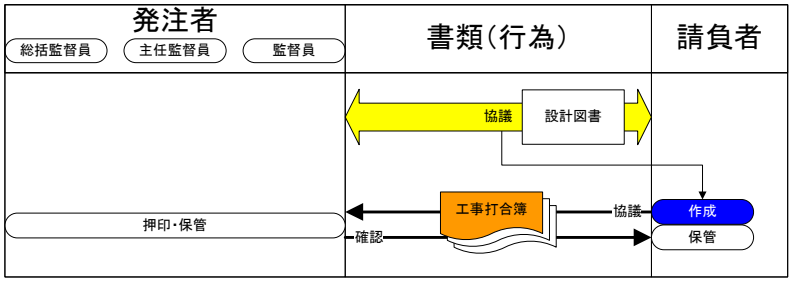

護岸基礎工(No.039)

『作業土工(床掘り・埋戻し)、基礎工、矢板工、土台基礎工

		発注者 総括監督員 / 主任監督員 / 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
一般	〔監督技術マニュアル(案)〕より 法線設置完了時 ・法線の設置状況について設計図書と対比し確認する。				添付資料 ・ 法線の設置状況が確認できる資料 ・ 設計図書
作業土工(床掘り・埋戻し)		参照：共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016			
基礎工		参照：共仕 第3編 2-4-3 基礎工(護岸)、フローNo.031			
	〔監督技術マニュアル(案)〕より 設置完了時 ・不可視部分について、埋戻し前に設計図書と現地で対比し確認する。				添付資料 ・ 出来形管理写真 ・ 出来形管理図表 ・ 品質管理写真 ・ 品質管理図表 ・ 設計図書
矢板工		参照：共仕 第3編 2-3-4 矢板工，フローNo.017			
土台基礎工		参照：共仕 第3編 2-4-3 土台基礎工、フローNo.031			
		補足：【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。 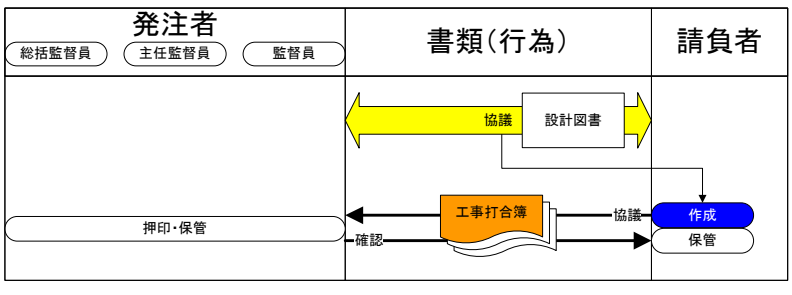			

築堤・護岸 水制工(No.044)

『作業土工、沈床工、捨石工、かご工、元付工』

<table>
<tr><th></th><th></th><th>発注者
総括監督員 主任監督員 監督員</th><th>発注者−請負者間の書類の授受</th><th>請負者</th><th>備考</th></tr>
<tr><td rowspan="2">一般事項</td><td>2. 水制工の施工については、予期しない障害となる工作物等が現れた場合</td><td></td><td>協議 設計図書</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3. 設計図書おいて設置方法及び順序を指定した場合に係る河床変動に対する処置</td><td></td><td>協議 設計図書</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>作業土工
(床掘り・埋戻し)</td><td></td><td colspan="3">参照:共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016</td><td></td></tr>
<tr><td>沈床工</td><td></td><td colspan="3">参照:共仕 第6編 1-7-5 沈床工、フローNo.043(省略)</td><td></td></tr>
<tr><td>捨石工</td><td></td><td colspan="3">参照:共仕 第6編 1-7-6 捨石工、フローNo.043(省略)</td><td></td></tr>
<tr><td>かご工</td><td></td><td colspan="3">参照:共仕 第6編 1-5-13 羽口工、フローNo.041(省略)</td><td></td></tr>
<tr><td>元付工</td><td></td><td colspan="3">参照:共仕 第1編 第3章 無筋、鉄筋コンクリート、フローNo.003,006,007,008</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="4">補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。
 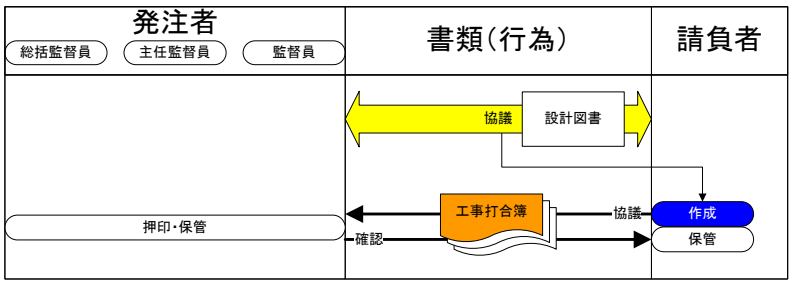
</td></tr>
</table>

浚渫（川）_浚渫工（ポンプ浚渫船）(No.048)

『浚渫船運転工（民船・官船）、作業船及び機械運転工、配土工』

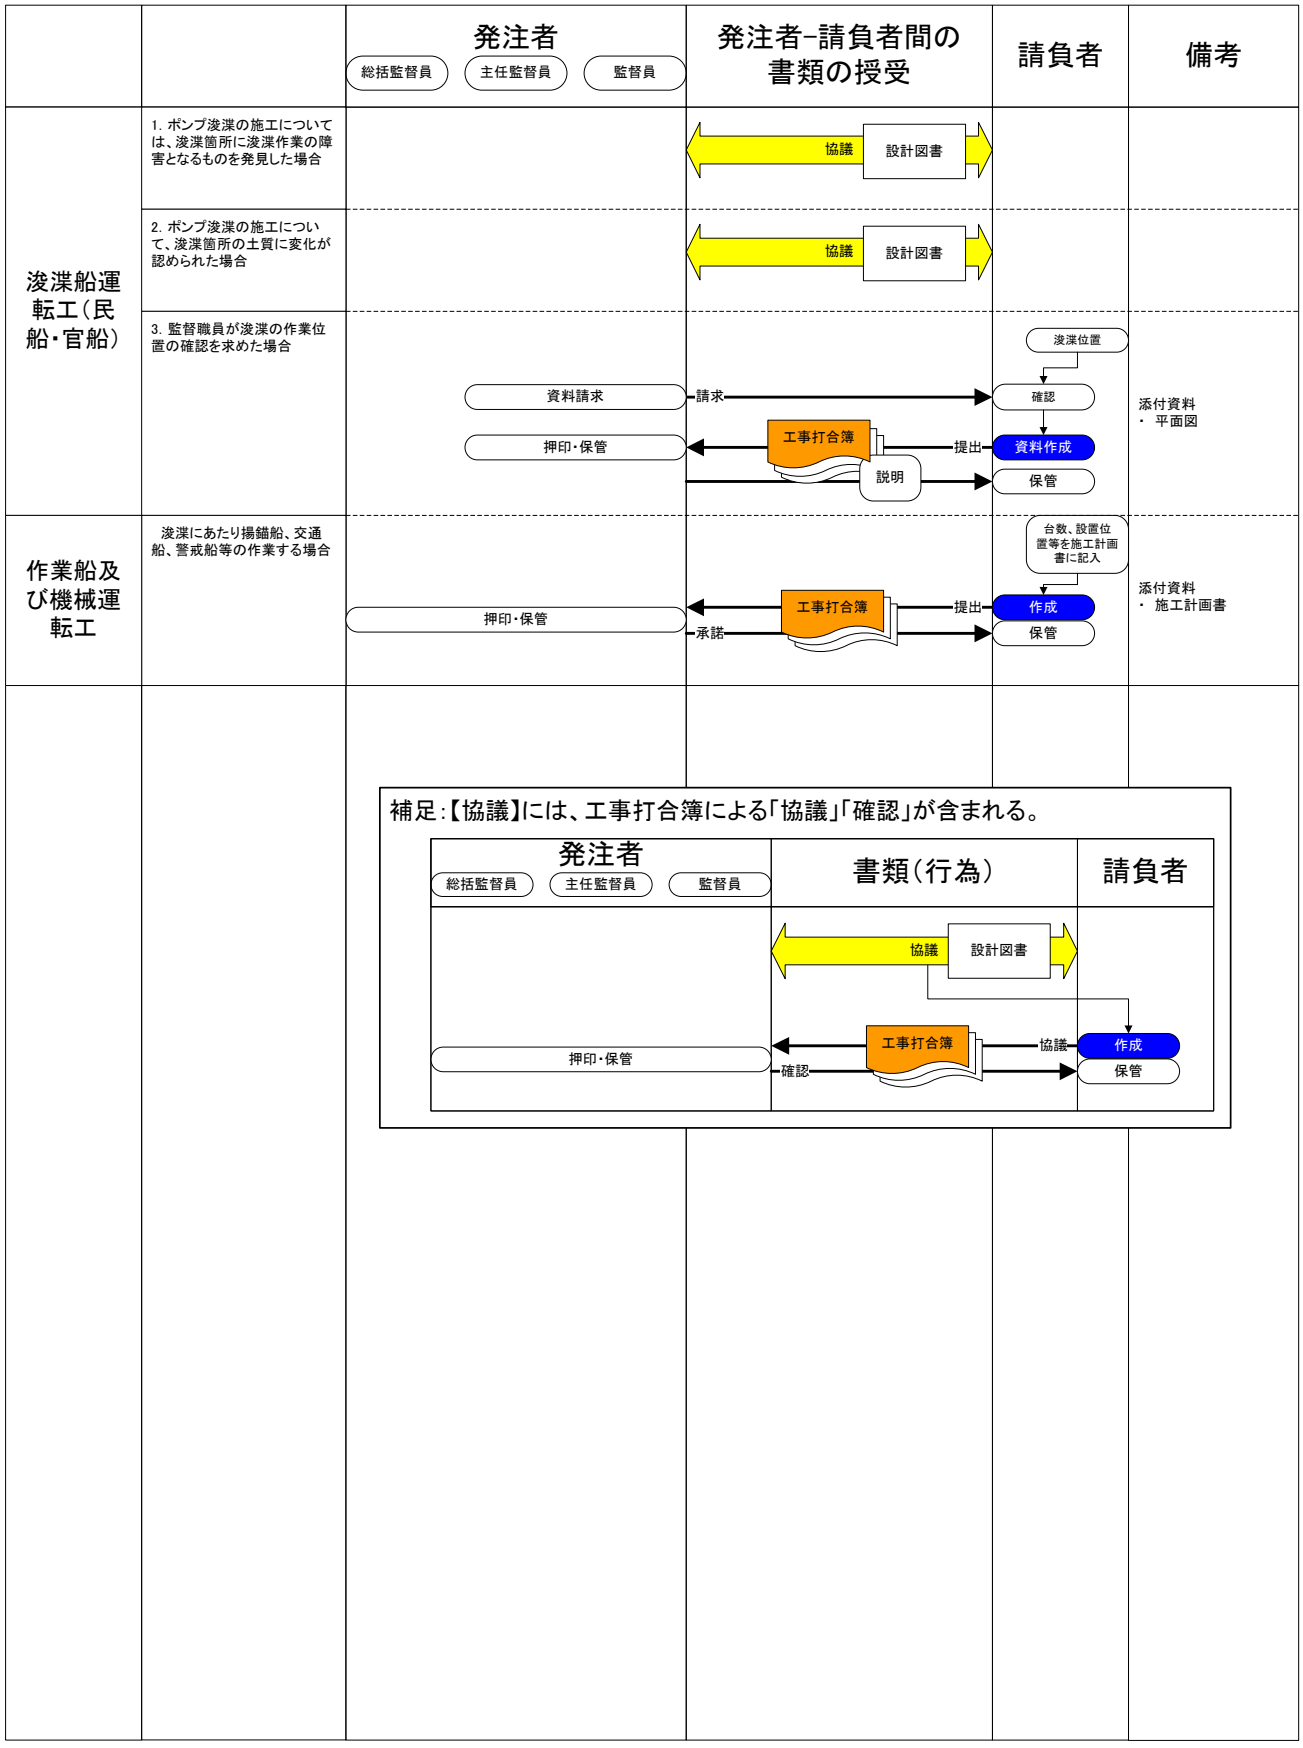

水門_護床工(No.058)

『作業土工、根固めブロック工、間詰工、沈床工、捨石工、かご工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
作業土工（床掘り・埋戻し）		参照：共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016			
根固めブロック工		参照：共仕 第6編 1-7-3 根固めブロック工、フローNo.043（省略）			
間詰工		参照：共仕 第1編 第3章 無筋、鉄筋コンクリート、フローNo.003,006,007,008			
沈床工		参照：共仕 第6編 1-7-5 沈床工、フローNo.043（省略）			
捨石工		参照：共仕 第6編 1-7-6 捨石工、フローNo.043（省略）			
かご工		参照：共仕 第6編 1-5-13 羽口工、フローNo.041（省略）			

河川維持 巡視・巡回工(No.092)

『河川巡視工』

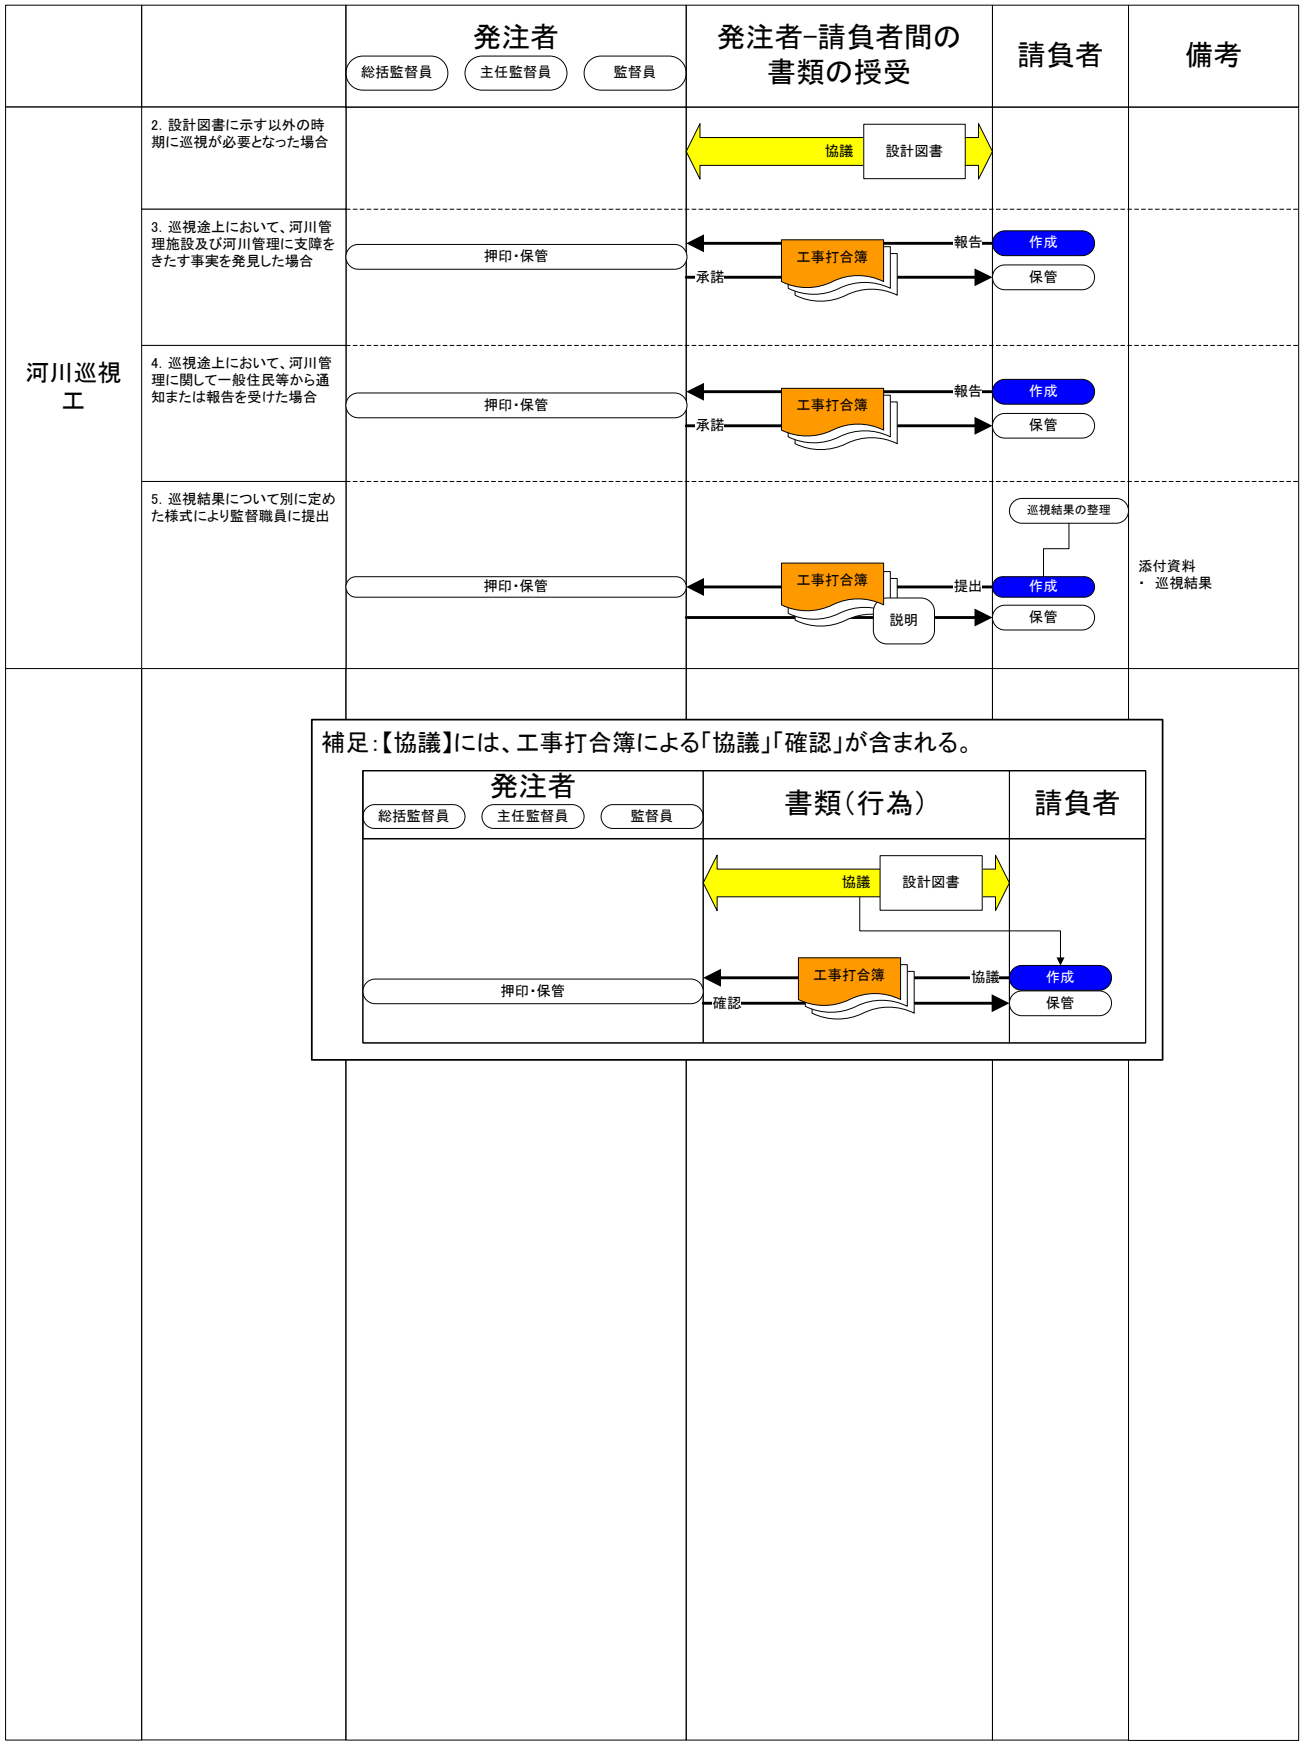

河川修繕 腹付工(No.104)

『覆土工、植生工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
覆土工		参照：共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016			
植生工		参照：共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016			

流路 根固め・水制工(No.141)

『作業土工、埋戻し工、根固めブロック工、間詰工、捨石工、かご工、元付工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
作業土工(床掘り・埋戻し)		参照:共仕 第8編 1-6-2 作業土工、フローNo.133(省略)			
埋戻し工		参照:共仕 第8編 1-6-3 埋戻し工、フローNo.133(省略)			
根固めブロック工		参照:共仕 第8編 1-8-4 根固めブロック工、フローNo.135(省略)			
間詰工		参照:共仕 第8編 1-6-7 間詰工、フローNo.133(省略)			
捨石工	2. 施工箇所において流水により護岸基礎工に影響がある場合	協議 設計図書			
かご工		参照:共仕 第8編 1-8-7 かご工、フローNo.135(省略)			
元付工		参照:共仕 第1編 第3章 無筋、鉄筋コンクリート 、フロー003～015(一部省略)			

補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。

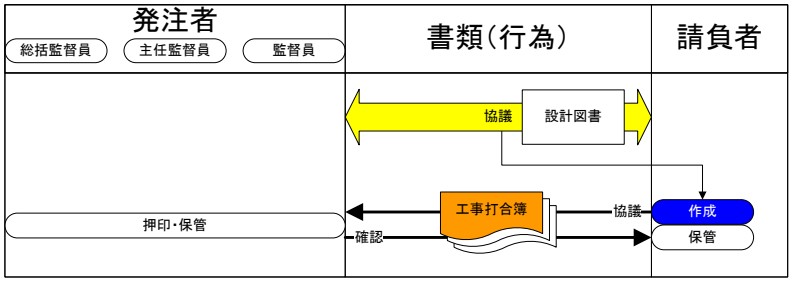

道路改良 工場製作工(No.164)

『遮音壁支柱製作工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
遮音壁支柱製作工	製作加工図を必要とする場合			作成 保管	添付資料 ・ 図面（製作加工図）
	部材の切断をガス切断以外で行う場合			作成 保管	添付資料 ・ 設計図書

道路改良 法面工(No.165)

『法面施肥工、アンカー工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
一般	のり面工・斜面安定工指針3設計と施工、のり枠工の設計・施工指針第5章施工、グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説第7章施工に規定される施工方法以外とする場合			作成 保管	添付資料 ・ 設計図書
法面施肥工	種類、使用量が施工箇所に適さない場合				
アンカー工	法面の安定、地盤の状況、地中障害物、湧水の調査結果で以上を発見した場合			異常発見 作成 保管	添付資料 ・ 土の試料整理表等 ・ 機械ボーリング作業日報
	掘削長さに変化が生じた場合				

補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。

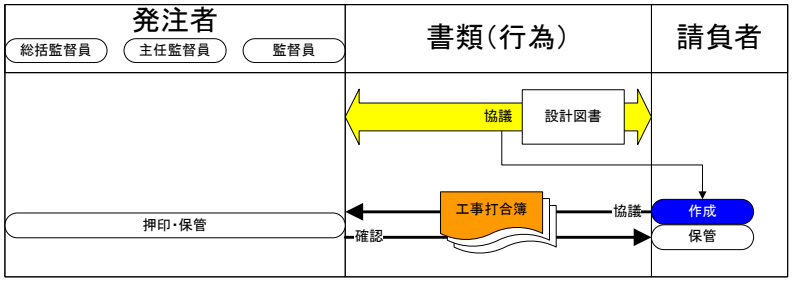

道路改良 擁壁工(No.166)

『作業土工、既製杭工、場所打杭工、場所打擁壁工、補強土壁工』

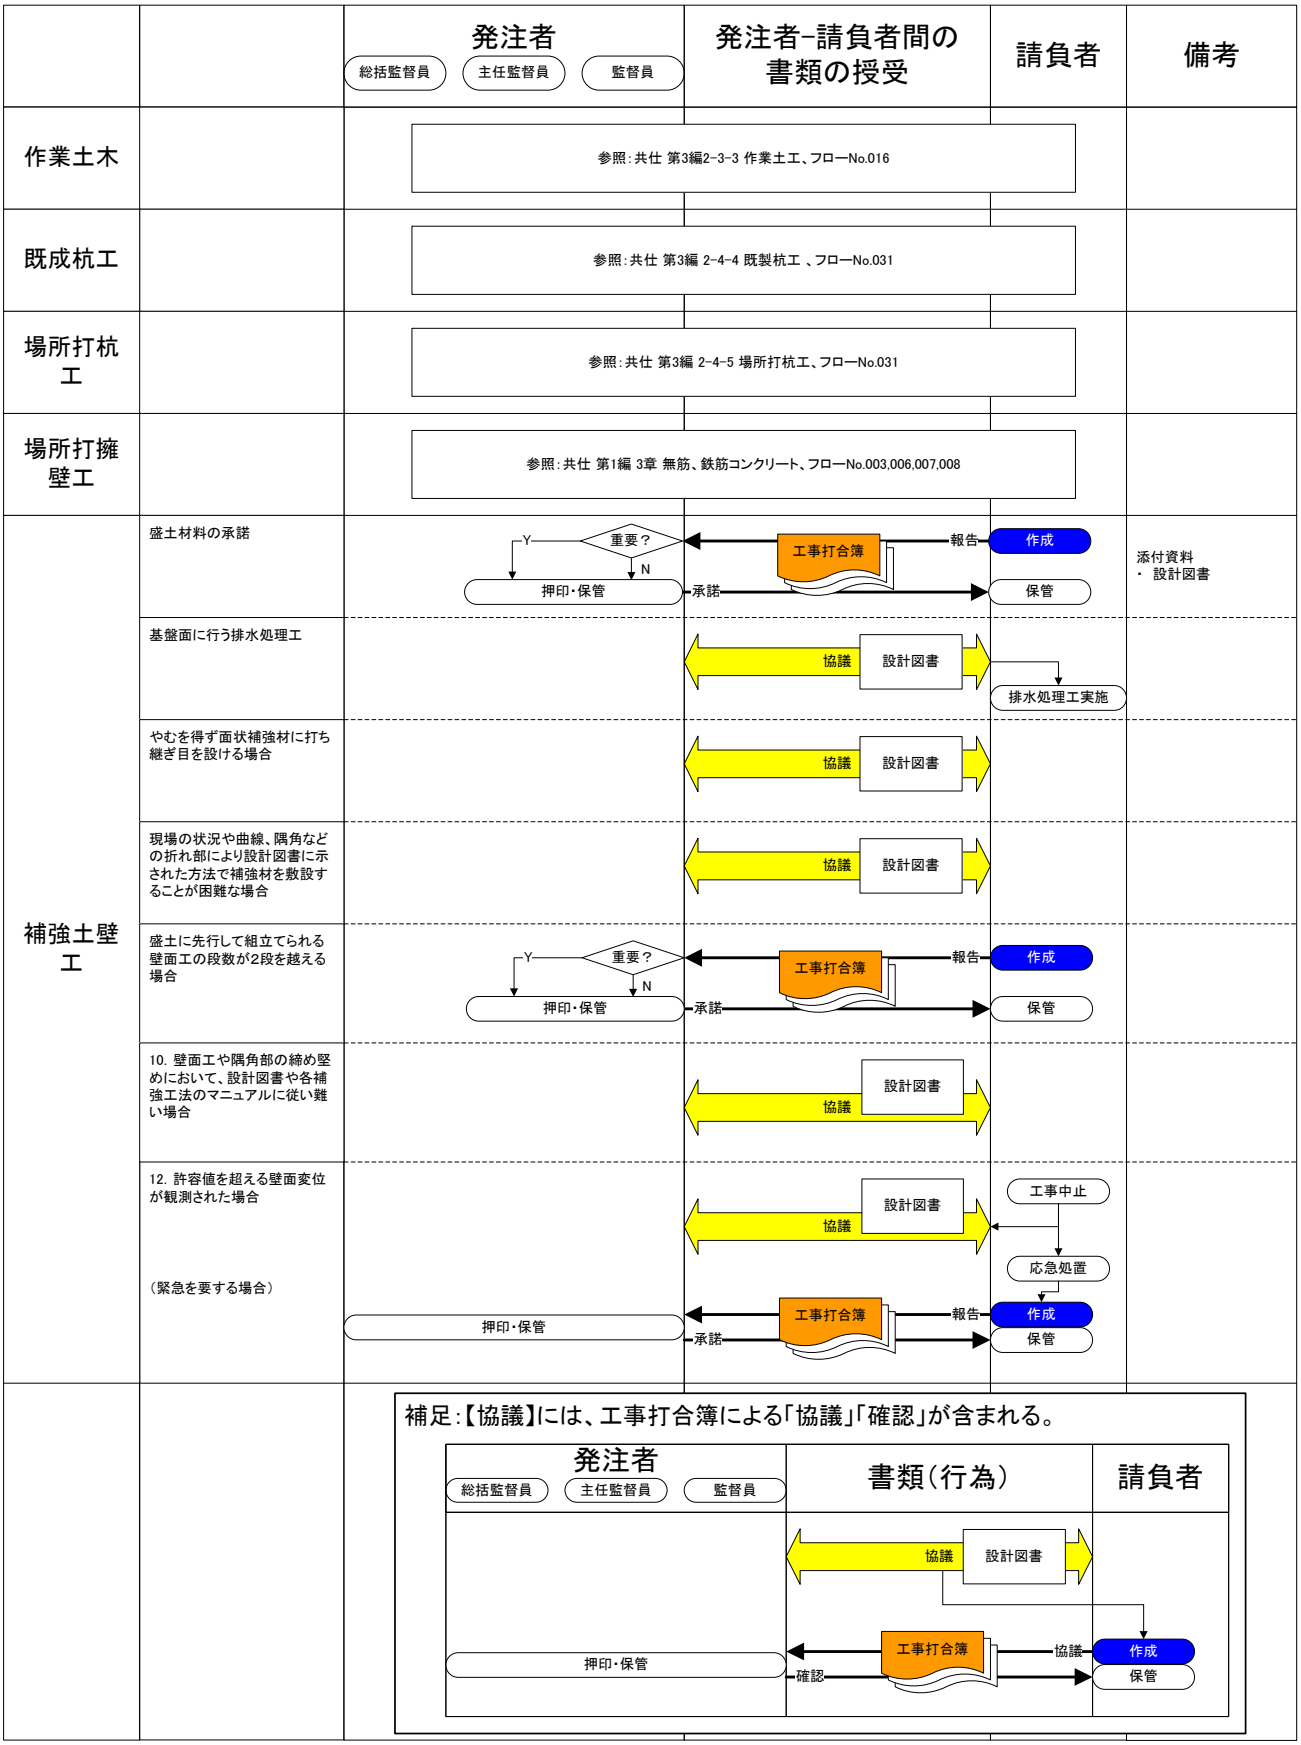

道路改良 石・ブロック積（張）工(No.167)

『作業土工、コンクリートブロックエ、石積（張）工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
一般		参照：共仕 第3編 2-5-1 一般事項、フローNo.032			
作業土木		参照：共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016			
コンクリートブロックエ		参照：共仕 第3編 2-5-3 コンクリートブロックエ、フローNo.032			
石積（張）工		参照：共仕 第3編 2-5-5 石積（張）工、フローNo.032			

道路改良 カルバート工(No.168)－1／2

『作業土工、既製杭工、場所打杭工、場所打函渠工』

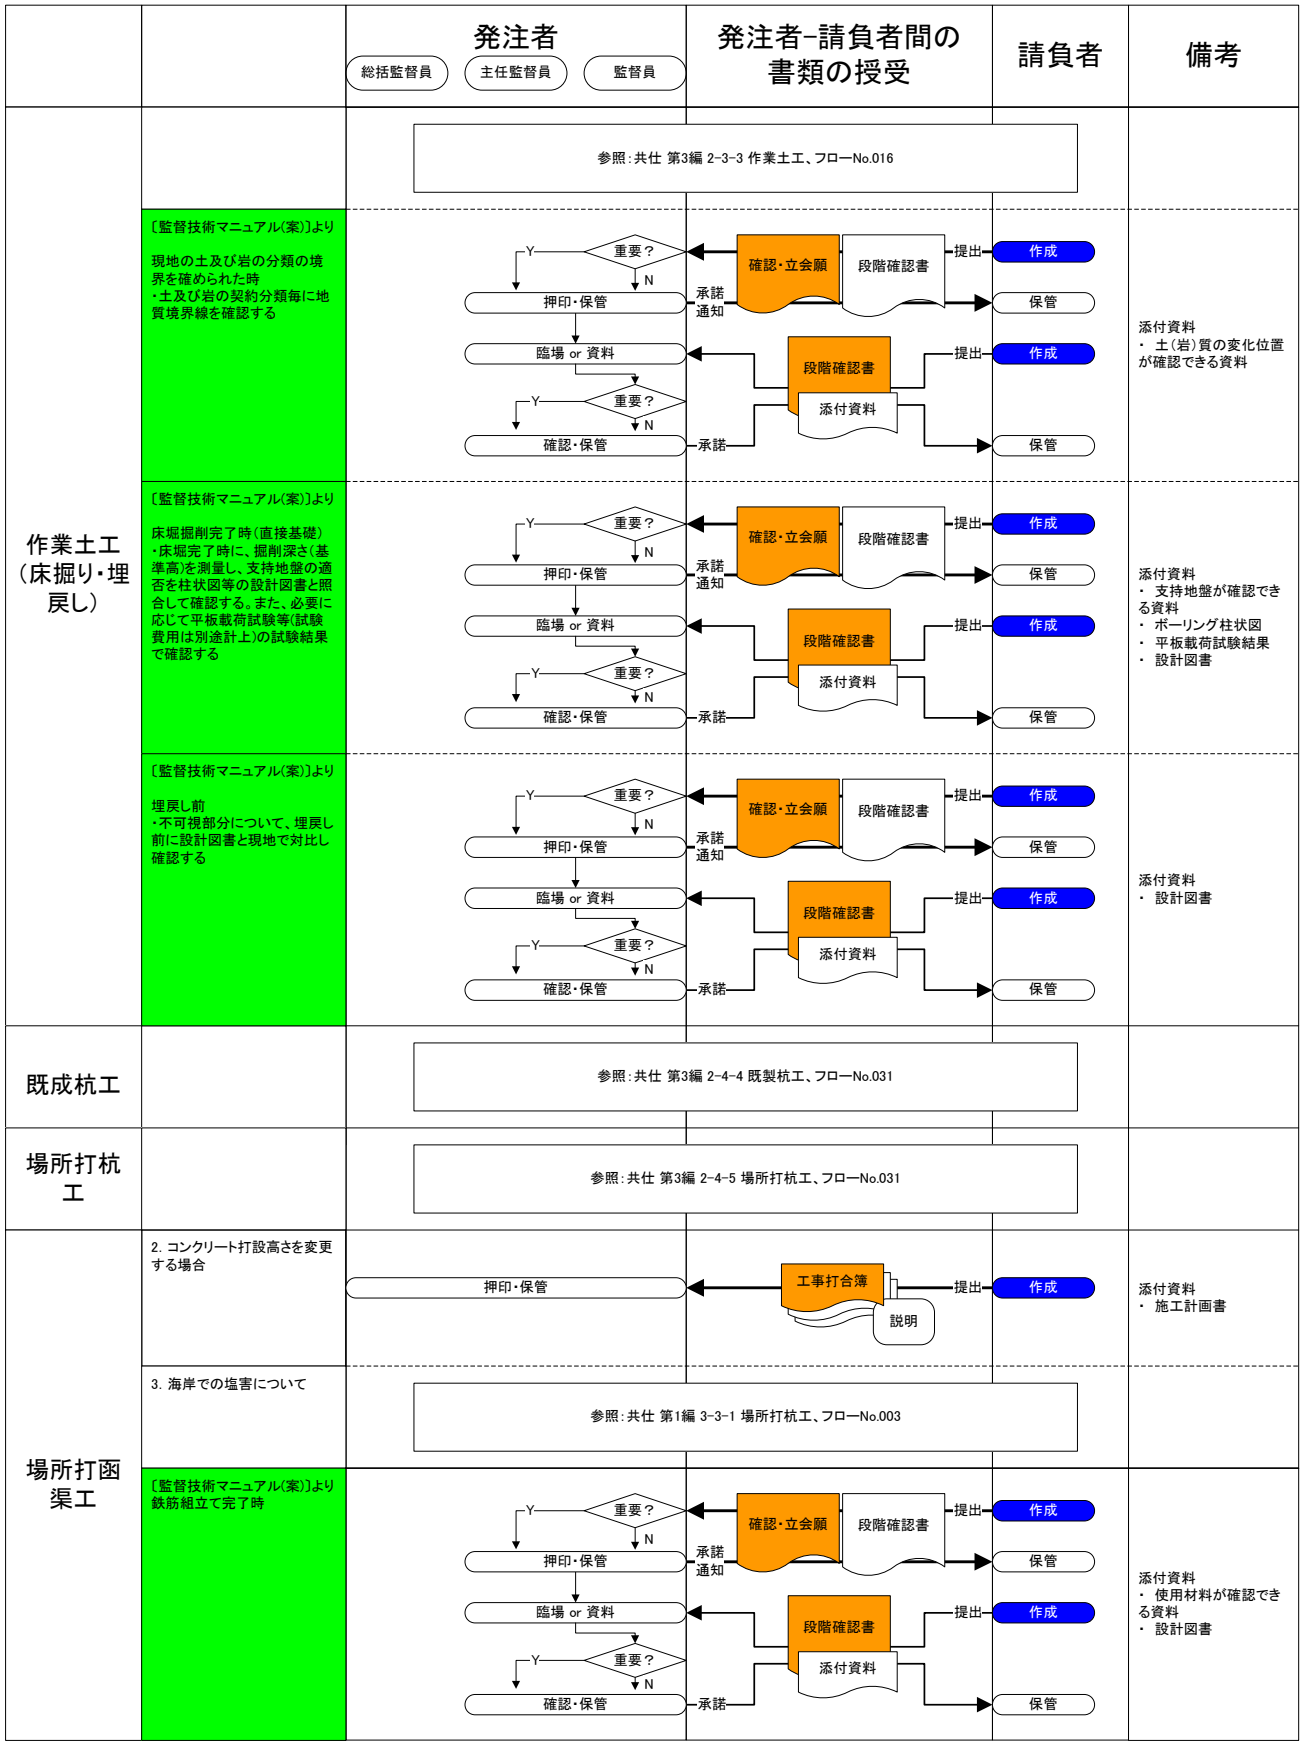

道路改良 カルバート工(No.168) －2／2

『プレキャストカルバート工』

<table>
<tr><th></th><th></th><th>発注者
総括監督員 主任監督員 監督員</th><th>発注者-請負者間の
書類の授受</th><th>請負者</th><th>備考</th></tr>
<tr><td rowspan="2">プレキャストカルバート工</td><td>1. 現地の状況により設計図書に示された据付け勾配により難い場合</td><td></td><td> 
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3. プレキャストボックスカルバートの縦締め施工については、ボックスカルバート工指針の規定以外の施工方法とする場合</td><td> 
</td><td>
</td><td>作成
保管</td><td>添付資料
・ 設計図書</td></tr>
</table>

補足：【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。

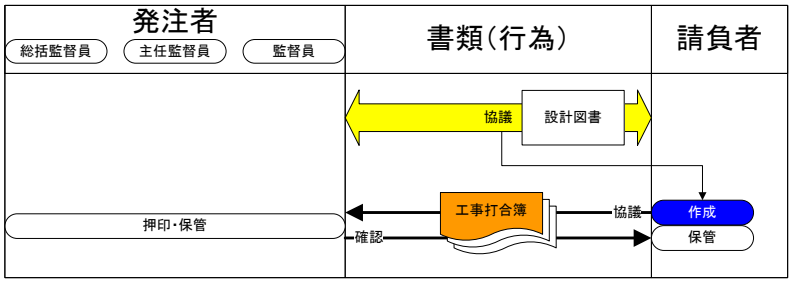

道路改良 排水構造物工（小型水路工）(No.169)

『作業土工、側溝工、管渠工、集水桝・マンホール工、地下排水工、
場所打水路工、排水工（小段排水・縦排水）』

		発注者 総括監督員　主任監督員　監督員	発注者−請負者間の書類の授受	請負者	備考
作業土工（床掘り・埋戻し）		参照：共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016			
側溝工	1. 、現地の状況により、設計図書に示された水路勾配により難い場合		協議 ⇔ 設計図書		
	3. コルゲートフリュームの布設にあたって、予期できなかった砂質土または軟弱地盤が出現した場合		協議 ⇔ 設計図書		
	5. コルゲートフリュームの布設において、上げ越しが必要な場合		協議 ⇔ 設計図書		
	6. 自由勾配側溝の底版コンクリートのコンクリート厚を変更する場合		協議 ⇔ 設計図書		
管渠工	1. 現地の状況により設計図書に示された水路勾配により難い場合		協議 ⇔ 設計図書		
集水桝・マンホール工	3. 集水桝及びマンホール工の施工について、路面との高さ調整が必要な場合	重要？ Y→押印・保管 / N	工事打合簿 提出→作成 / 承諾→保管		添付資料 ・ 設計図書
地下排水工	1. 新たに地下水脈を発見した場合	押印・保管	工事打合簿 報告→作成 / 指示→保管		
場所打水路工	1. 現地の状況により、設計図書に示された水路勾配により難い場合		協議 ⇔ 設計図書		
排水工（小段排水・縦排水）	1. 現地の状況により、設計図書に示された水路勾配により難い場合		協議 ⇔ 設計図書		

補足：【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。

発注者 総括監督員　主任監督員　監督員	書類（行為）	請負者
	協議 ⇔ 設計図書	
押印・保管	工事打合簿 確認→協議→作成 / 保管	

道路改良 落石雪害防止工(No.170)

『作業土工、落石防止網工』

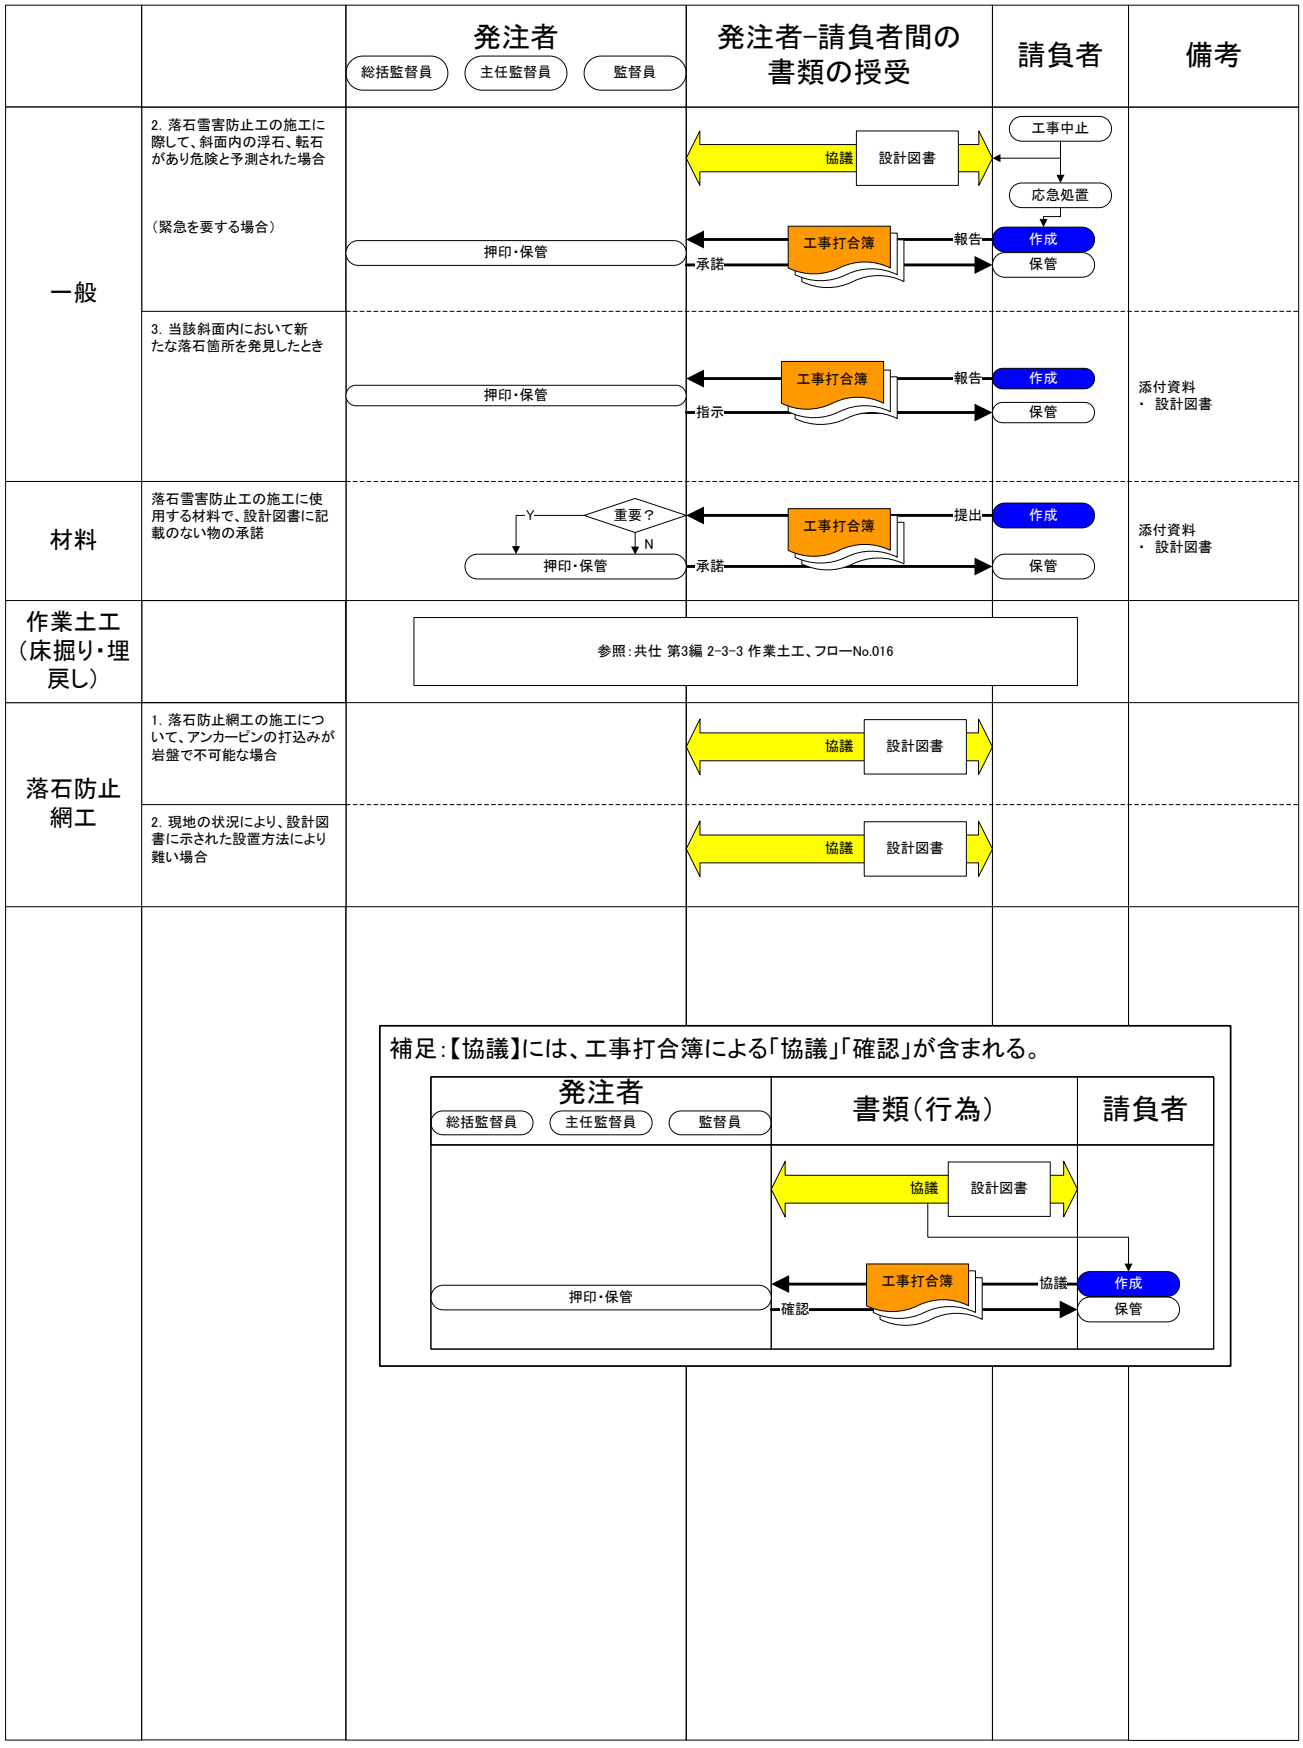

道路改良 遮音壁工(No.171)

『作業土工、遮音壁基礎工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
材料	5. 設計図書に記載されている以外の材料を用いる場合				添付資料 ・ 設計図書
作業土工（床掘り・埋戻し）		参照：共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016			
遮音壁基礎工	支柱アンカーボルトの設置について、設計図書以外による場合				添付資料 ・ 設計図書

舗装工(No.172)－1／3

『舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工』

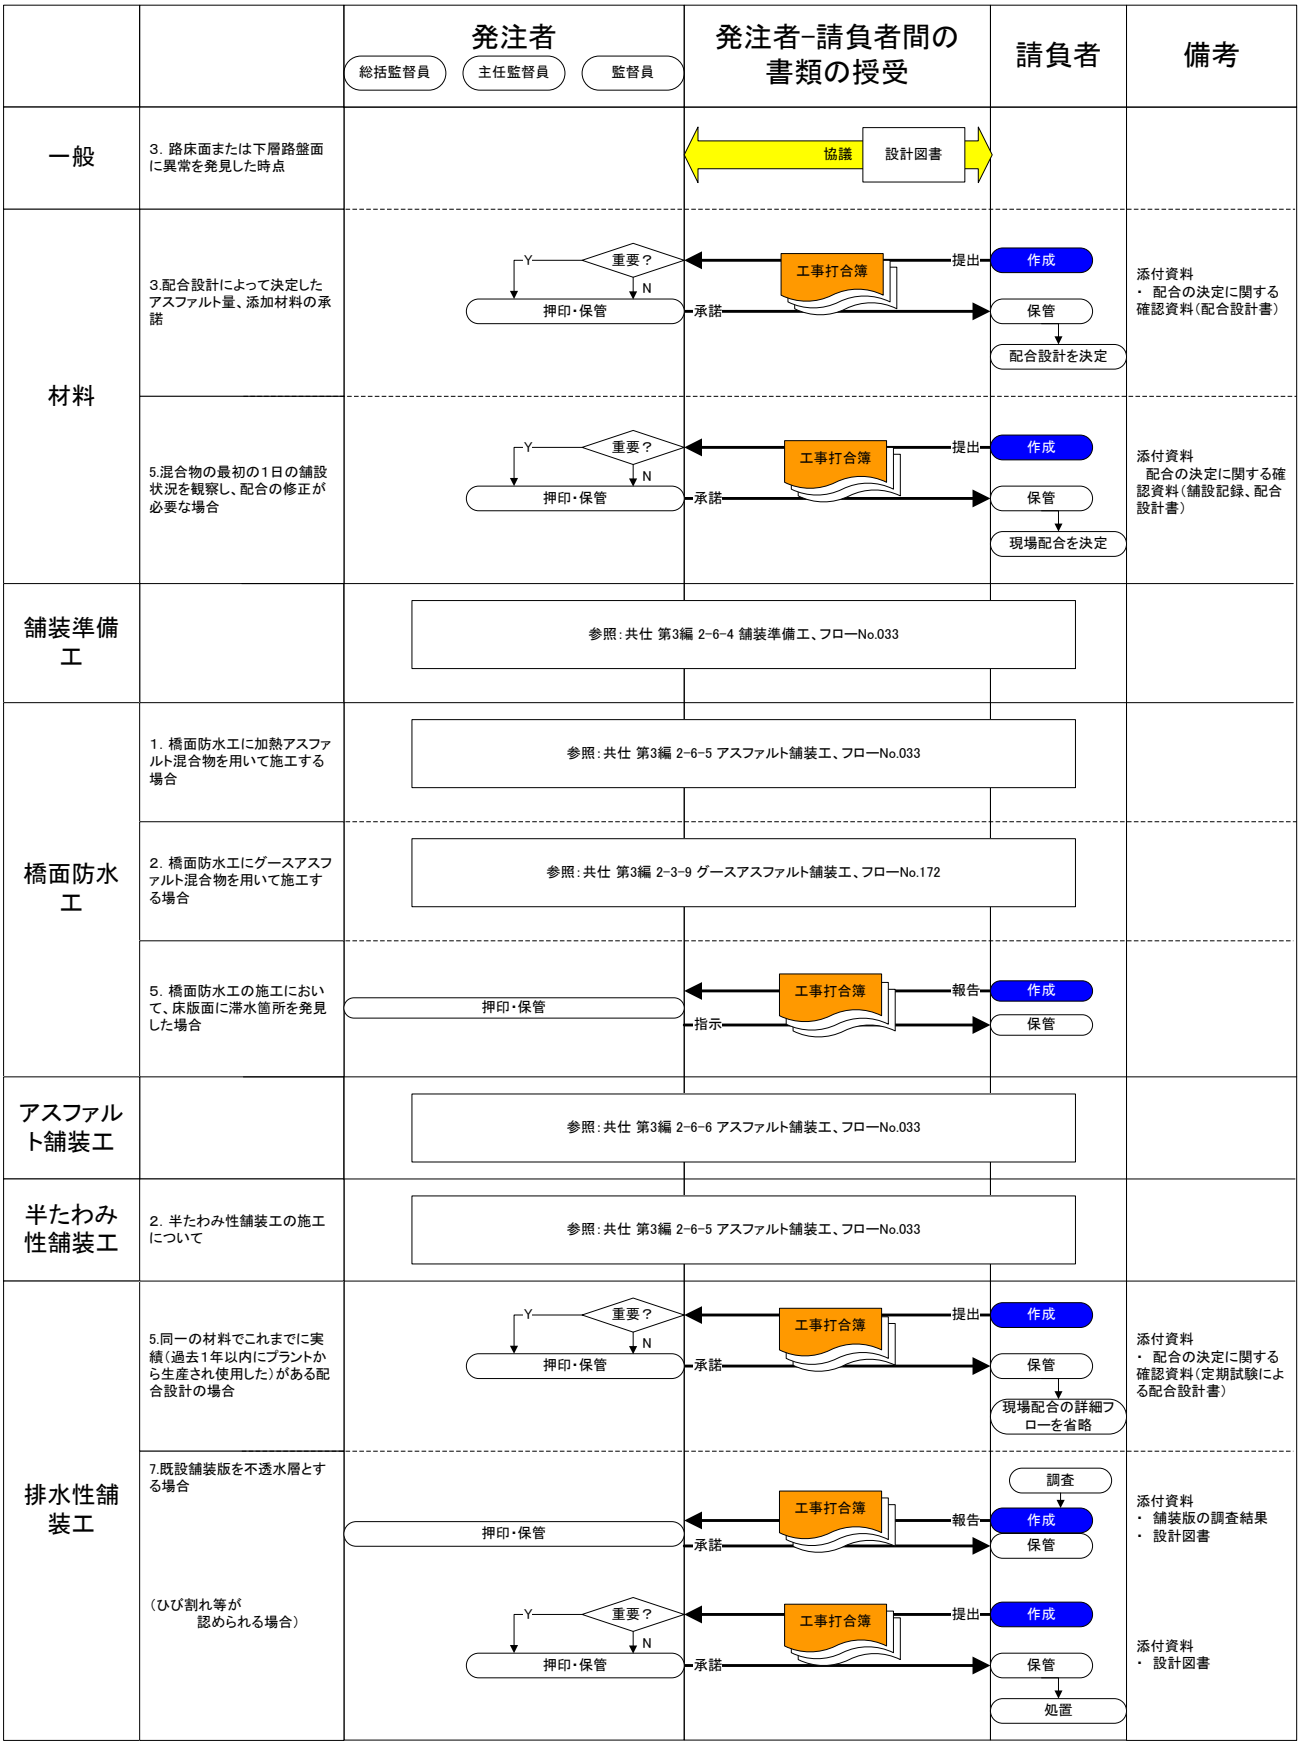

舗装工(No.172)－2／3

『透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工』

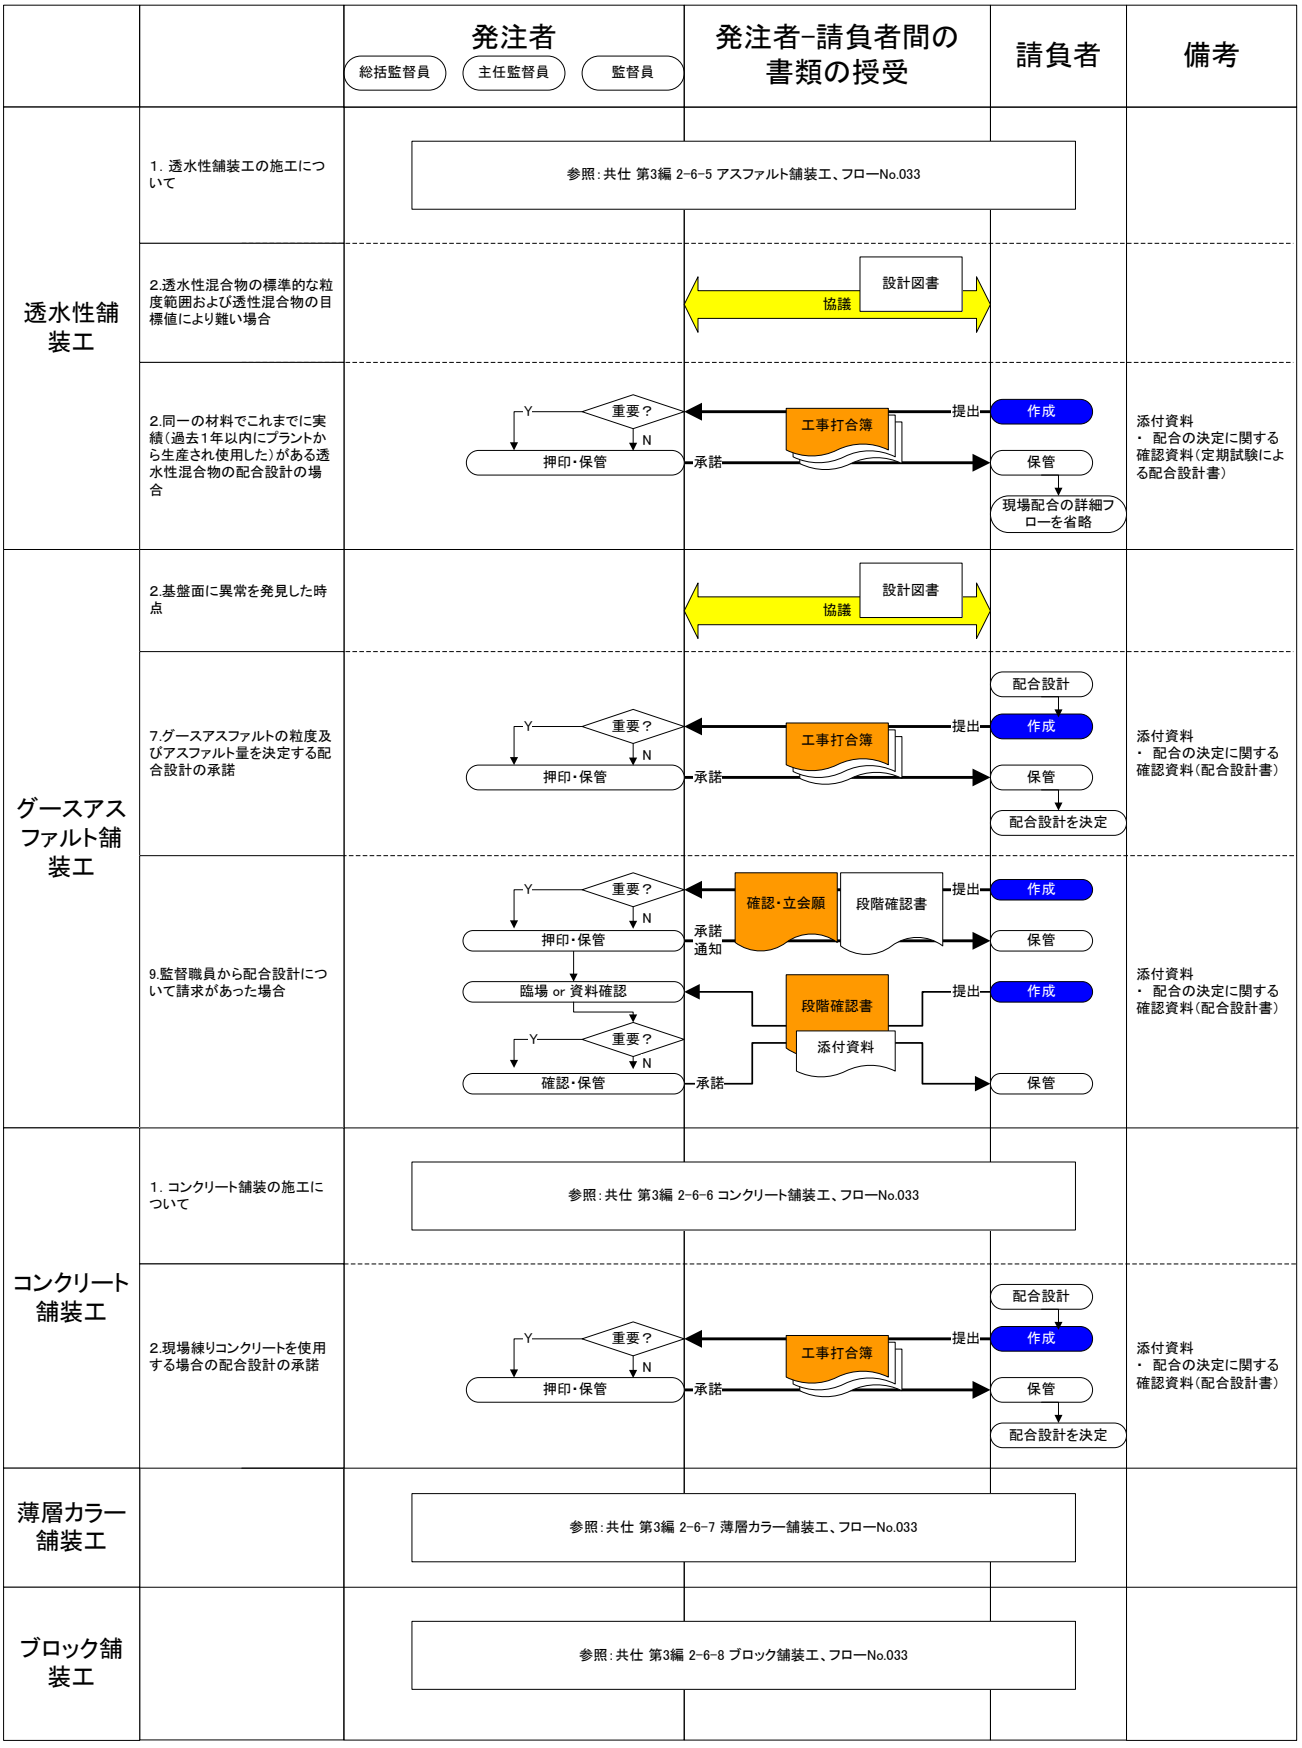

		発注者 総括監督員　主任監督員　監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
		補足:【協議】には、工事打合せ簿による「協議」「確認」が含まれる。 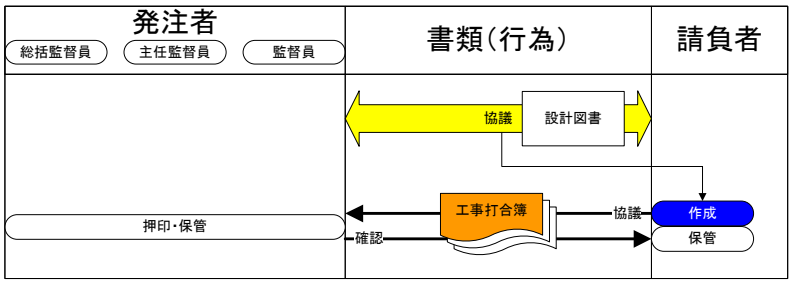 			

舗装 排水構造物工（路面排水工）(No.173)

『作業土工、側溝工、管渠工、場所打水路工、排水工（小段排水・縦排水）』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
作業土工（床掘り・埋戻し）		参照：共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016			
側溝工	L型側溝またはLO型側溝、プレキャストU型側溝の設置する勾配について	作成 保管	指示 工事打合簿	保管 施工実施	添付資料 ・設計図書
管渠工	1. 管渠の設置について 2. 管渠のコンクリート製品の接合部について	参照：共仕 第10編 2-4-3 側溝工、フローNo.033			
地下排水工	地下排水工の施工について	参照：共仕 第10編 1-8-6 地下排水工、フローNo.169			
場所打水路工	場所打水路工の施工について	参照：共仕 第10編 1-8-7 場所打水路工、フローNo.169			
排水工（小段排水・縦排水）	排水工（小段排水・縦排水）の施工について	参照：共仕 第10編 1-8-8 排水工（小段排水・縦排水）、フローNo.169			

縁石工(No.174)

『作業土工(床掘り・埋戻し)、縁石工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
一般	2.縁石工の施工にあたり、障害物がある場合		協議 設計図書		
作業土工(床掘り・埋戻し)		参照:共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016			
縁石工		参照:共仕 第3編 2-3-8 縁石工、フローNo.016			
		補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。 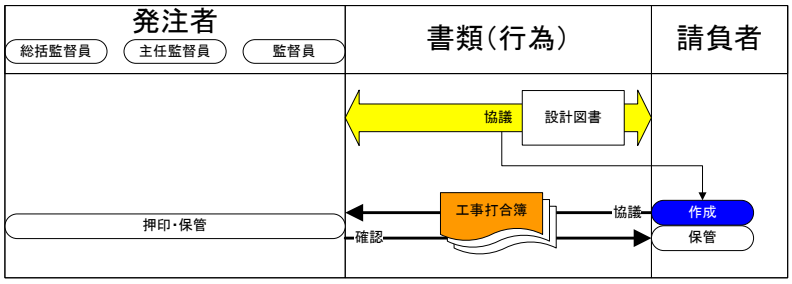 			

舗装 防護柵工(No.176)

『路側防護柵工、防止柵工、作業土工、ボックスビーム工、車止めポスト工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
一般	2. 、防護柵を設置する際に、障害物がある場合		協議 設計図書		
		参照:共仕 第3編 2-3-11 路側防護柵工、フローNo.024 共仕 第3編 2-3-10 防止柵工、フローNo.023			
作業土工(床掘り・埋戻し)		参照:共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016			
路側防護柵工		参照:共仕 第3編 2-3-11 路側防護柵工、フローNo.024			
防止柵工		参照:共仕 第3編 2-3-10 防止柵工、フローNo.023			
ボックスビーム工	3. 支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中にボックスビームを設置する場合		協議 設計図書		
車止めポスト工	車止めポストを設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合		協議 設計図書		

補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。

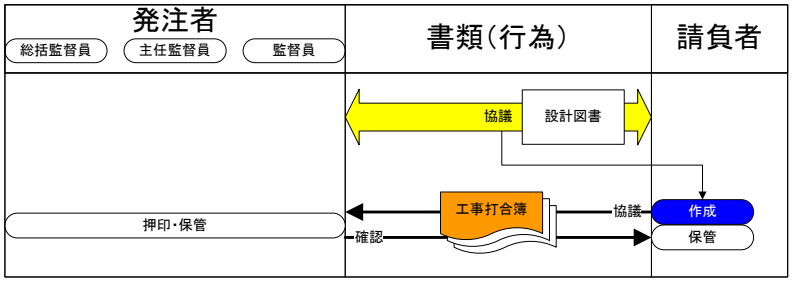

舗装工 標識工(No.177)

『小型標識工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
一般	2. 標識の設置において、障害物がある場合		協議 設計図書		
	3.	参照:共仕 第3編 2-3-9 小型標識工、フローNo.022 共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016 共仕 第3編 2-10-5 土留・仮締切工、フローNo.037(省略)			
材料		参照:共仕 第2編 2-12-1 道路標識、フローNo.272(省略)			
小型標識工		参照:共仕 第3編 2-3-9 小型標識工、フローNo.022			
		補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。 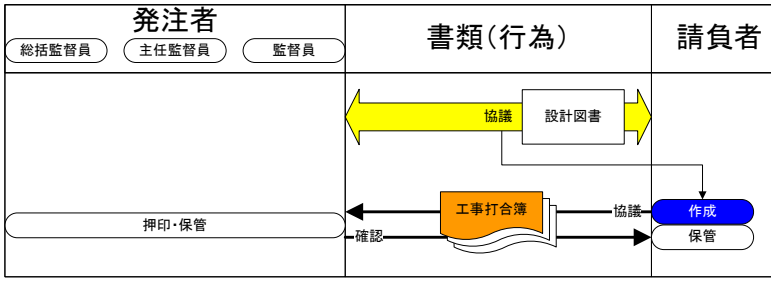			

舗装 区画線工(No.178)

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
一般	2. 区画線工の施工にあたり、障害物がある場合				
	3.				
		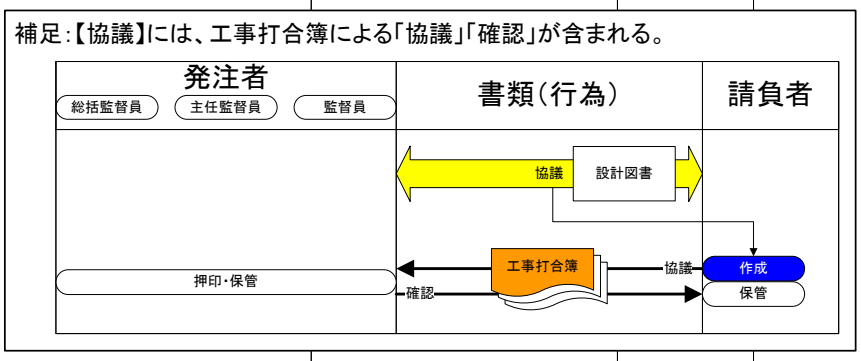			

舗装工 道路植栽工(No.179)

『道路植栽工』

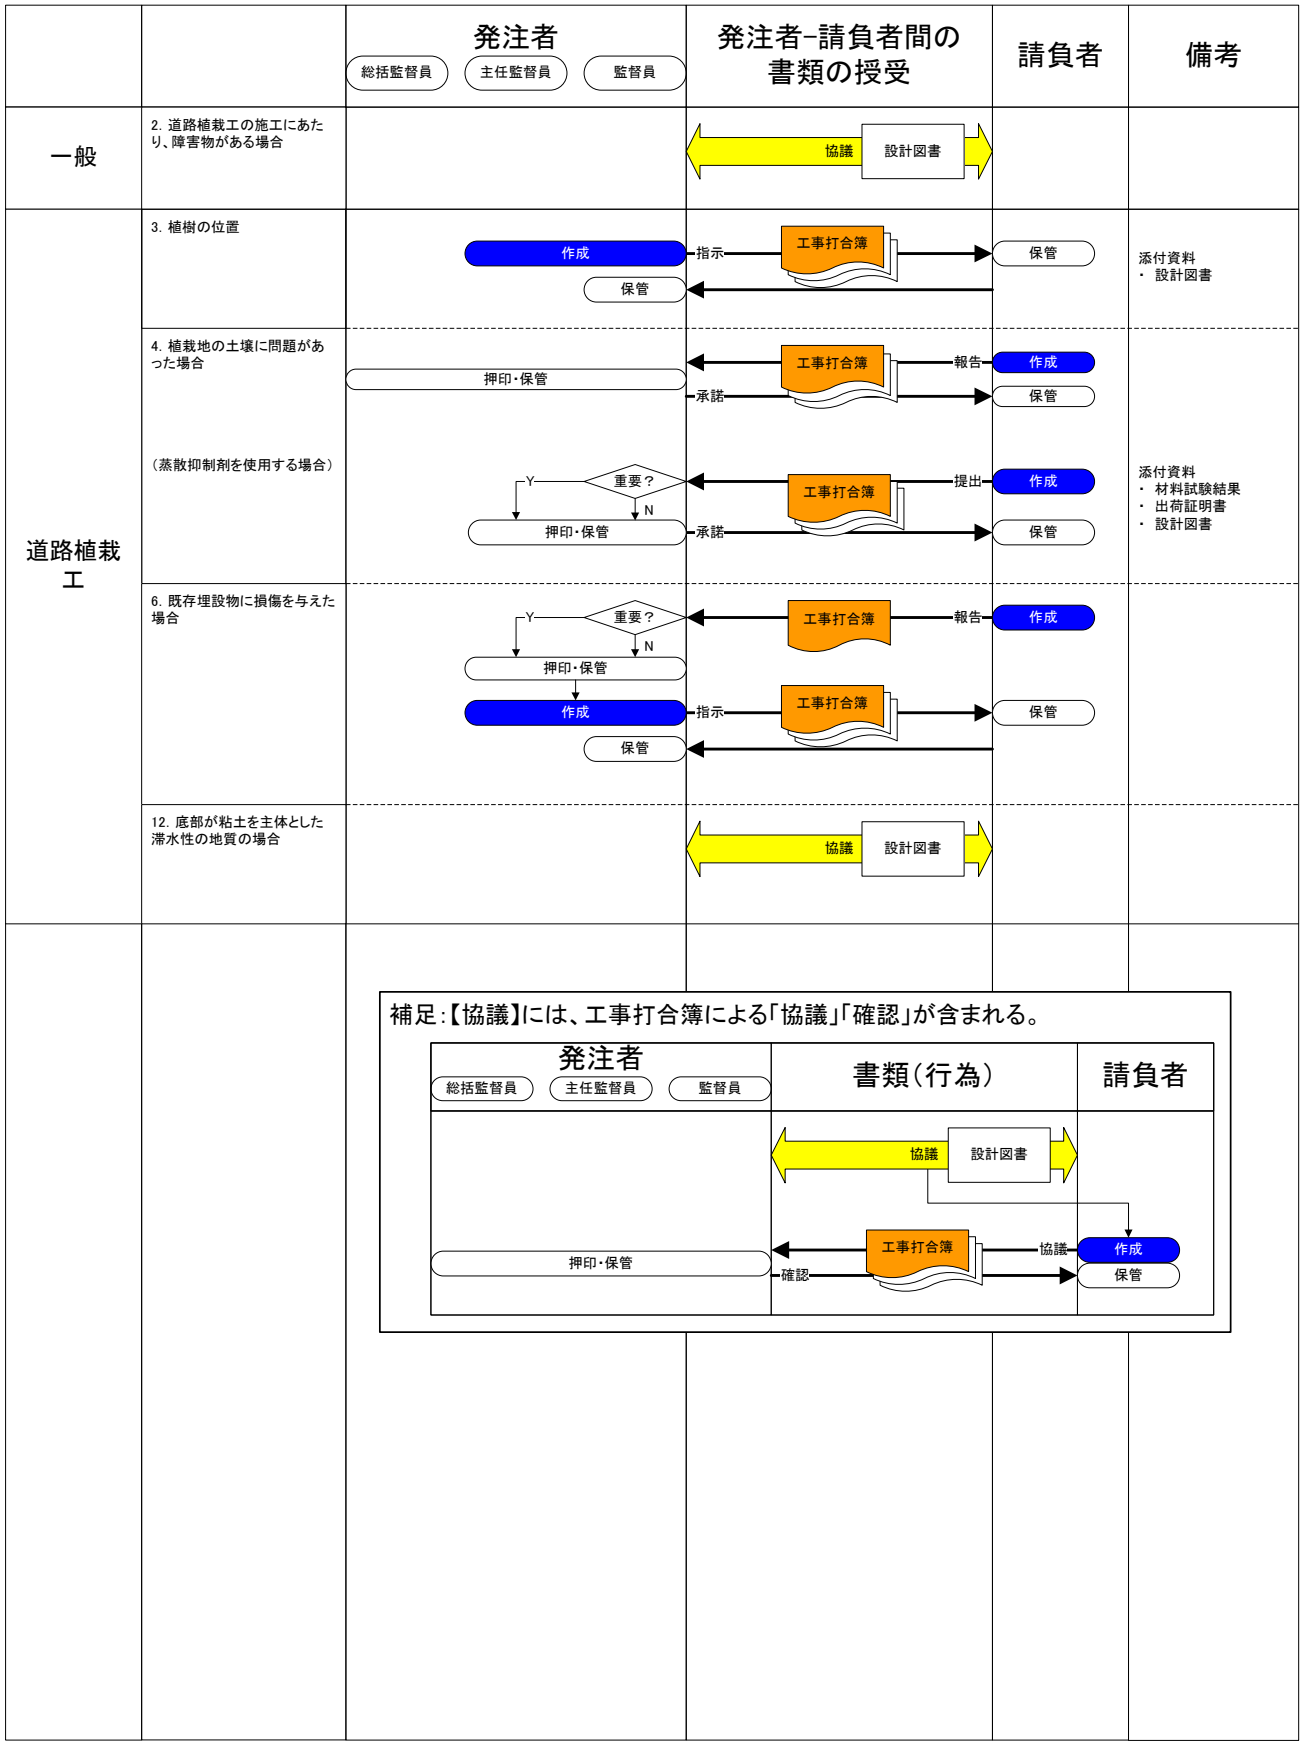

舗装工 道路付属施設工(No.180)

『境界工、道路付属物工、ケーブル配管工、照明工』

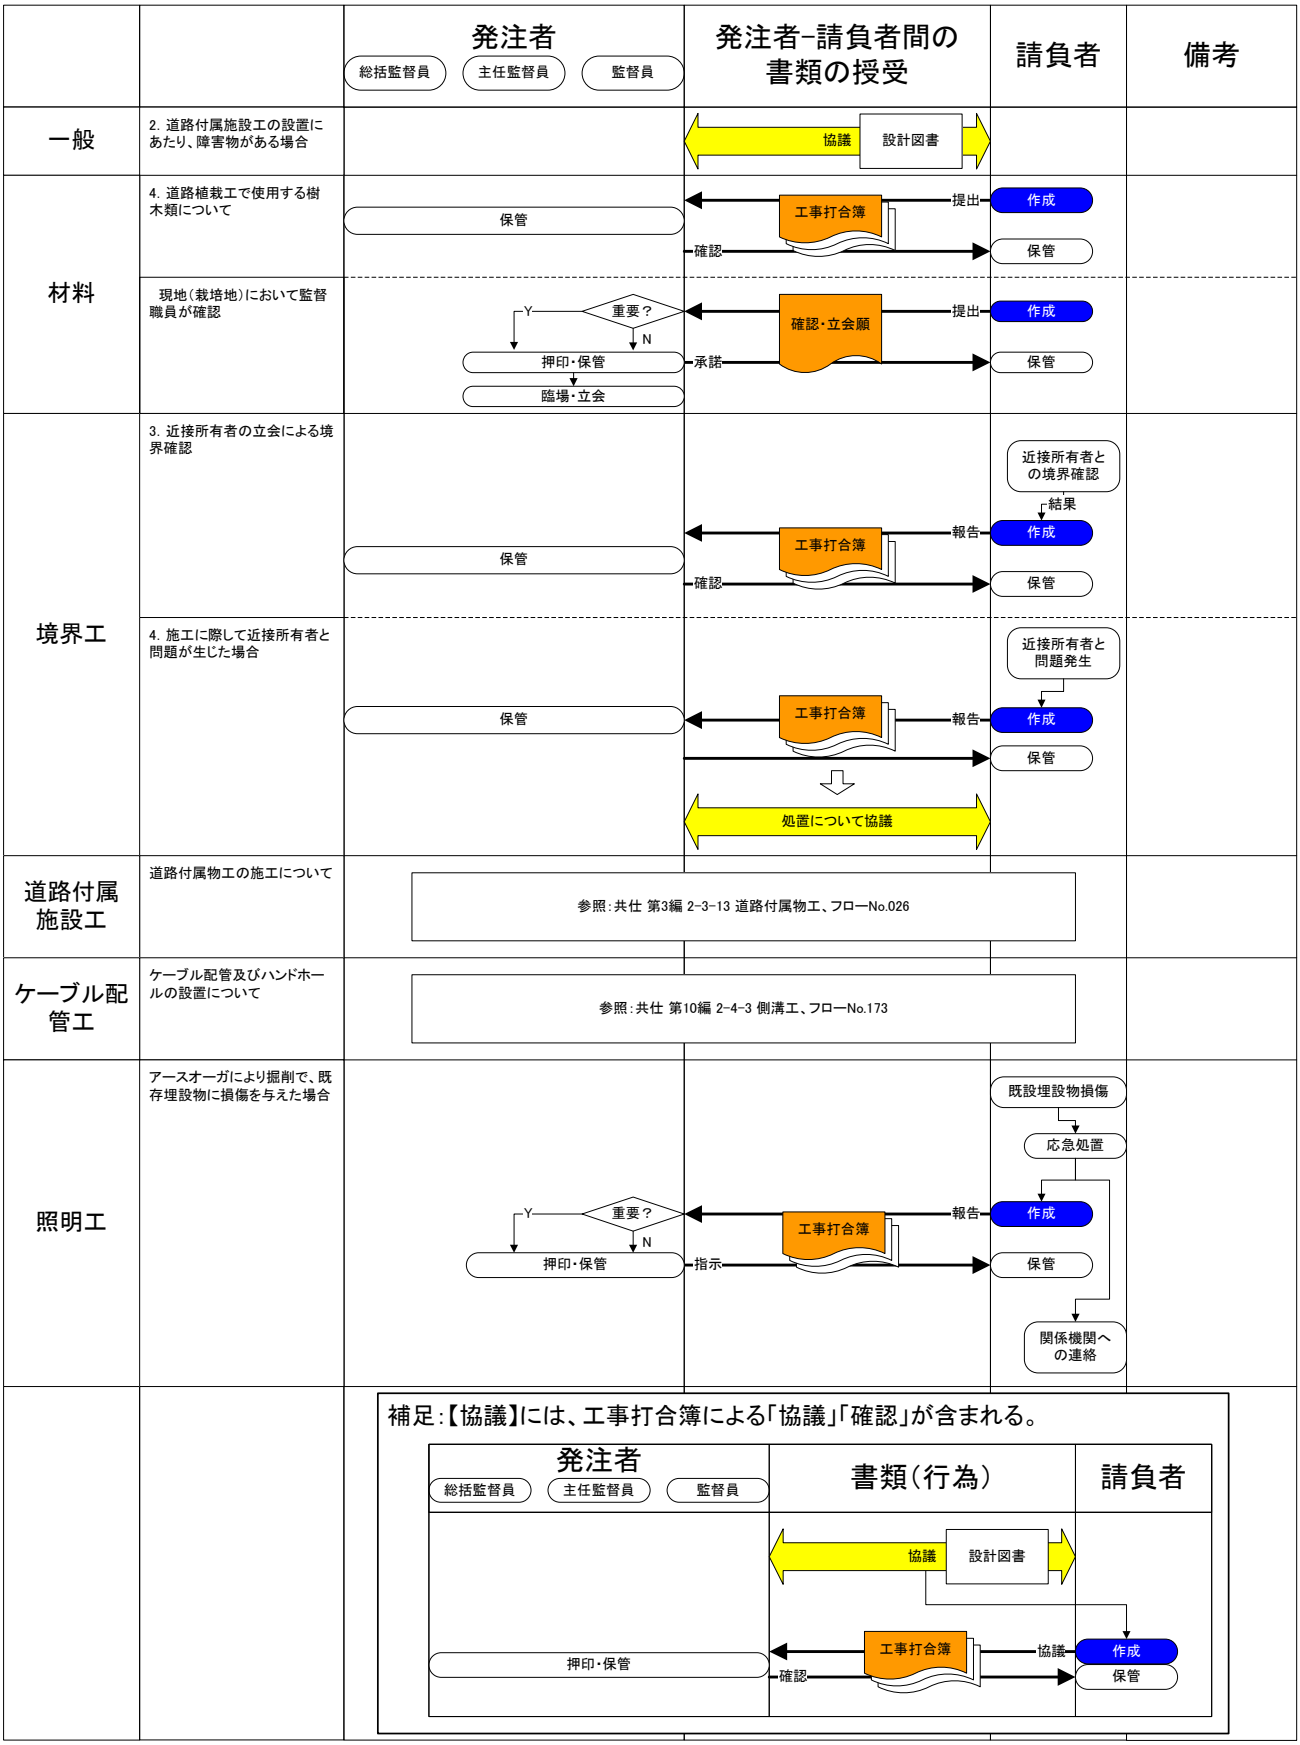

舗装 橋梁付属物工(No.181)

『伸縮装置工』

		発注者 総括監督員　主任監督員　監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
伸縮装置工	1. 伸縮装置の据付け位置の決定後	押印・保管	工事打合簿 報告 承諾	作成 保管	添付資料 ・ 施工計画書

橋梁下部 RC橋脚工(No.184) －1／2

『作業土工、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープンケーソン基礎工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
作業土工（床掘り・埋戻し）		参照：共仕 第3編 2-3-3 作業土工、フローNo.016			
既製杭工		参照：共仕 第3編 2-4-4 既製杭工、フローNo.031			
場所打杭工		参照：共仕 第3編 2-4-5 場所打杭工、フローNo.031			
深礎工		参照：共仕 第3編 2-4-6 深礎工、フローNo.031			
オープンケーソン基礎工		参照：共仕 第3編 2-4-7 オープンケーソン基礎工、フローNo.031			

橋梁下部 RC橋脚工(No.184) －2／2

『ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢板基礎工、橋脚躯体工、地下水位低下工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
ニューマチックケーソン基礎工		参照：共仕 第3編 2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工、フローNo.031			
鋼管矢板基礎工		参照：共仕 第3編 2-4-9 鋼管矢板基礎工、フローNo.031			
橋脚躯体工		参照：共仕 第10編 3-4-8 橋台躯体工、フローNo.183（省略）			
地下水位低下工		参照：共仕 第3編 2-10-8 地下水位低下工、フローNo.038（省略）			

鋼橋上部 工場製作工(No.190)－1／2

『材料、桁製作工、検査路製作工』

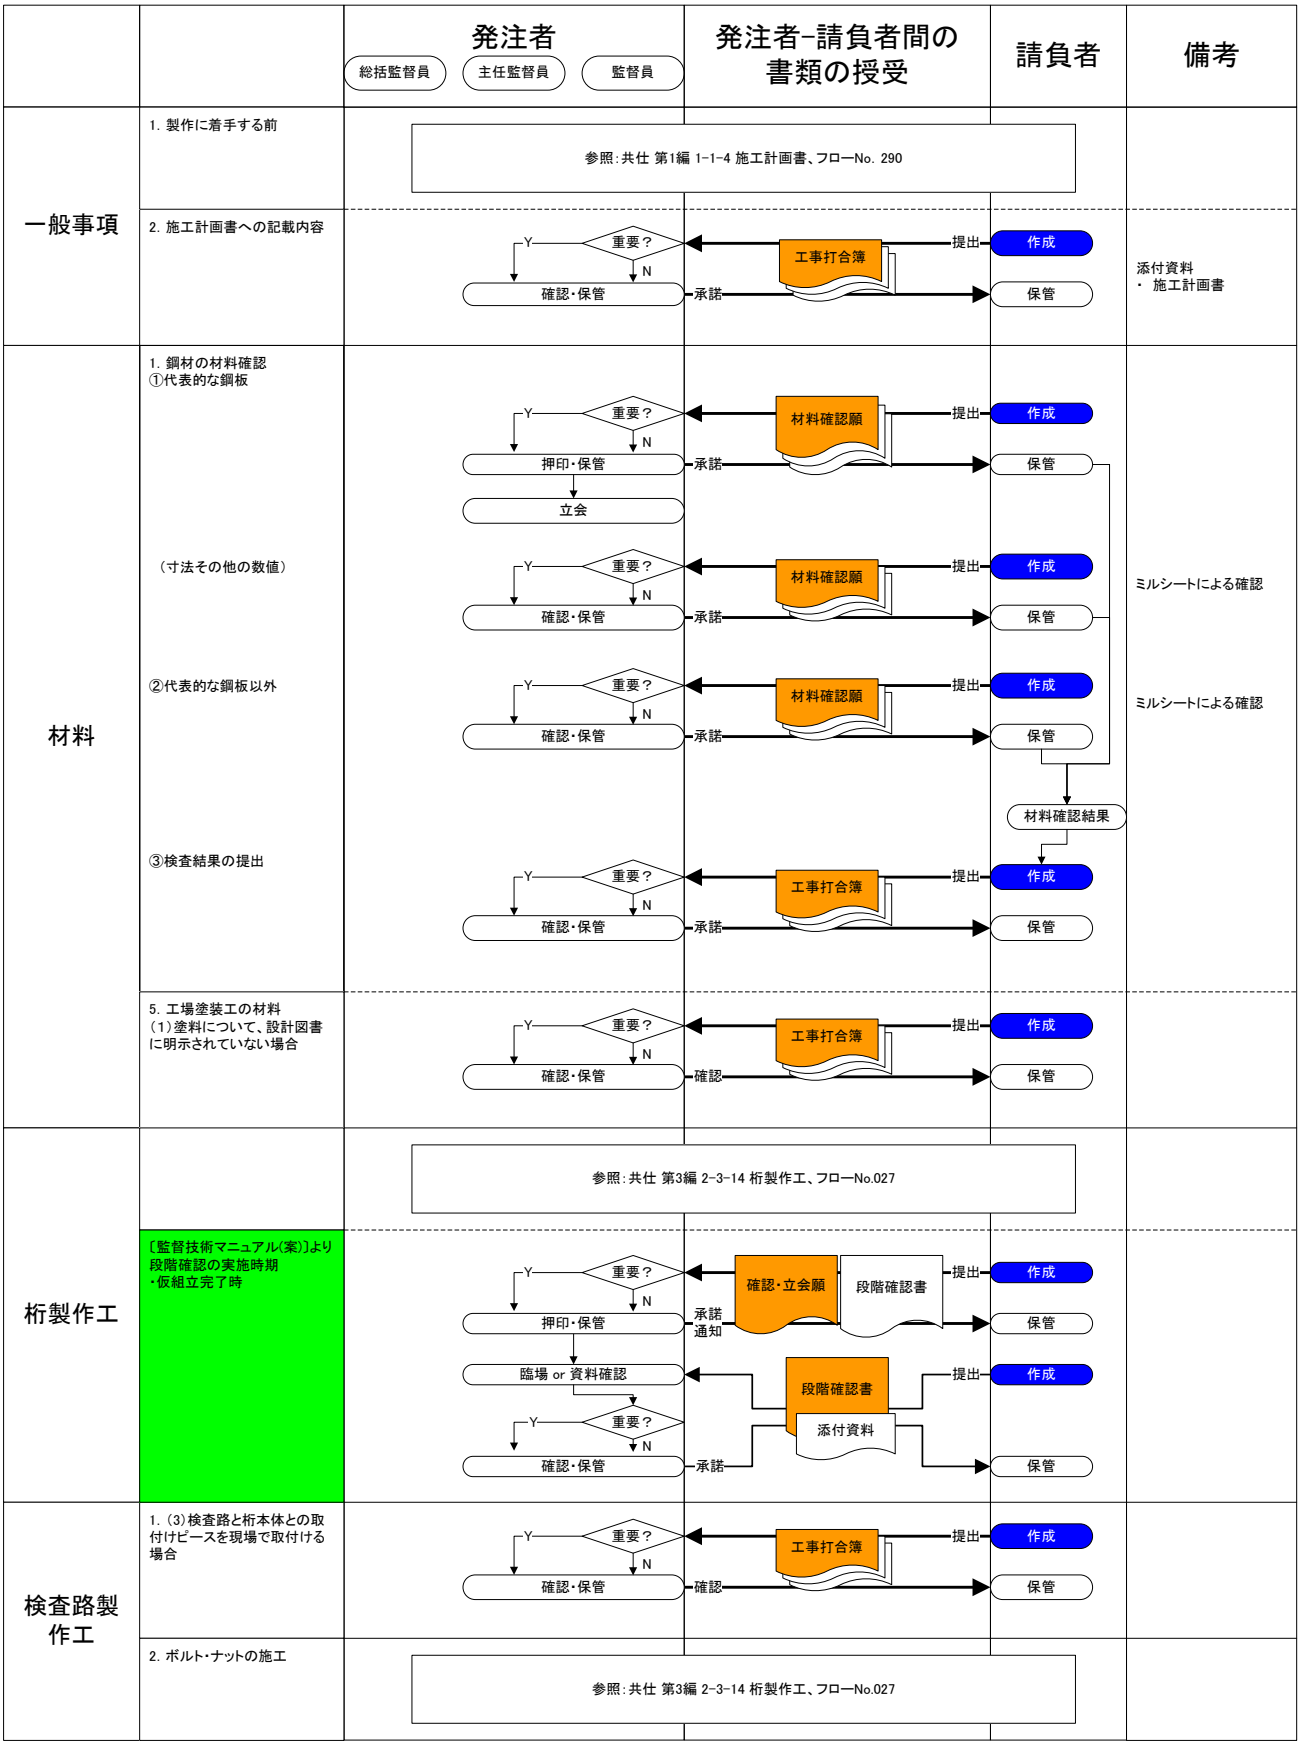

鋼橋上部 工場製作工(No.190)－2／2

『鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、橋梁用高欄製作工、横断歩道橋製作工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
鋼製伸縮継手製作工	2. ボルト・ナットの施工	参照：共仕 第3編 2-3-14 桁製作工、フローNo.027			
落橋防止装置製作工	2. ボルト・ナットの施工	参照：共仕 第3編 2-3-14 桁製作工、フローNo.027			
鋼製排水管製作工	2. ボルト・ナットの施工	参照：共仕 第3編 2-3-14 桁製作工、フローNo.027			
橋梁用高欄製作工	橋梁用高欄製作工の施工	参照：共仕 第10編 4-3-8 橋梁用防護柵製作工、フローNo.027			
横断歩道橋製作工	2. ボルト・ナットの施工	参照：共仕 第3編 2-3-14 桁製作工、フローNo.027			
	〔監督技術マニュアル(案)〕より 段階確認の実施時期 ・仮組立完了時				

鋼橋上部 鋼橋架設工(No.191)

『地組工、現場継手工』

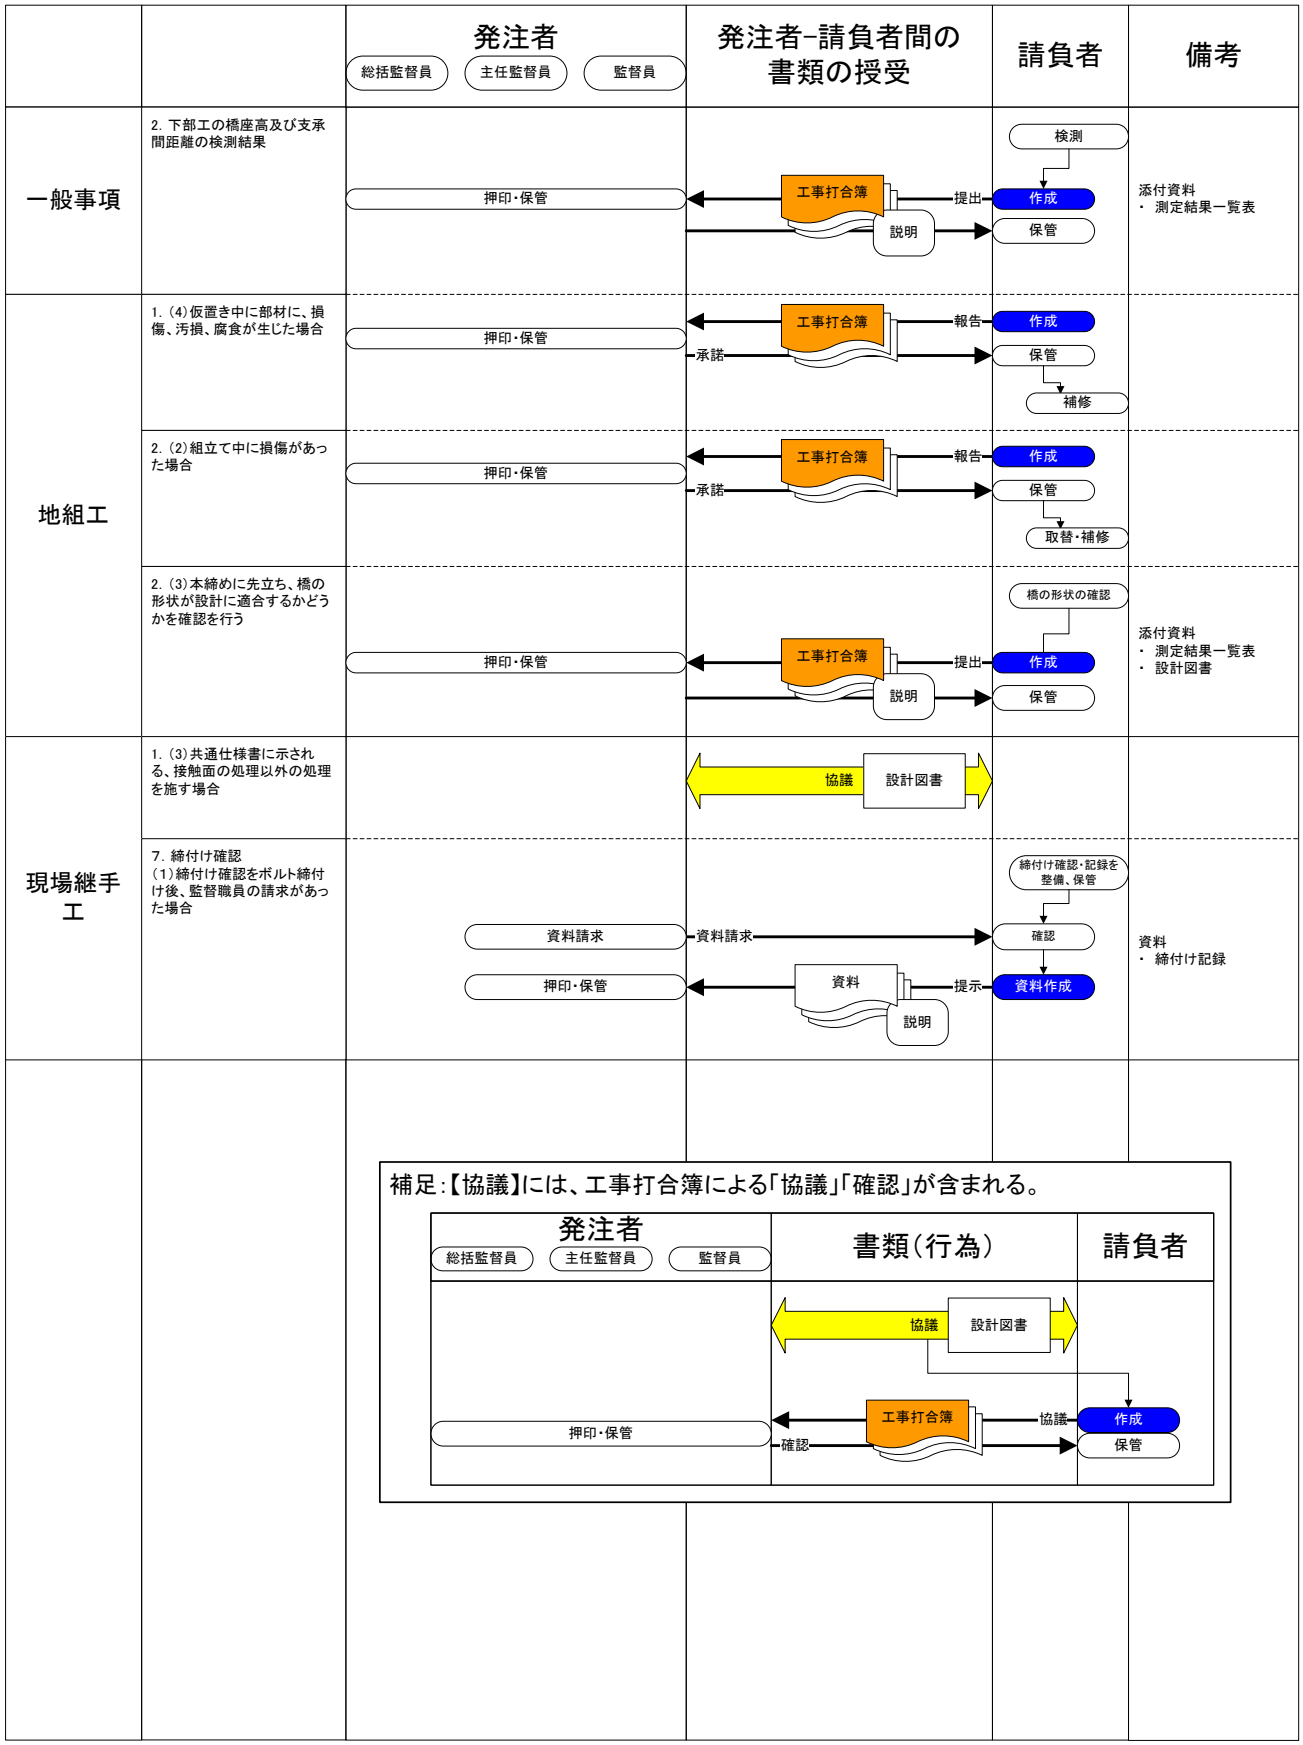

鋼橋上部 床版工(No.193)

『床版工』

		発注者 総括監督員 主任監督員 監督員	発注者-請負者間の書類の授受	請負者	備考
床版工	1.(2)施工に先立ち、あらかじめ桁上面の高さ、幅、配置等を測量し、桁の出来形を確認を行い、出来形に誤差のある場合		協議 設計図書		添付資料 ・測定結果一覧表 ・出来形管理写真 ・出来形管理図表
	1.(4)コンクリート製もしくはモルタル製、本体コンクリートと同等の品質を有するもの以外のスペーサーを使用する場合	重要？ Y N 確認・保管	工事打合簿 承諾	提出 作成 保管	添付資料 ・設計図書
	1.(12)床版コンクリート打設前及び完了後、キャンバーを測定し、その記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合	資料請求 押印・保管	資料請求 工事打合簿 提示	測定結果の整備、保管 確認 資料作成	添付資料 ・キャンバー測定結果
	〔監督技術マニュアル(案)〕より段階確認の実施時期 ・鉄筋組立て完了時	重要？ Y N 押印・保管 臨場 or 資料確認 重要？ Y N 確認・保管	確認・立会願 段階確認書 承諾通知 段階確認書 添付資料 承諾	提出 作成 保管 提出 作成 保管	添付資料 ・使用材料が確認できる資料 ・設計図書

補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。

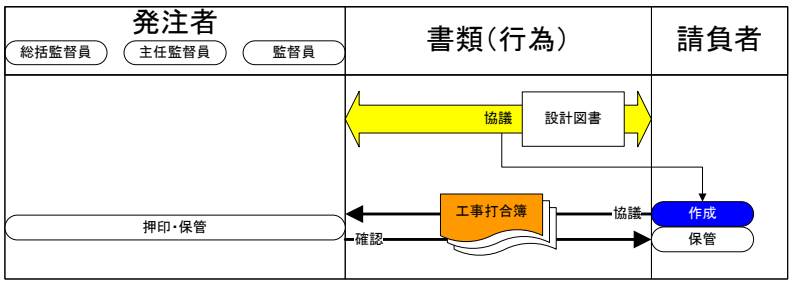

トンネル（NATM）トンネル掘削工(No.208)

『掘削工』

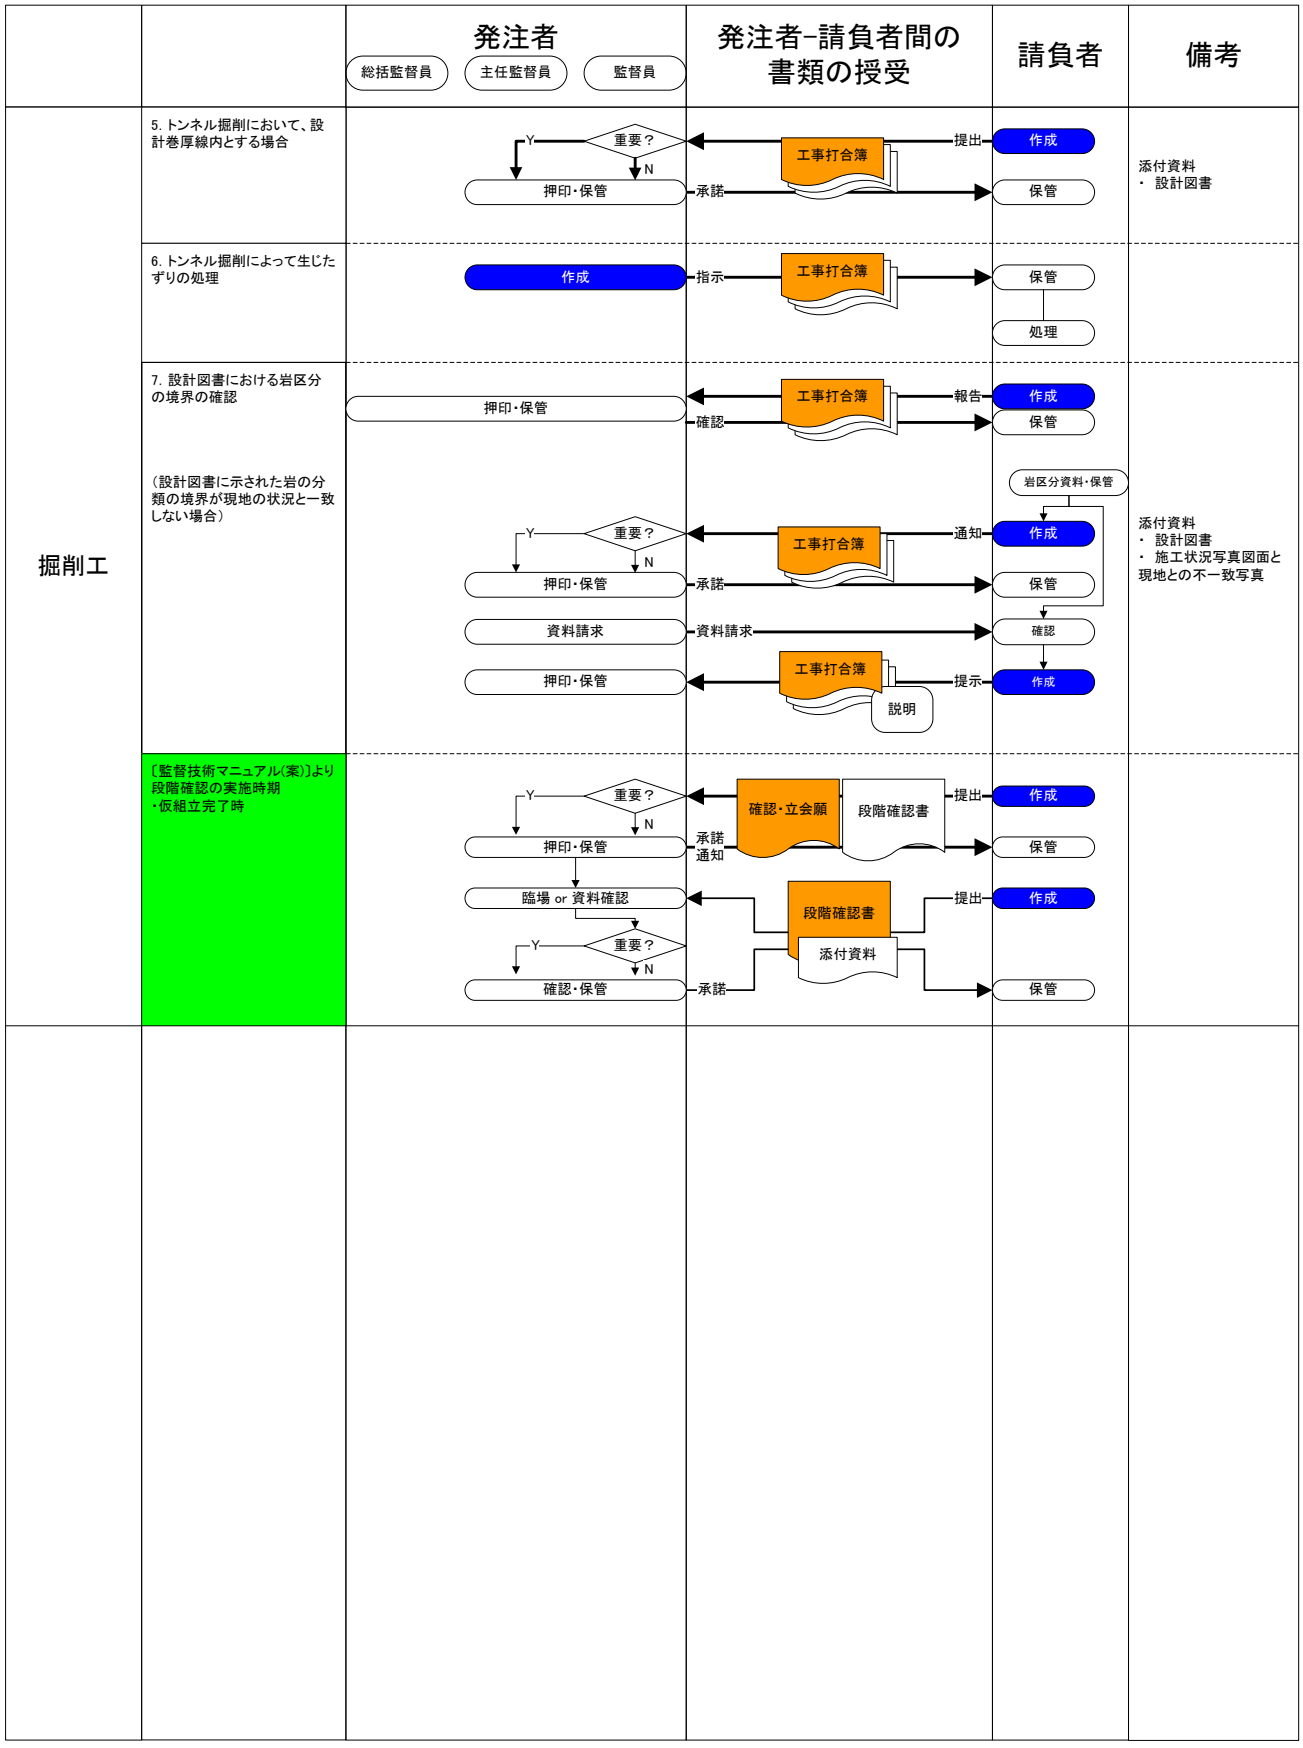

共同溝 現場打構築工(No.236)

『現場打躯体工、カラー継手工』

<table>
<tr><th></th><th></th><th>発注者
総括監督員　主任監督員　監督員</th><th>発注者−請負者間の
書類の授受</th><th>請負者</th><th>備考</th></tr>
<tr><td rowspan="2">現場打躯体工</td><td>施工計画書に明記された打継ぎ位置を変更する場合</td><td rowspan="2"> 
</td><td rowspan="2"> 
</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>〔監督技術マニュアル(案)〕より
段階確認の実施時期
・土(岩)質の変化した時
・床堀掘削完了時
・鉄筋組立て完了時
・埋戻し時</td></tr>
<tr><td>カラー継手工</td><td>カラー継手工を設計図書に基づいて施工できない場合</td><td></td><td> 
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="4">補足:【協議】には、工事打合簿による「協議」「確認」が含まれる。
 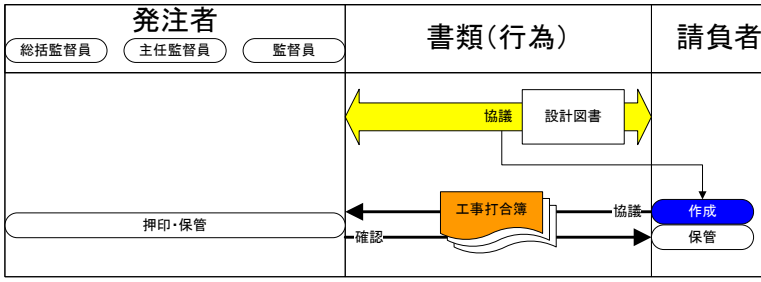
</td></tr>
</table>

雪寒(No.266)－1／3

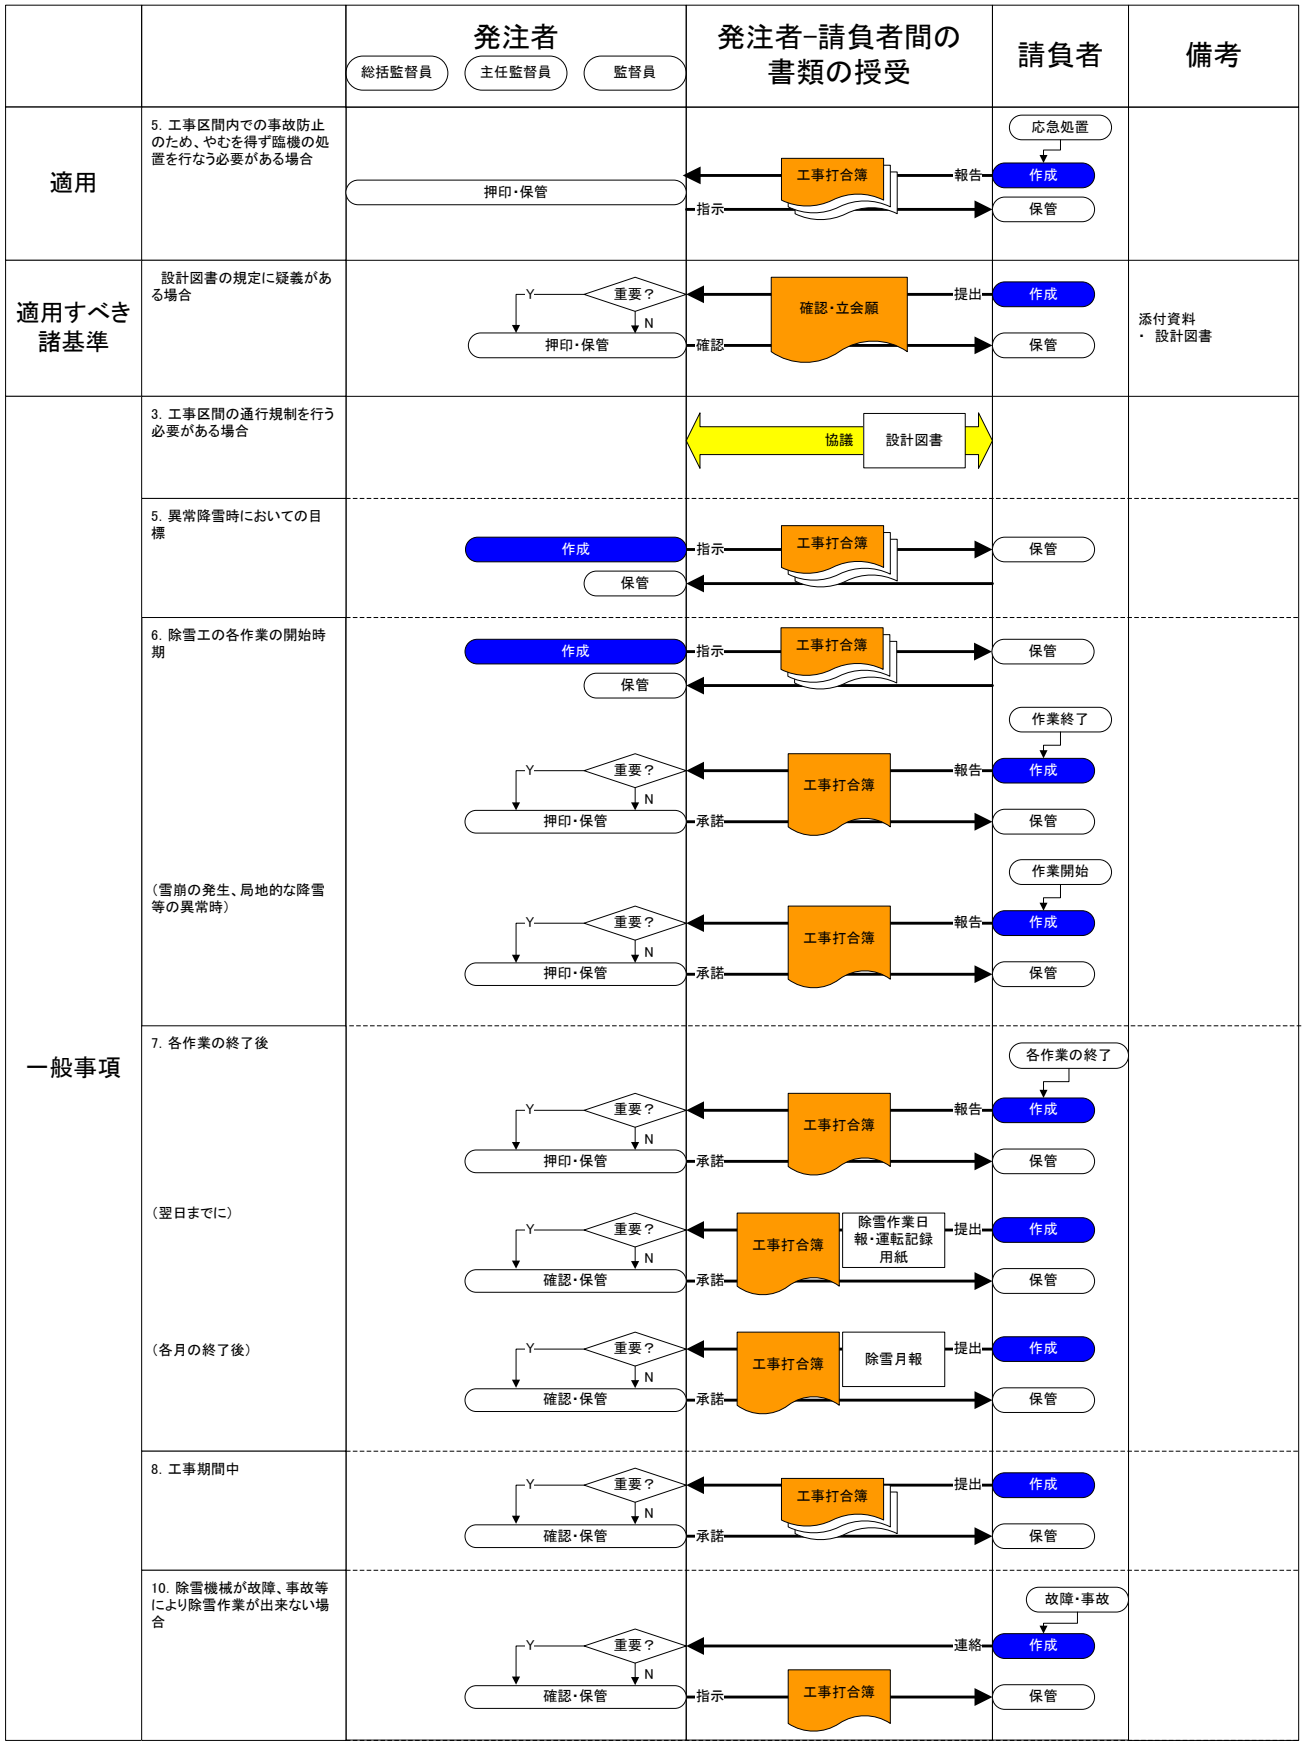
発注者
総括監督員
主任監督員
監督員
発注者−請負者間の書類の授受
請負者
備考
適用
5. 工事区間内での事故防止のため、やむを得ず臨機の処置を行なう必要がある場合
応急処置
作成
保管
報告
指示
工事打合簿
押印・保管
適用すべき諸基準
設計図書の規定に疑義がある場合
重要？
Y
N
確認・立会願
提出
確認
添付資料
・ 設計図書
一般事項
3. 工事区間の通行規制を行う必要がある場合
協議
設計図書
5. 異常降雪時においての目標
6. 除雪工の各作業の開始時期
作業終了
作業開始
（雪崩の発生、局地的な降雪等の異常時）
承諾
7. 各作業の終了後
各作業の終了
（翌日までに）
除雪作業日報・運転記録用紙
（各月の終了後）
除雪月報
8. 工事期間中
10. 除雪機械が故障、事故等により除雪作業が出来ない場合
故障・事故
連絡
確認・保管

雪寒(No.266)－2／3

『運搬除雪工、凍結防止工、歩道除雪工、安全処理工、雪道巡回工』

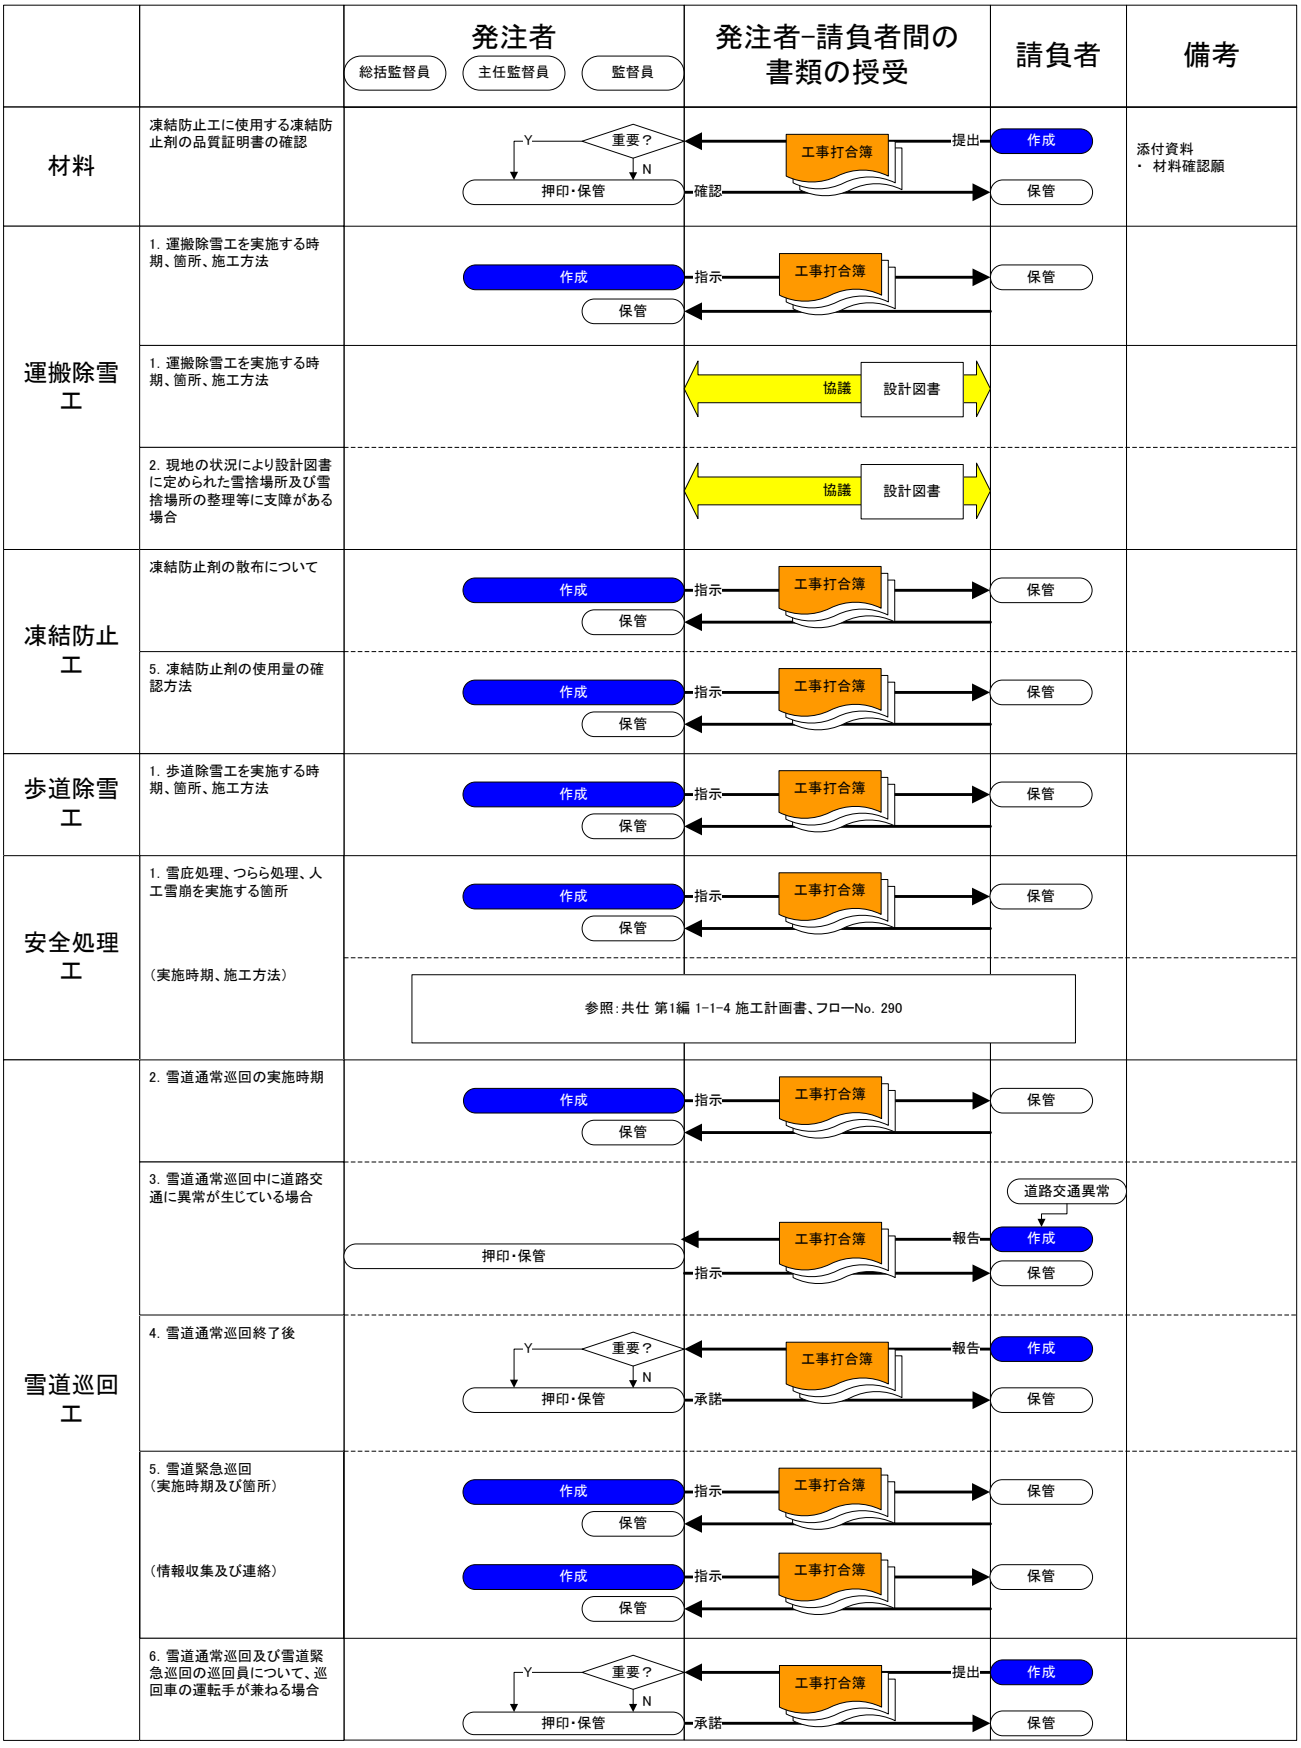

雪寒(No.266)－3／3

『維持補償費、保険費、除雪機械修理工』

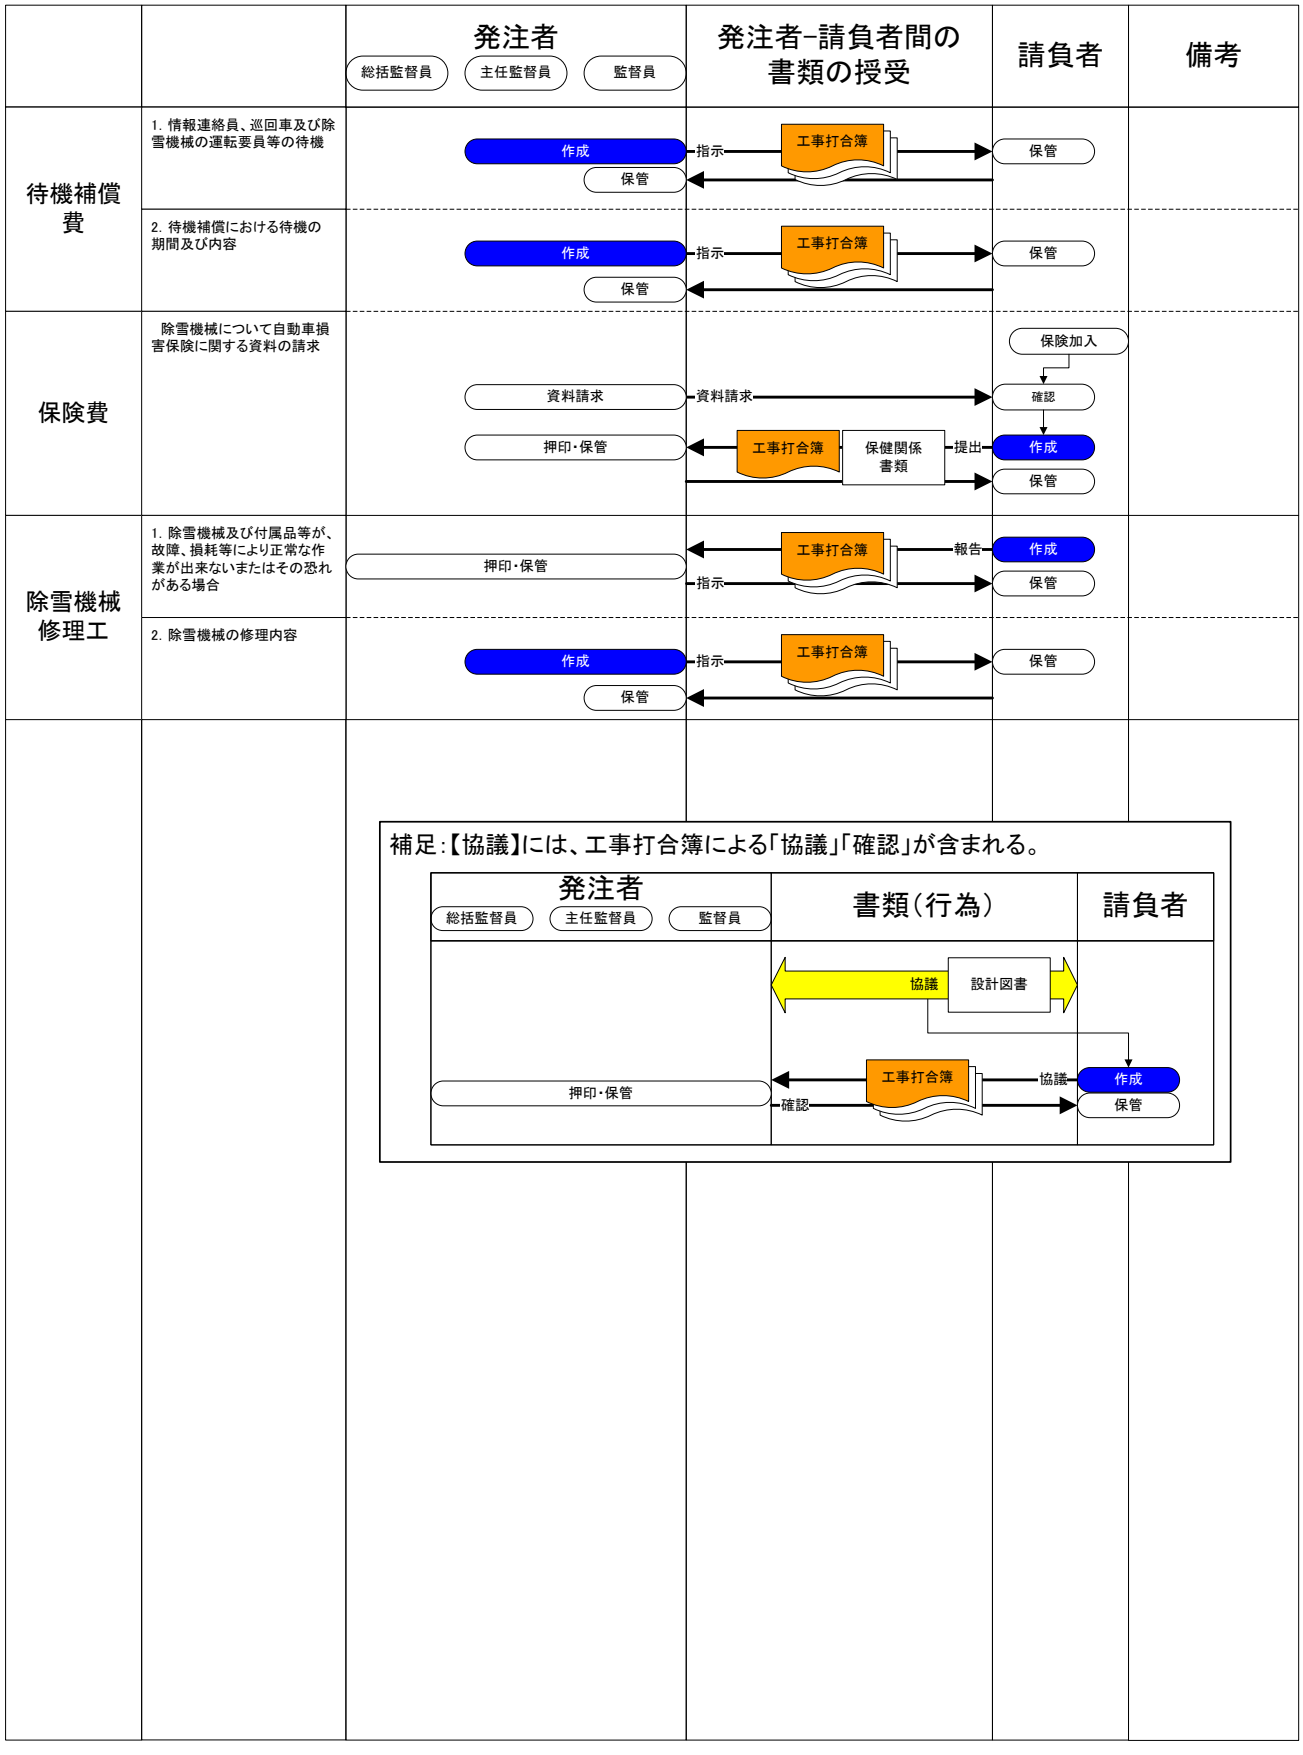

巻末資料 2-1　工事全体の業務プロセス

凡　例

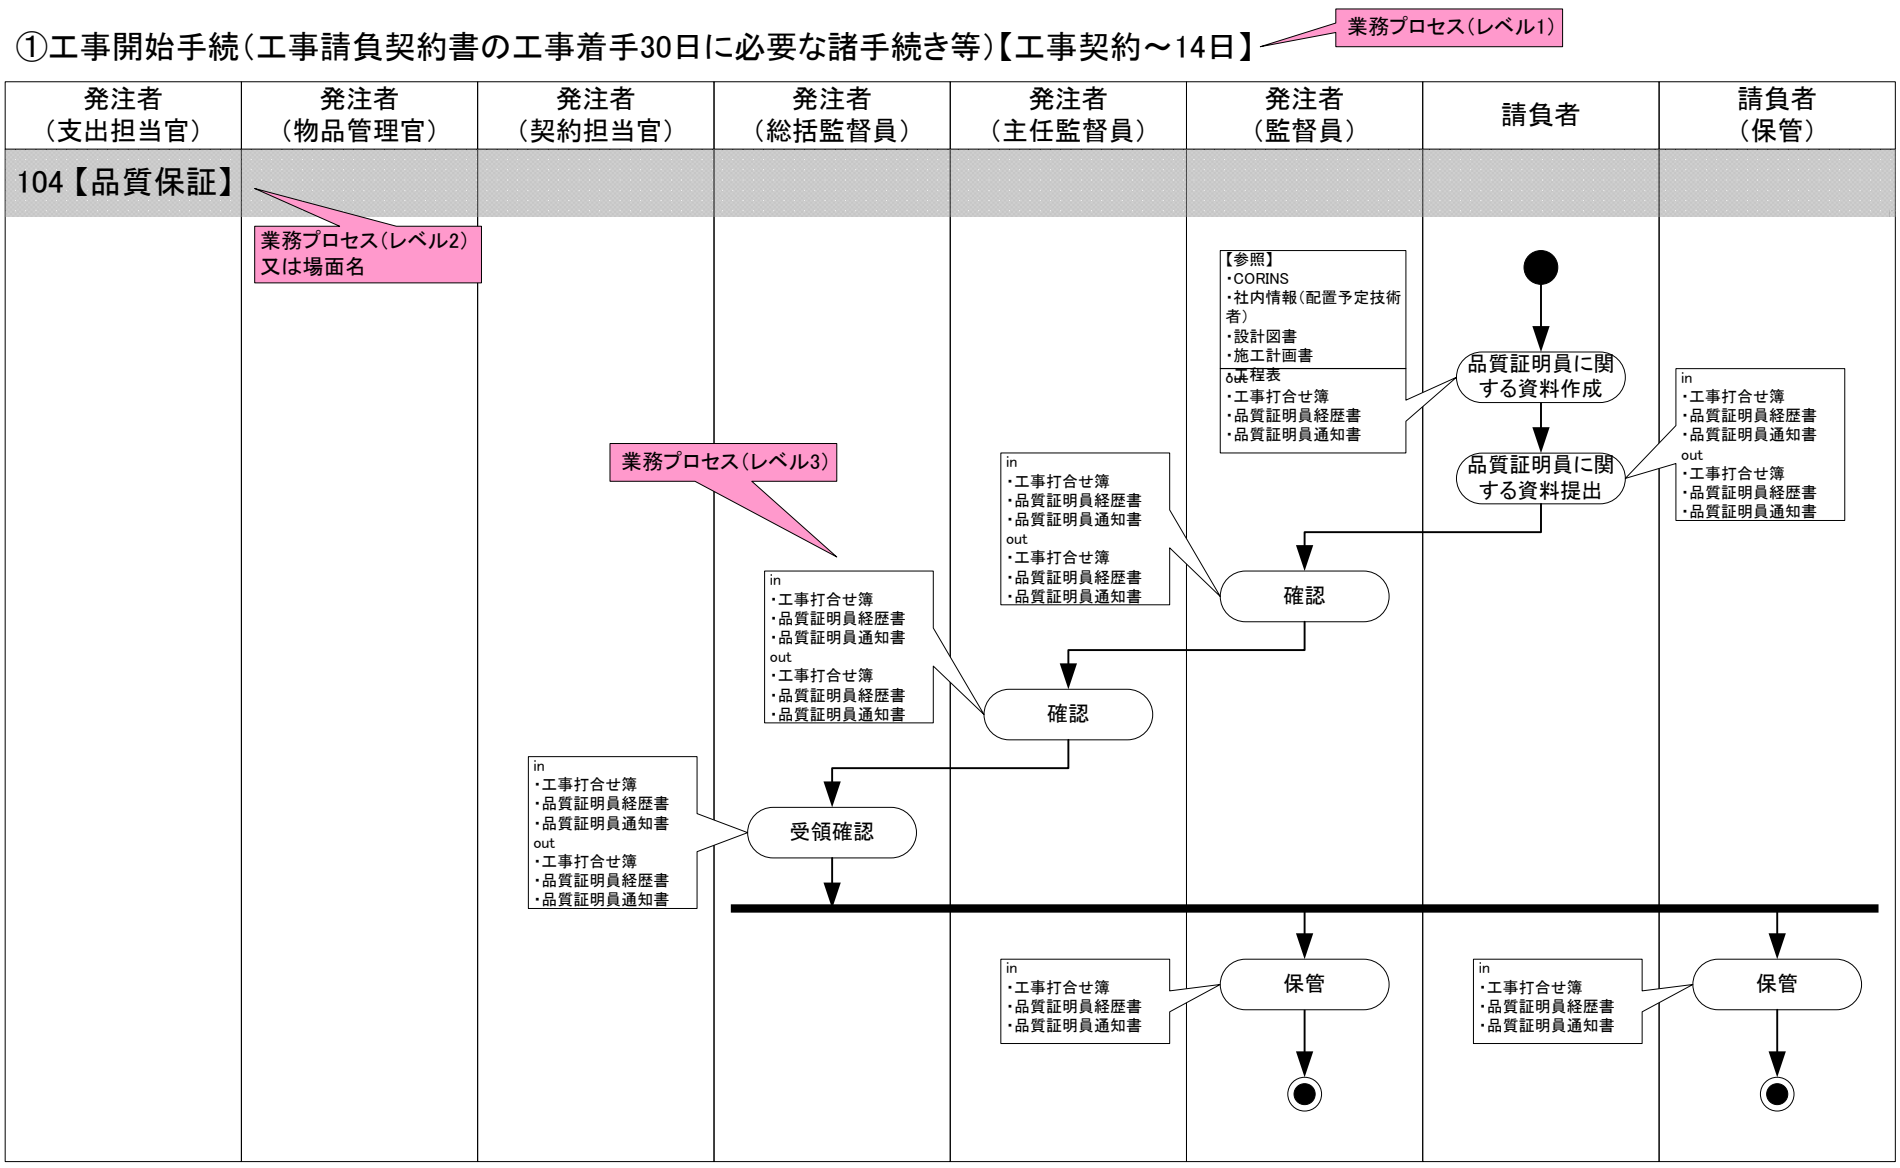

要素構成	図形	説明
開始	●	作業の開始を表す。
終了	◉	作業の終了を表す。
アクティビティ	アクション名	作業を表す。
判断	◇→	条件分岐を表す。
スイムレーン	レーン名 / レーン領域	作業の責任範囲を表す。スイムレーンをレーン名で区別する。
フロー	→	作業の流れを表す。
並行・遷移	┴	並行、同期作業を表す。
入出力情報	in ・工事打合せ簿 out ・工事打合せ簿	入出力される資料を表す。 in：入力資料 out：出力資料
参照情報	【参照】 ・施工計画書 ・原価管理要領 ・○○○	上流情報として参照する資料を表す。

①工事開始手続（工事請負契約書の工事着手30日に必要な諸手続き等）【工事契約～14日】

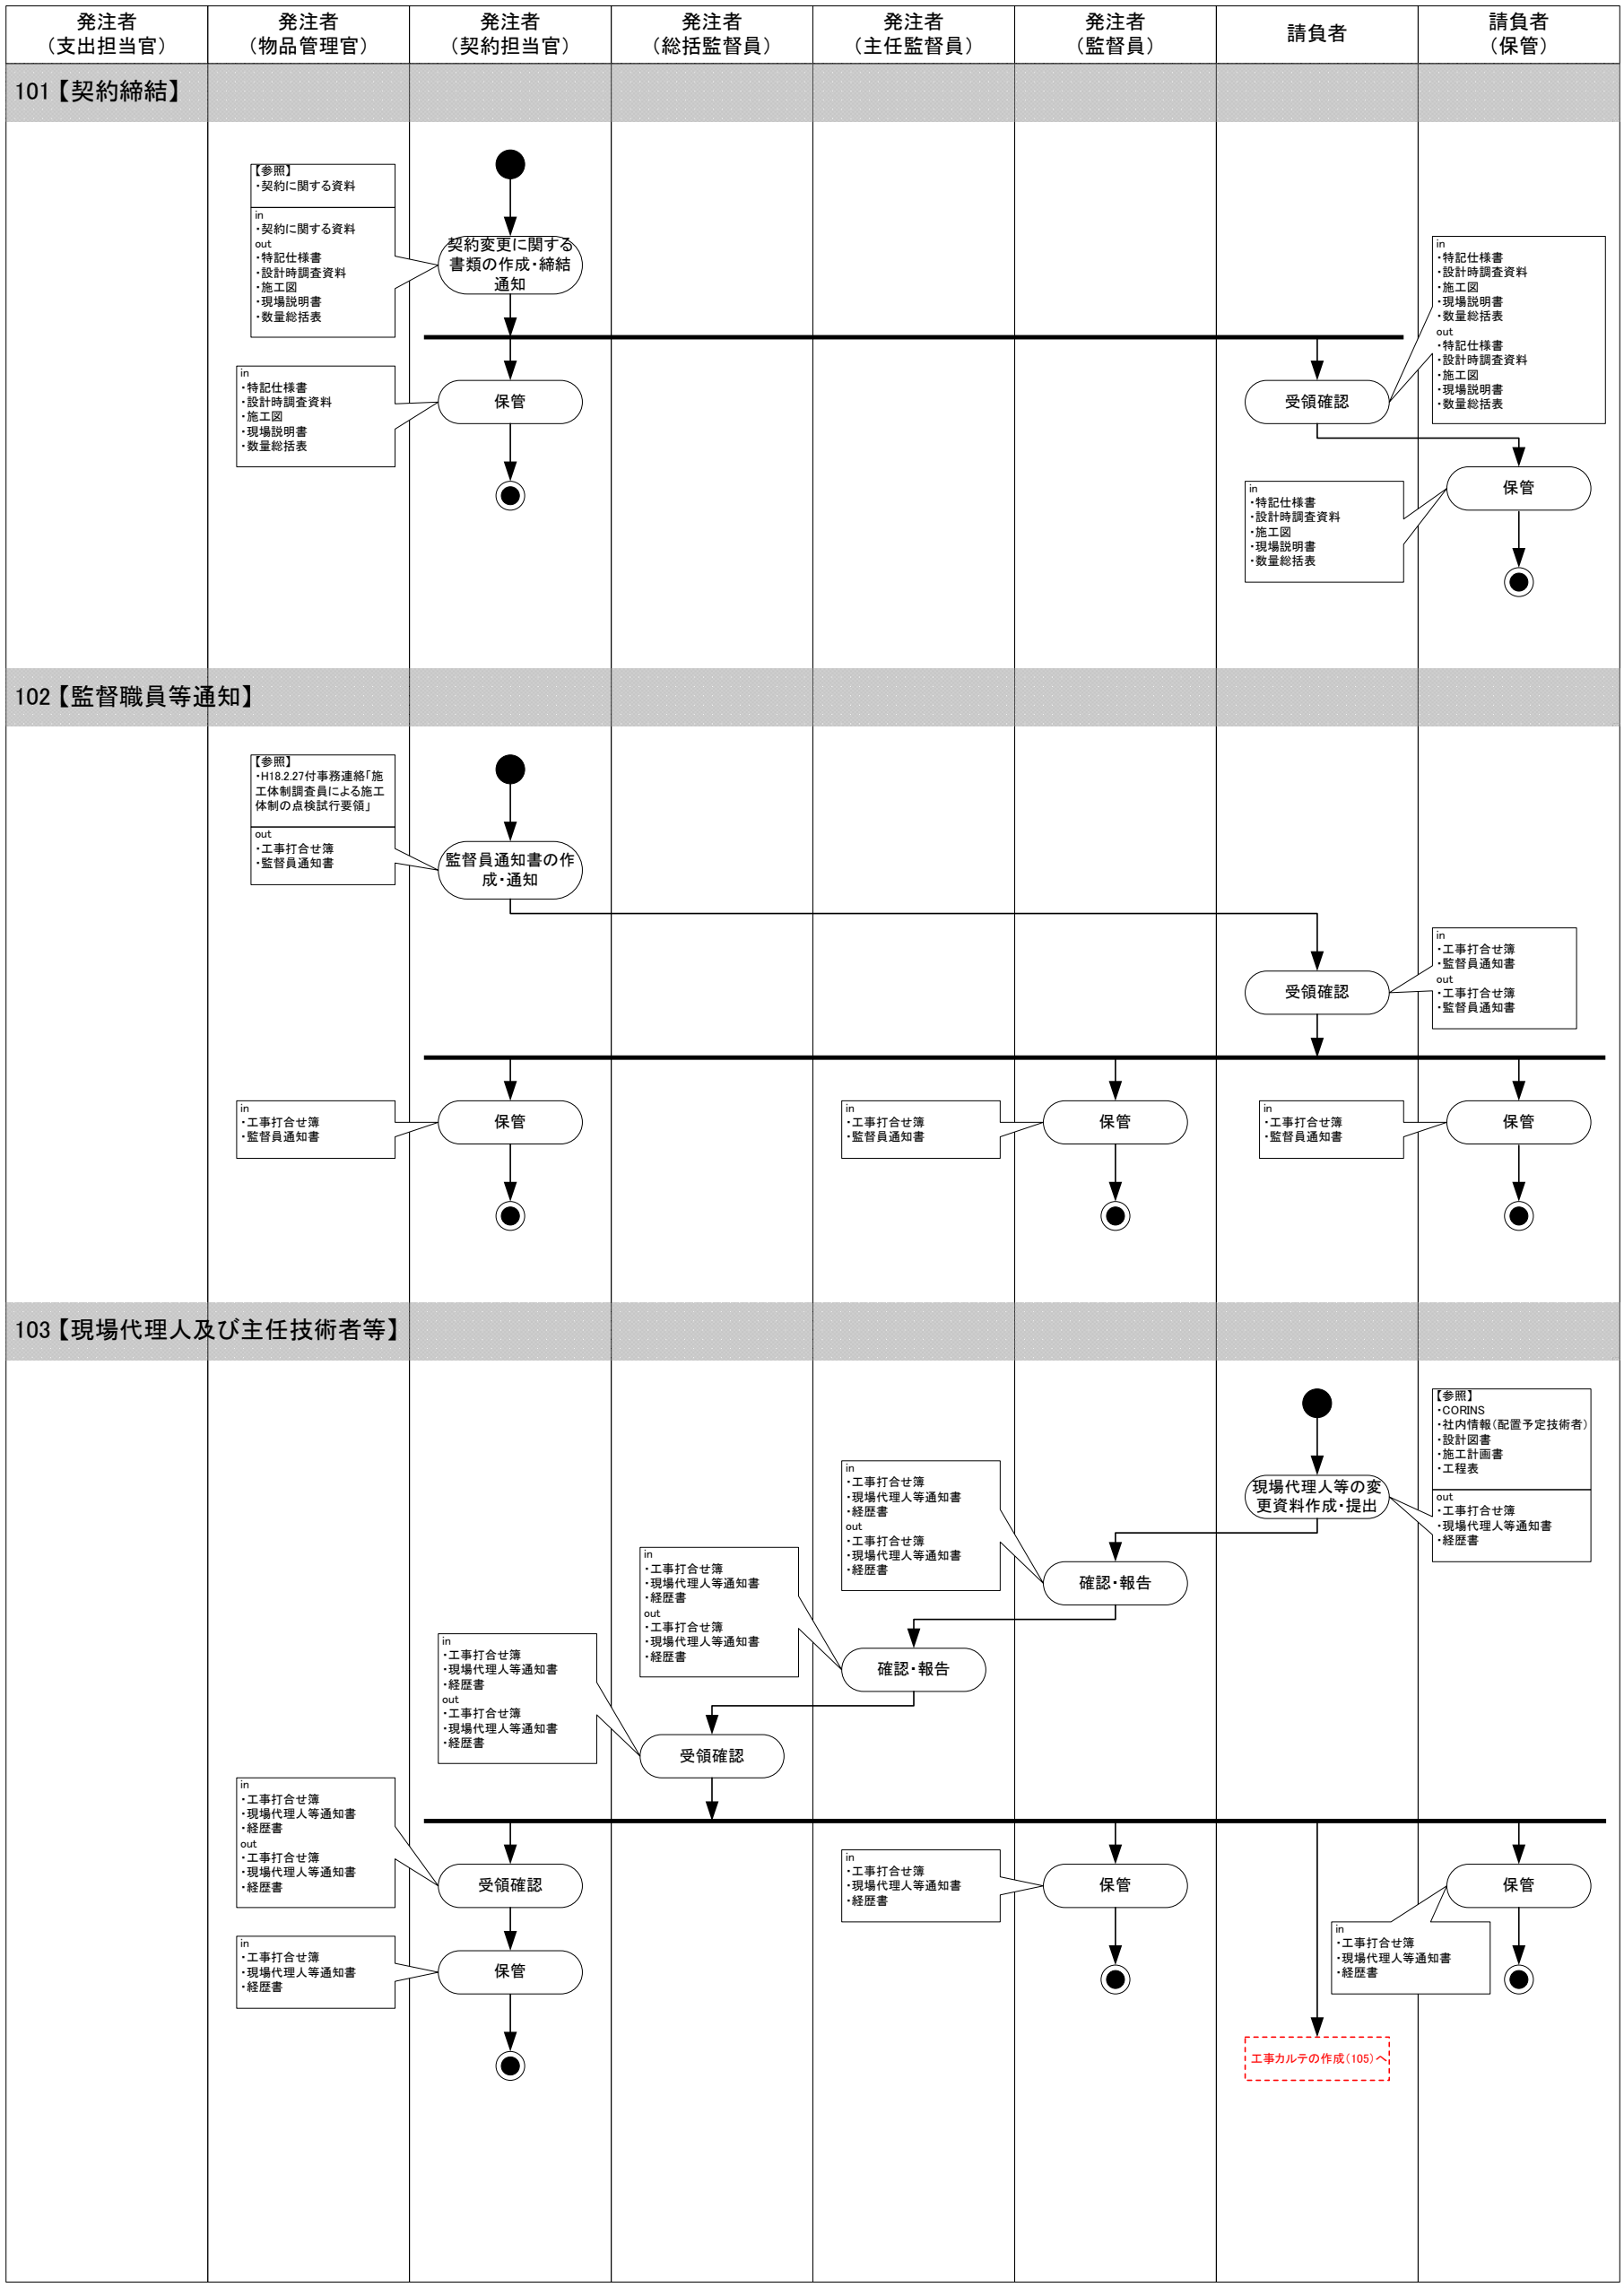

巻末資料2-1-2

①工事開始手続（工事請負契約書の工事着手30日に必要な諸手続き等）【工事契約～14日】

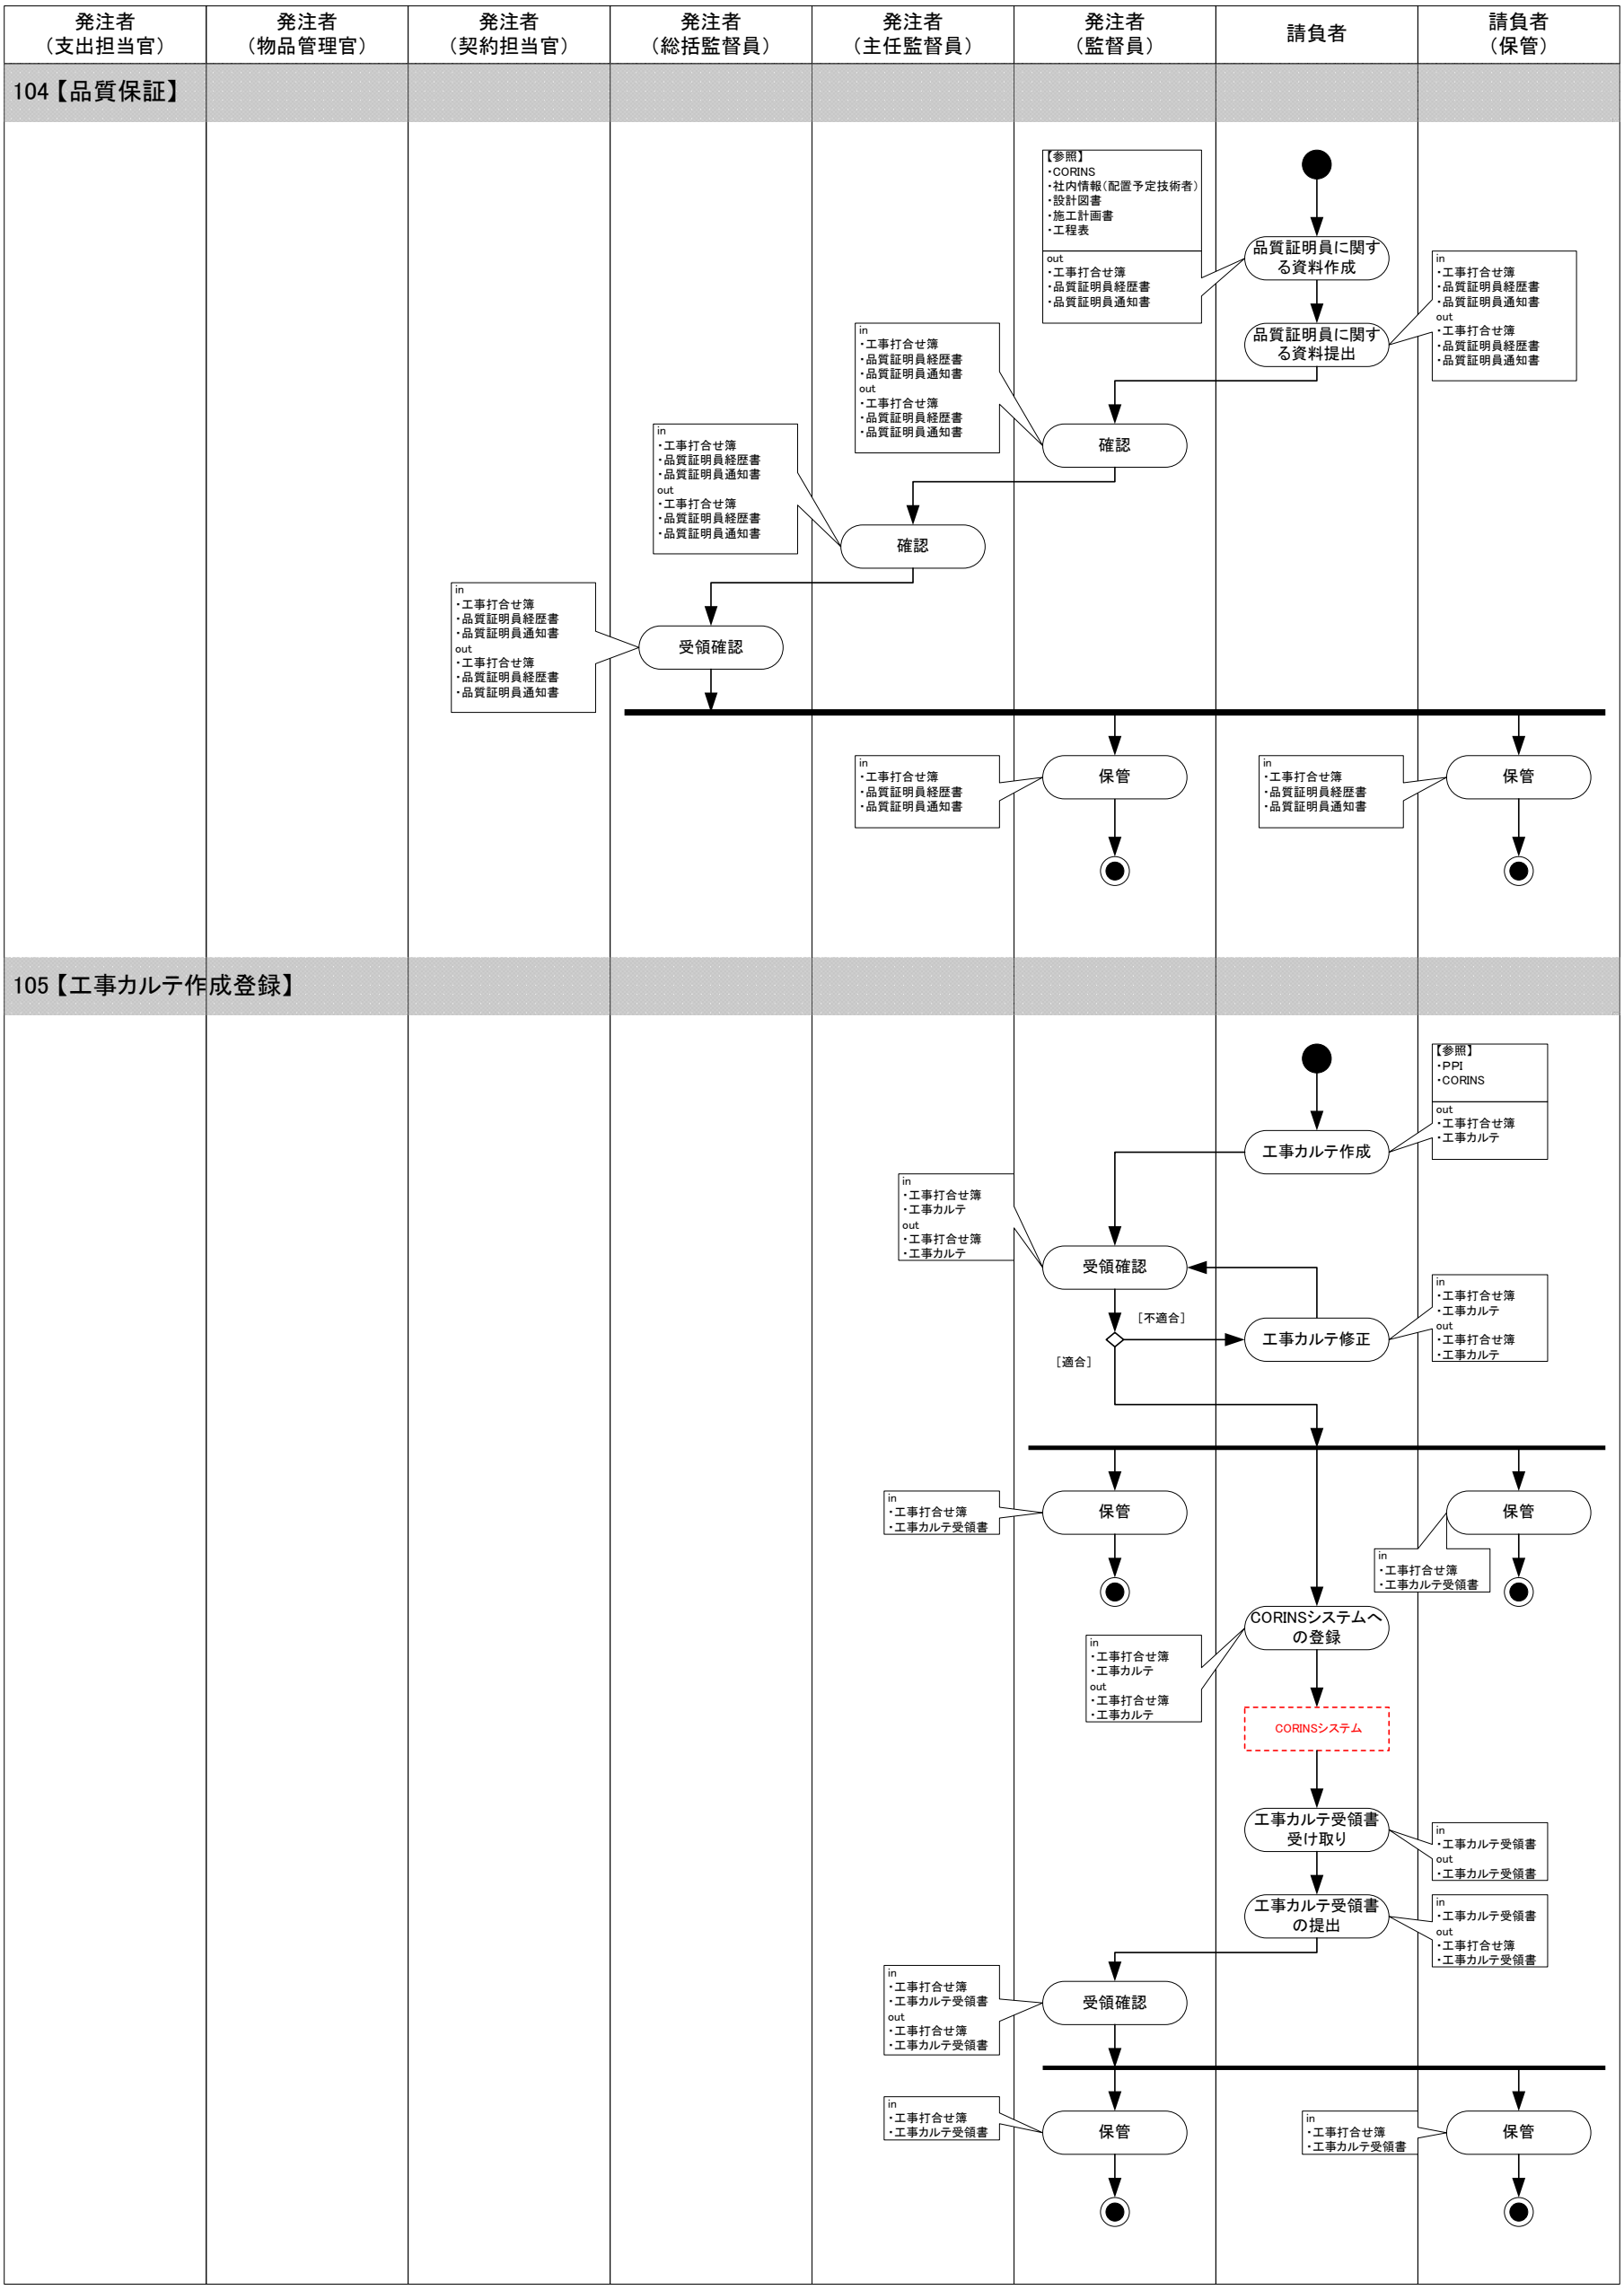

巻末資料2-1-3

①工事開始手続（工事請負契約書の工事着手30日に必要な諸手続き等）【工事契約～14日】

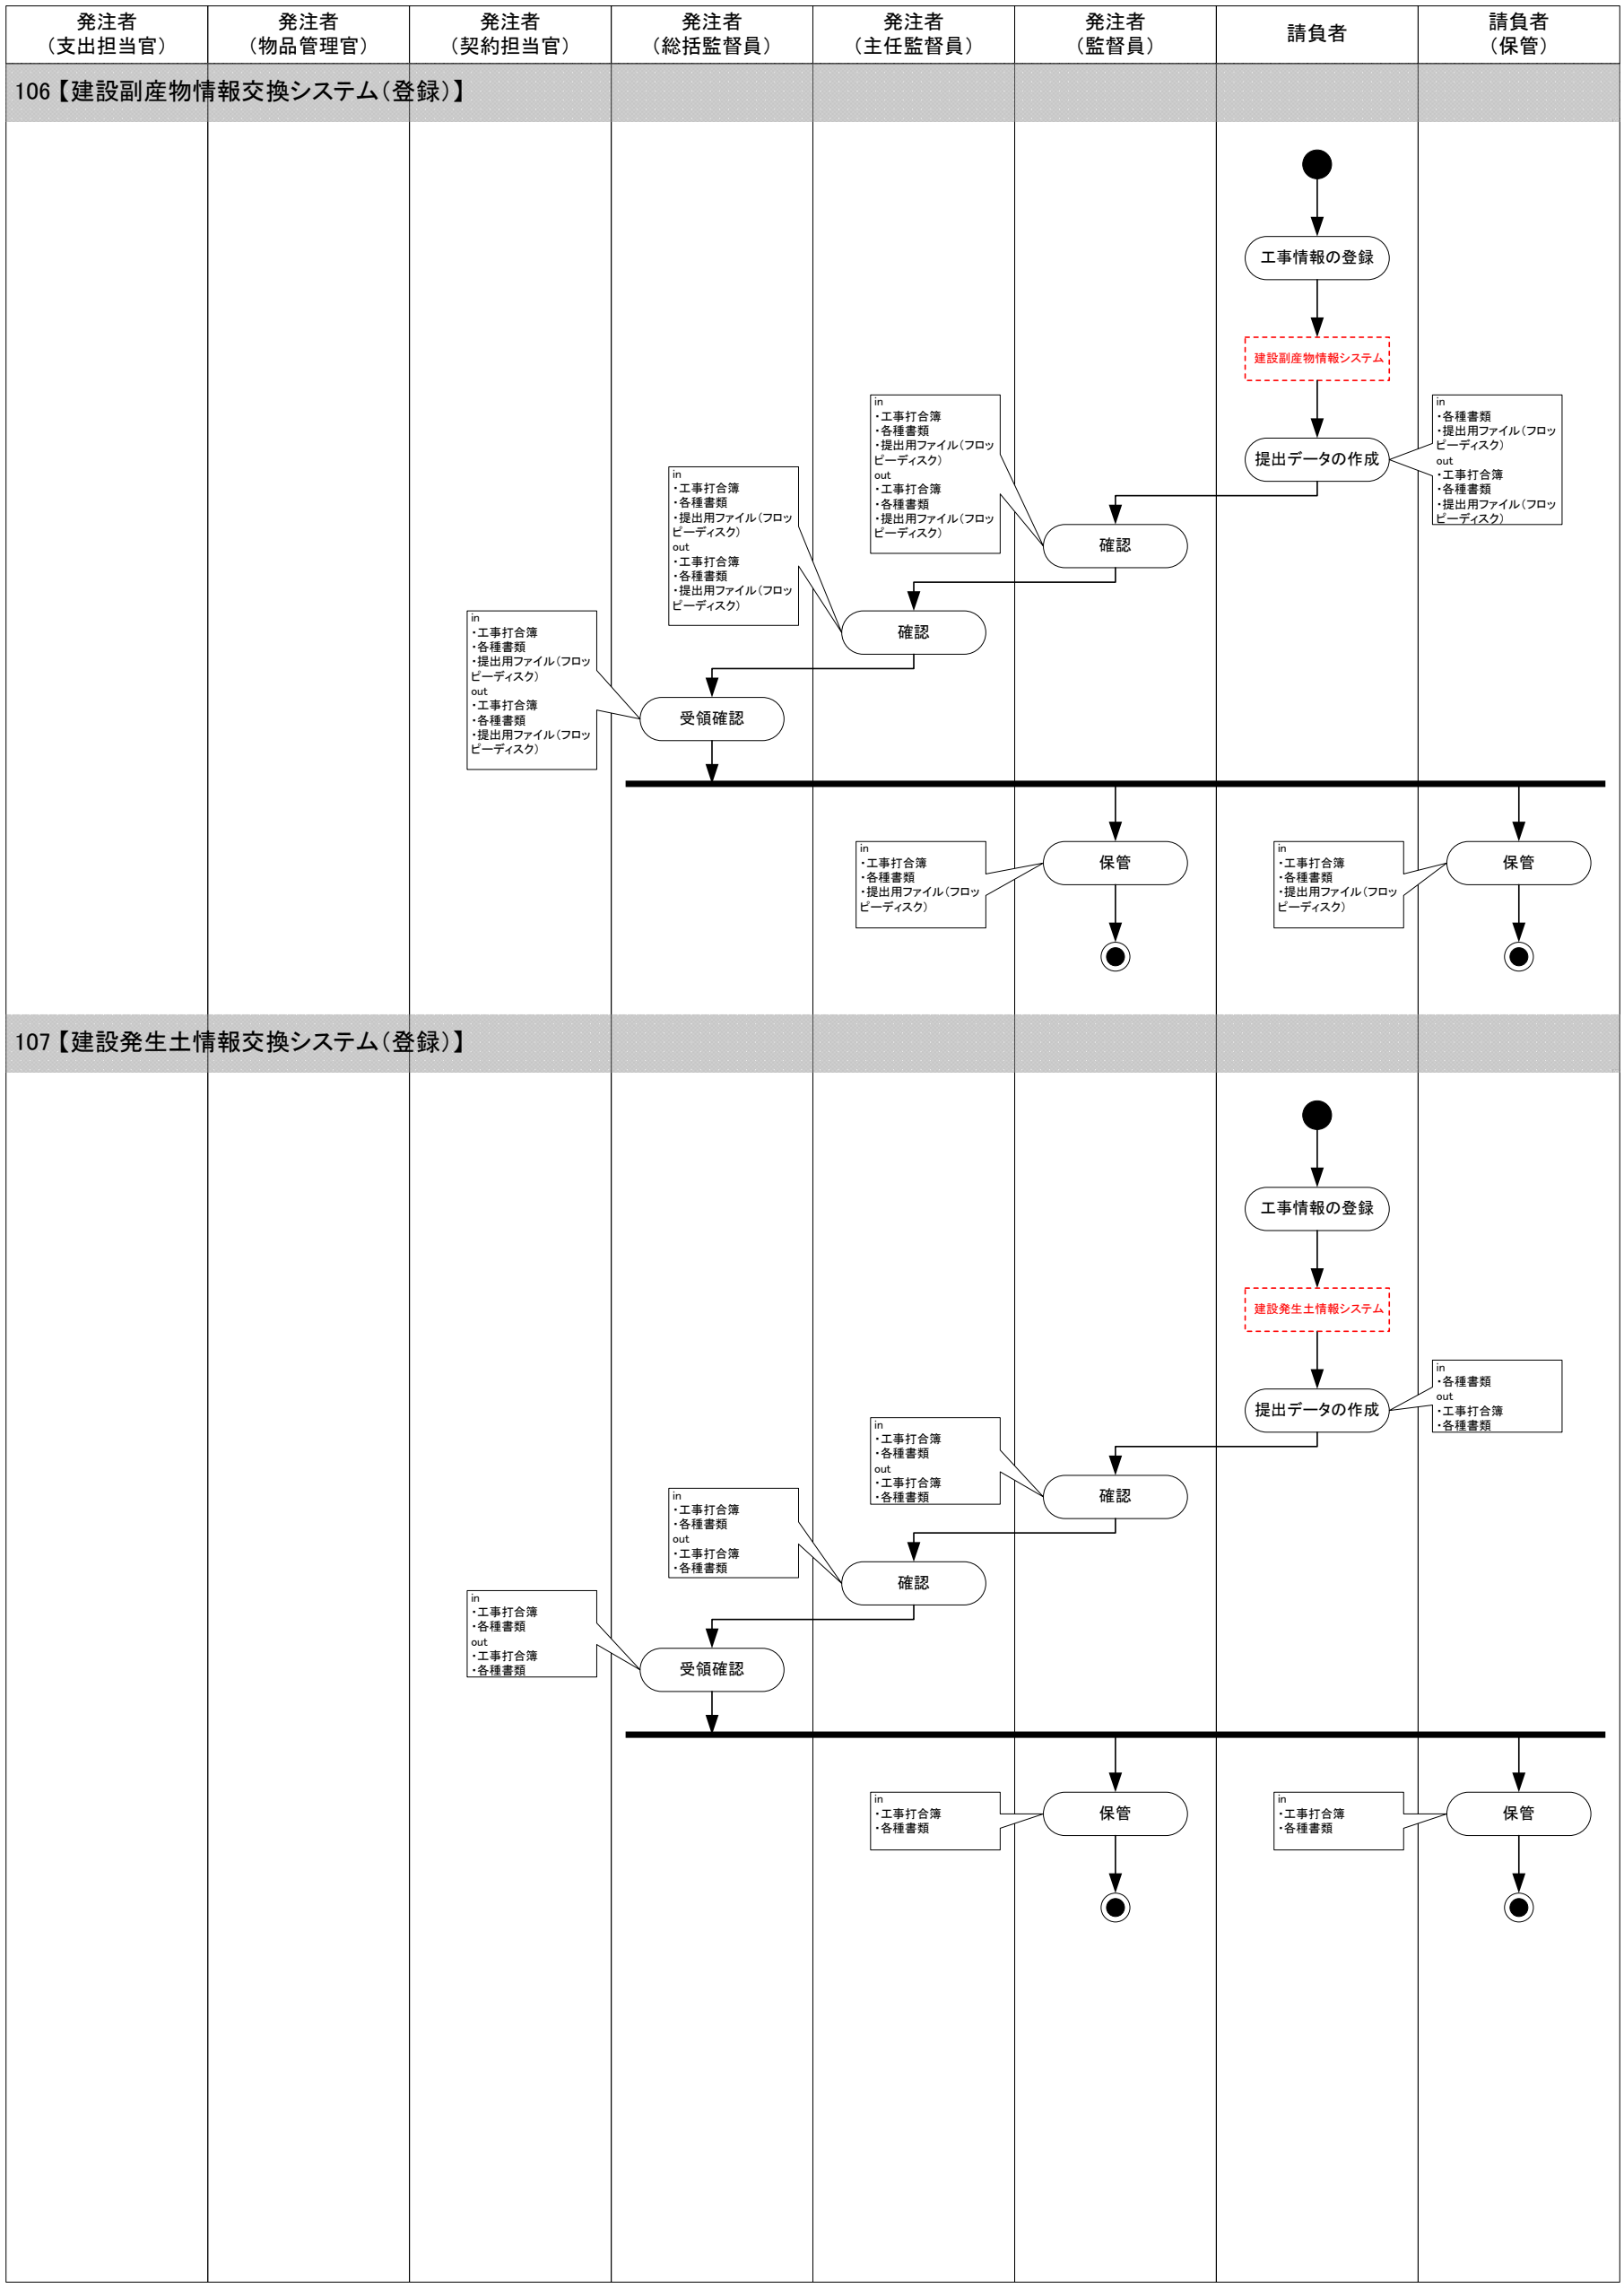

巻末資料2-1-4

①工事開始手続（工事請負契約書の工事着手30日に必要な諸手続き等）【工事契約～14日】

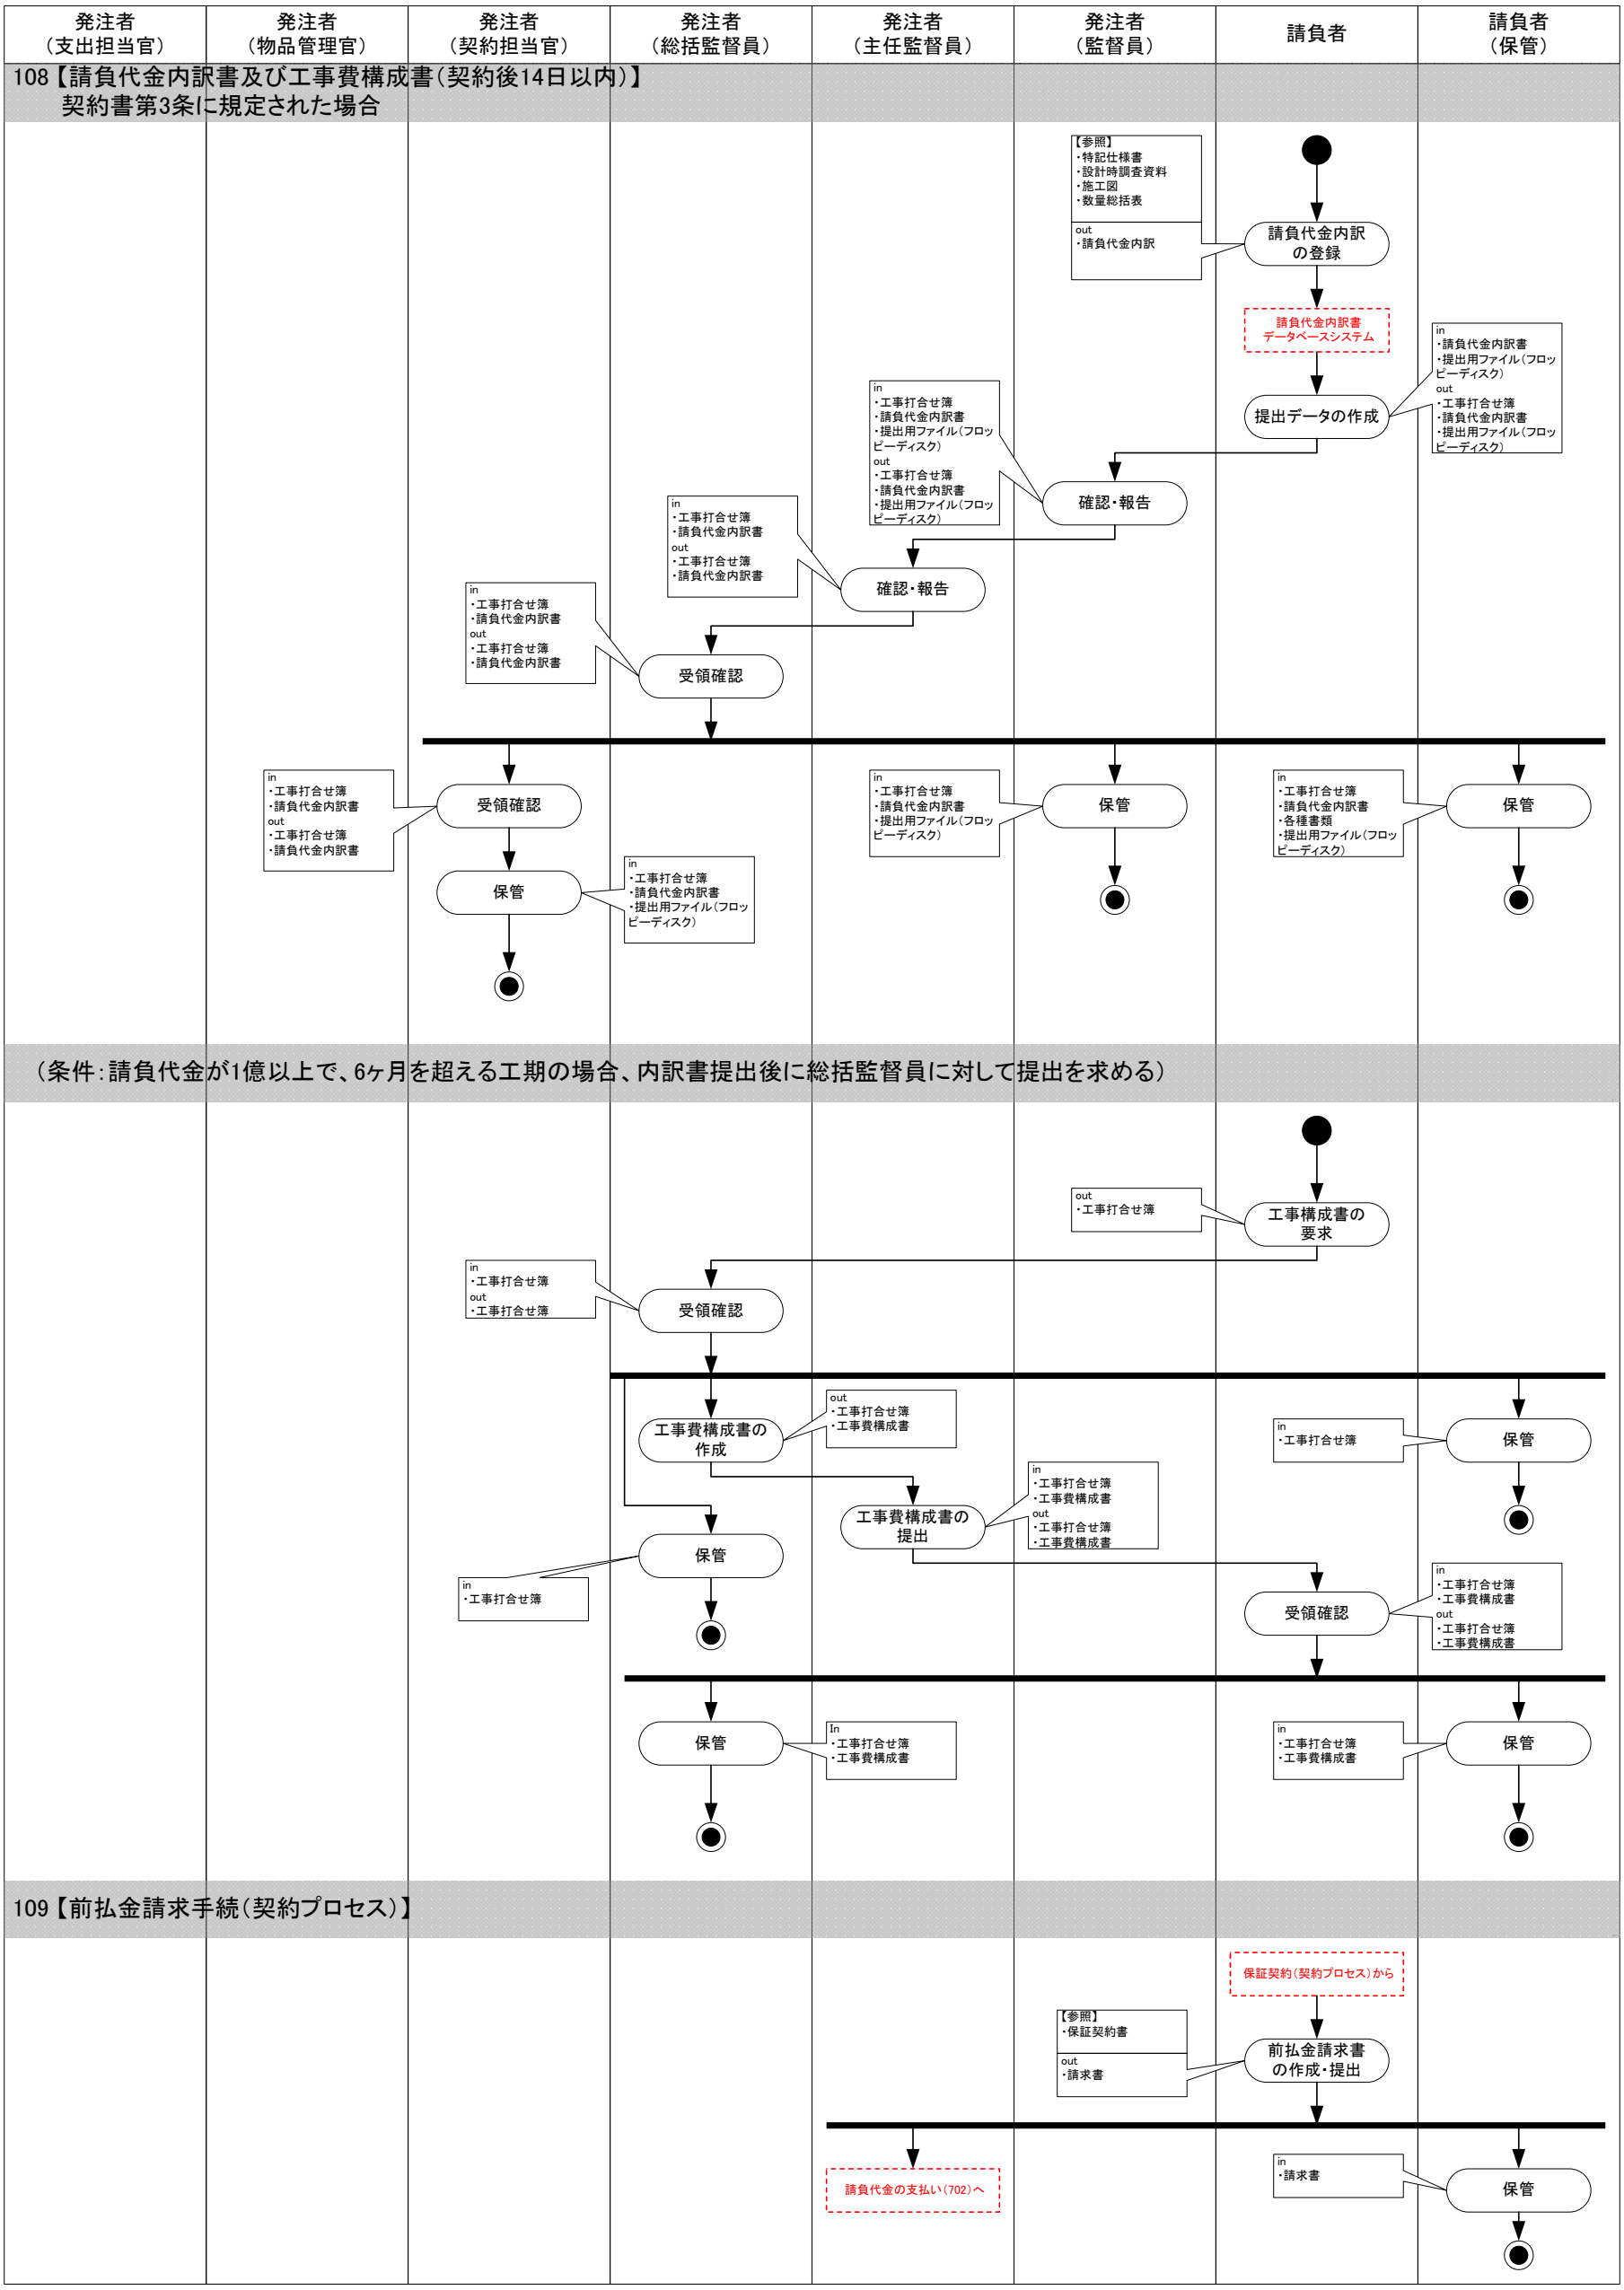

②施工準備（施工計画立案に必要な準備・調整事項）【工事契約～30日、及び箇所別施工前】

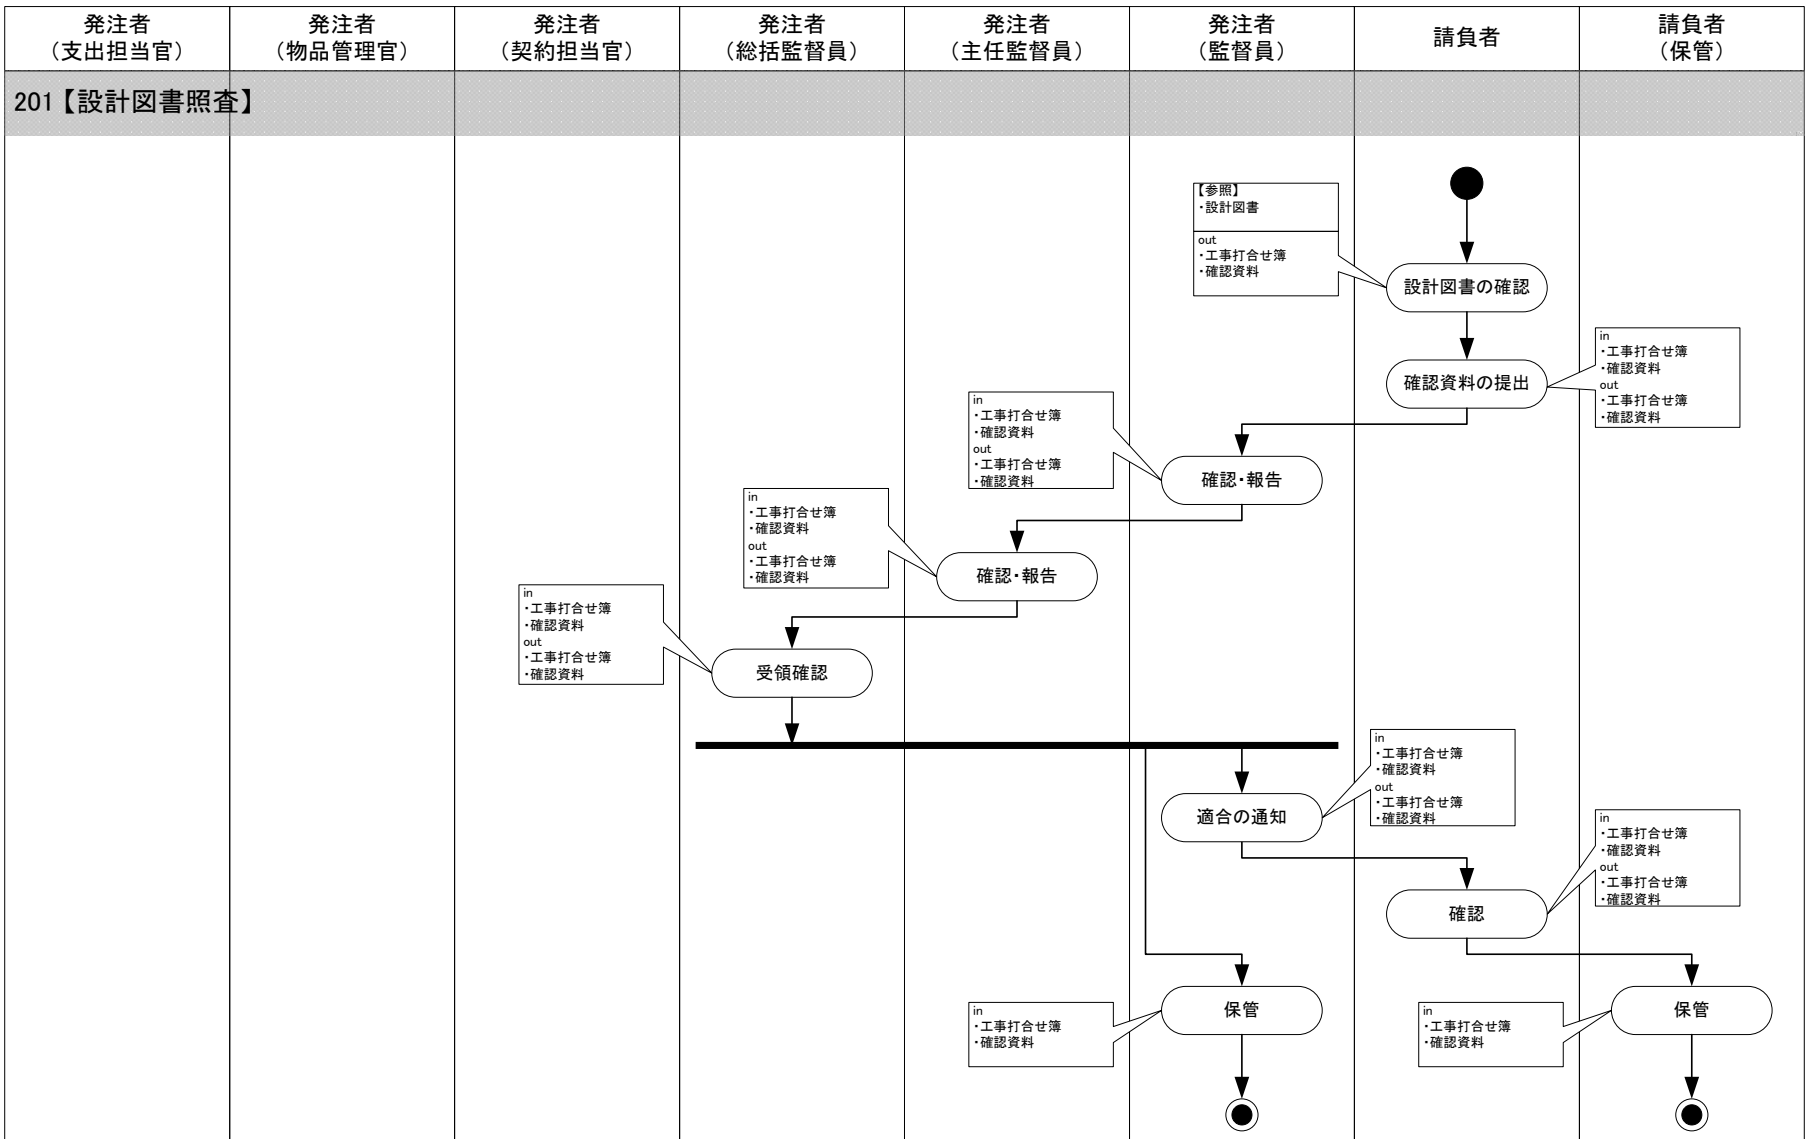

②施工準備（施工計画立案に必要な準備・調整事項）【工事契約～30日、及び箇所別施工前】

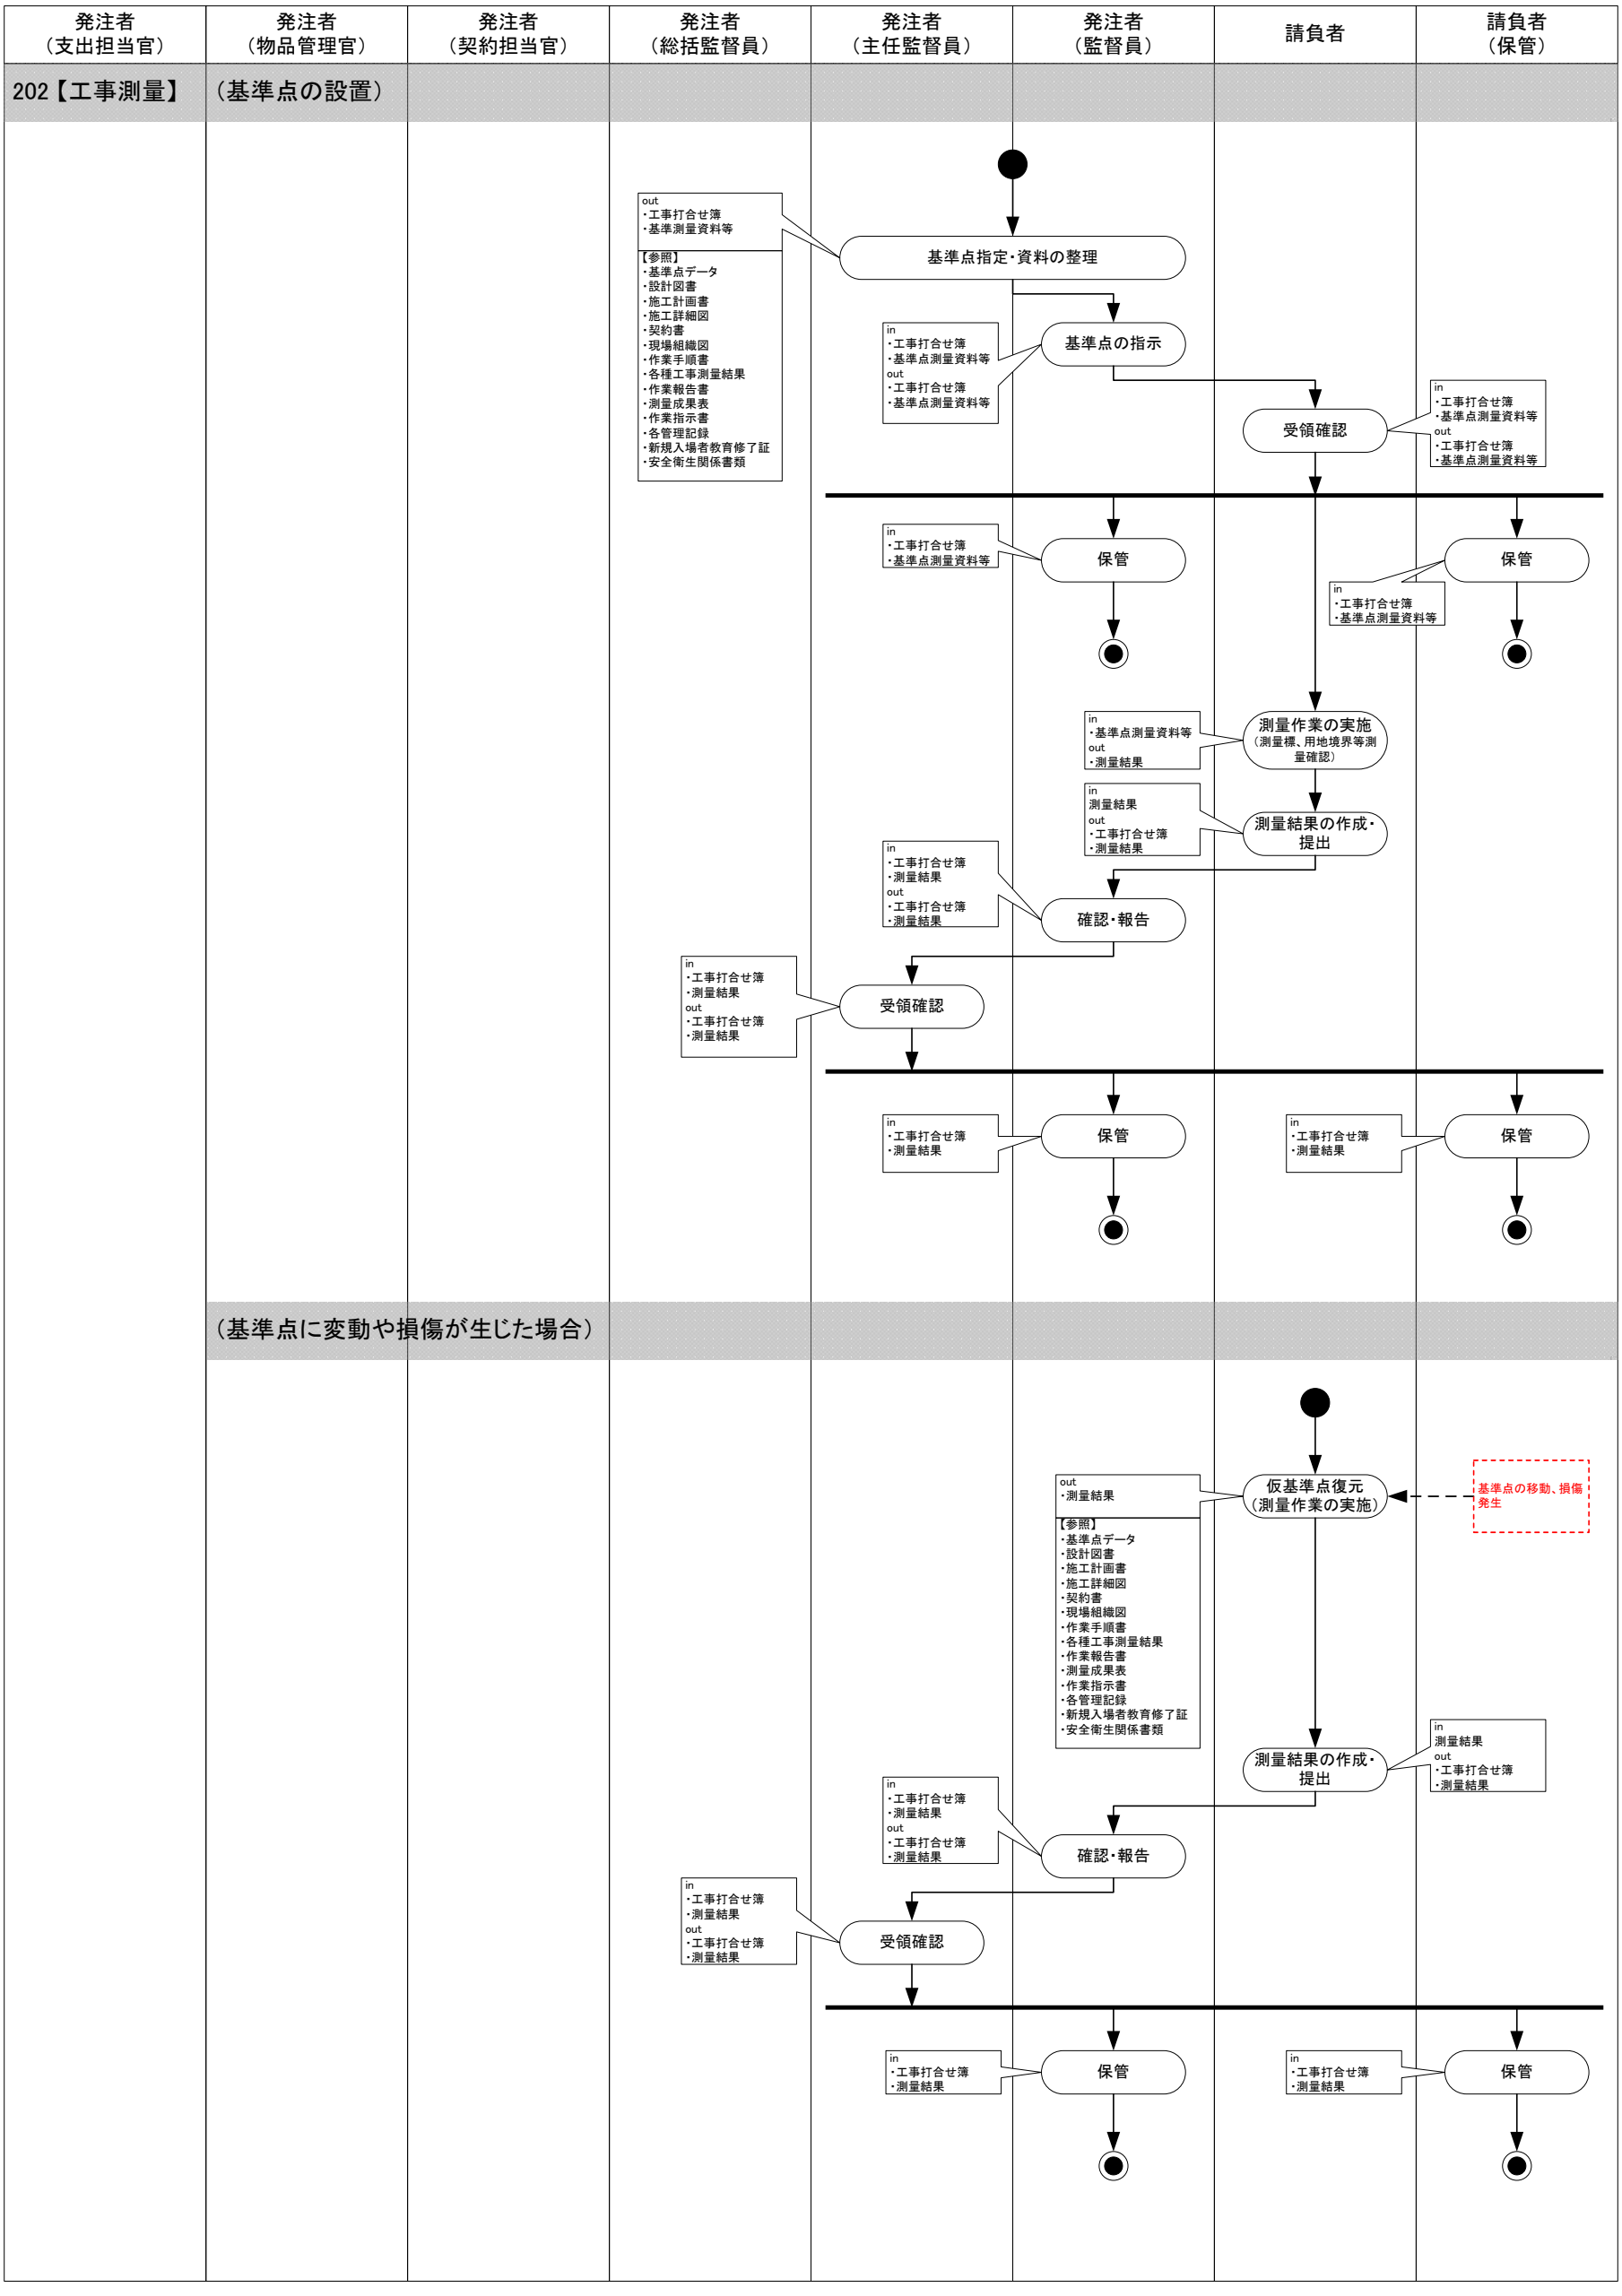

②施工準備（施工計画立案に必要な準備・調整事項）【工事契約～30日、及び箇所別施工前】

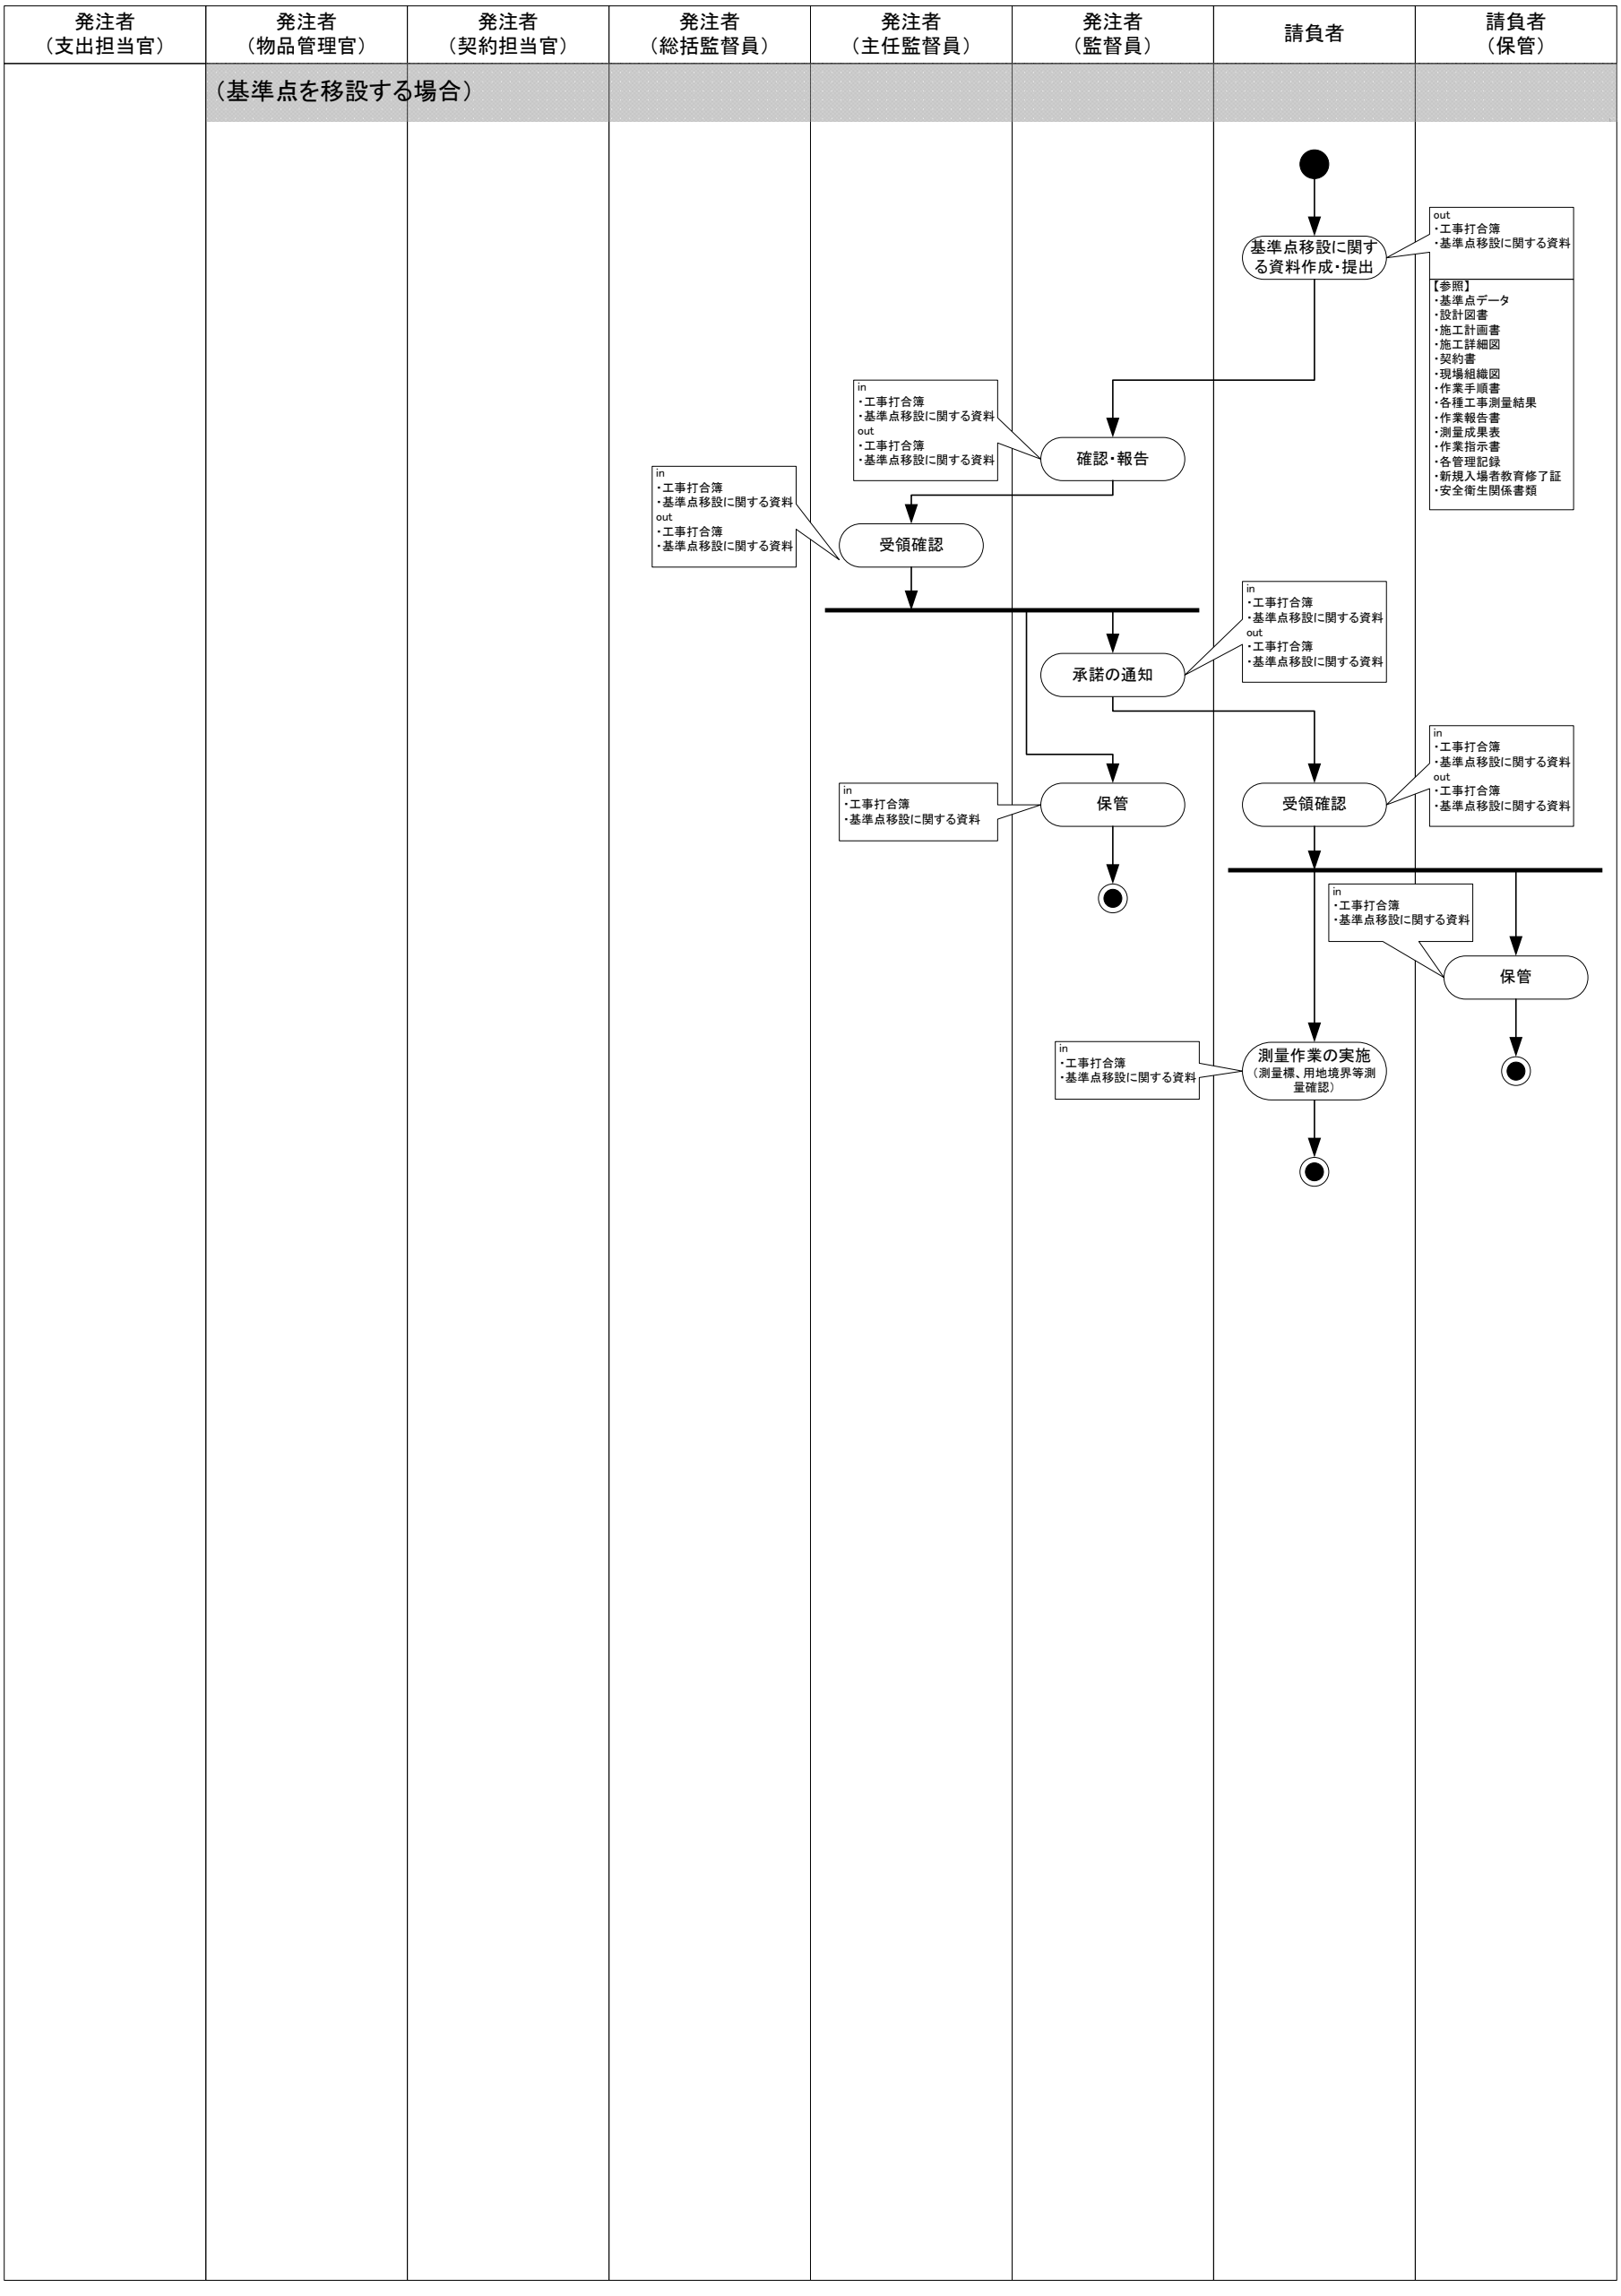

②施工準備（施工計画立案に必要な準備・調整事項）【工事契約～30日、及び箇所別施工前】

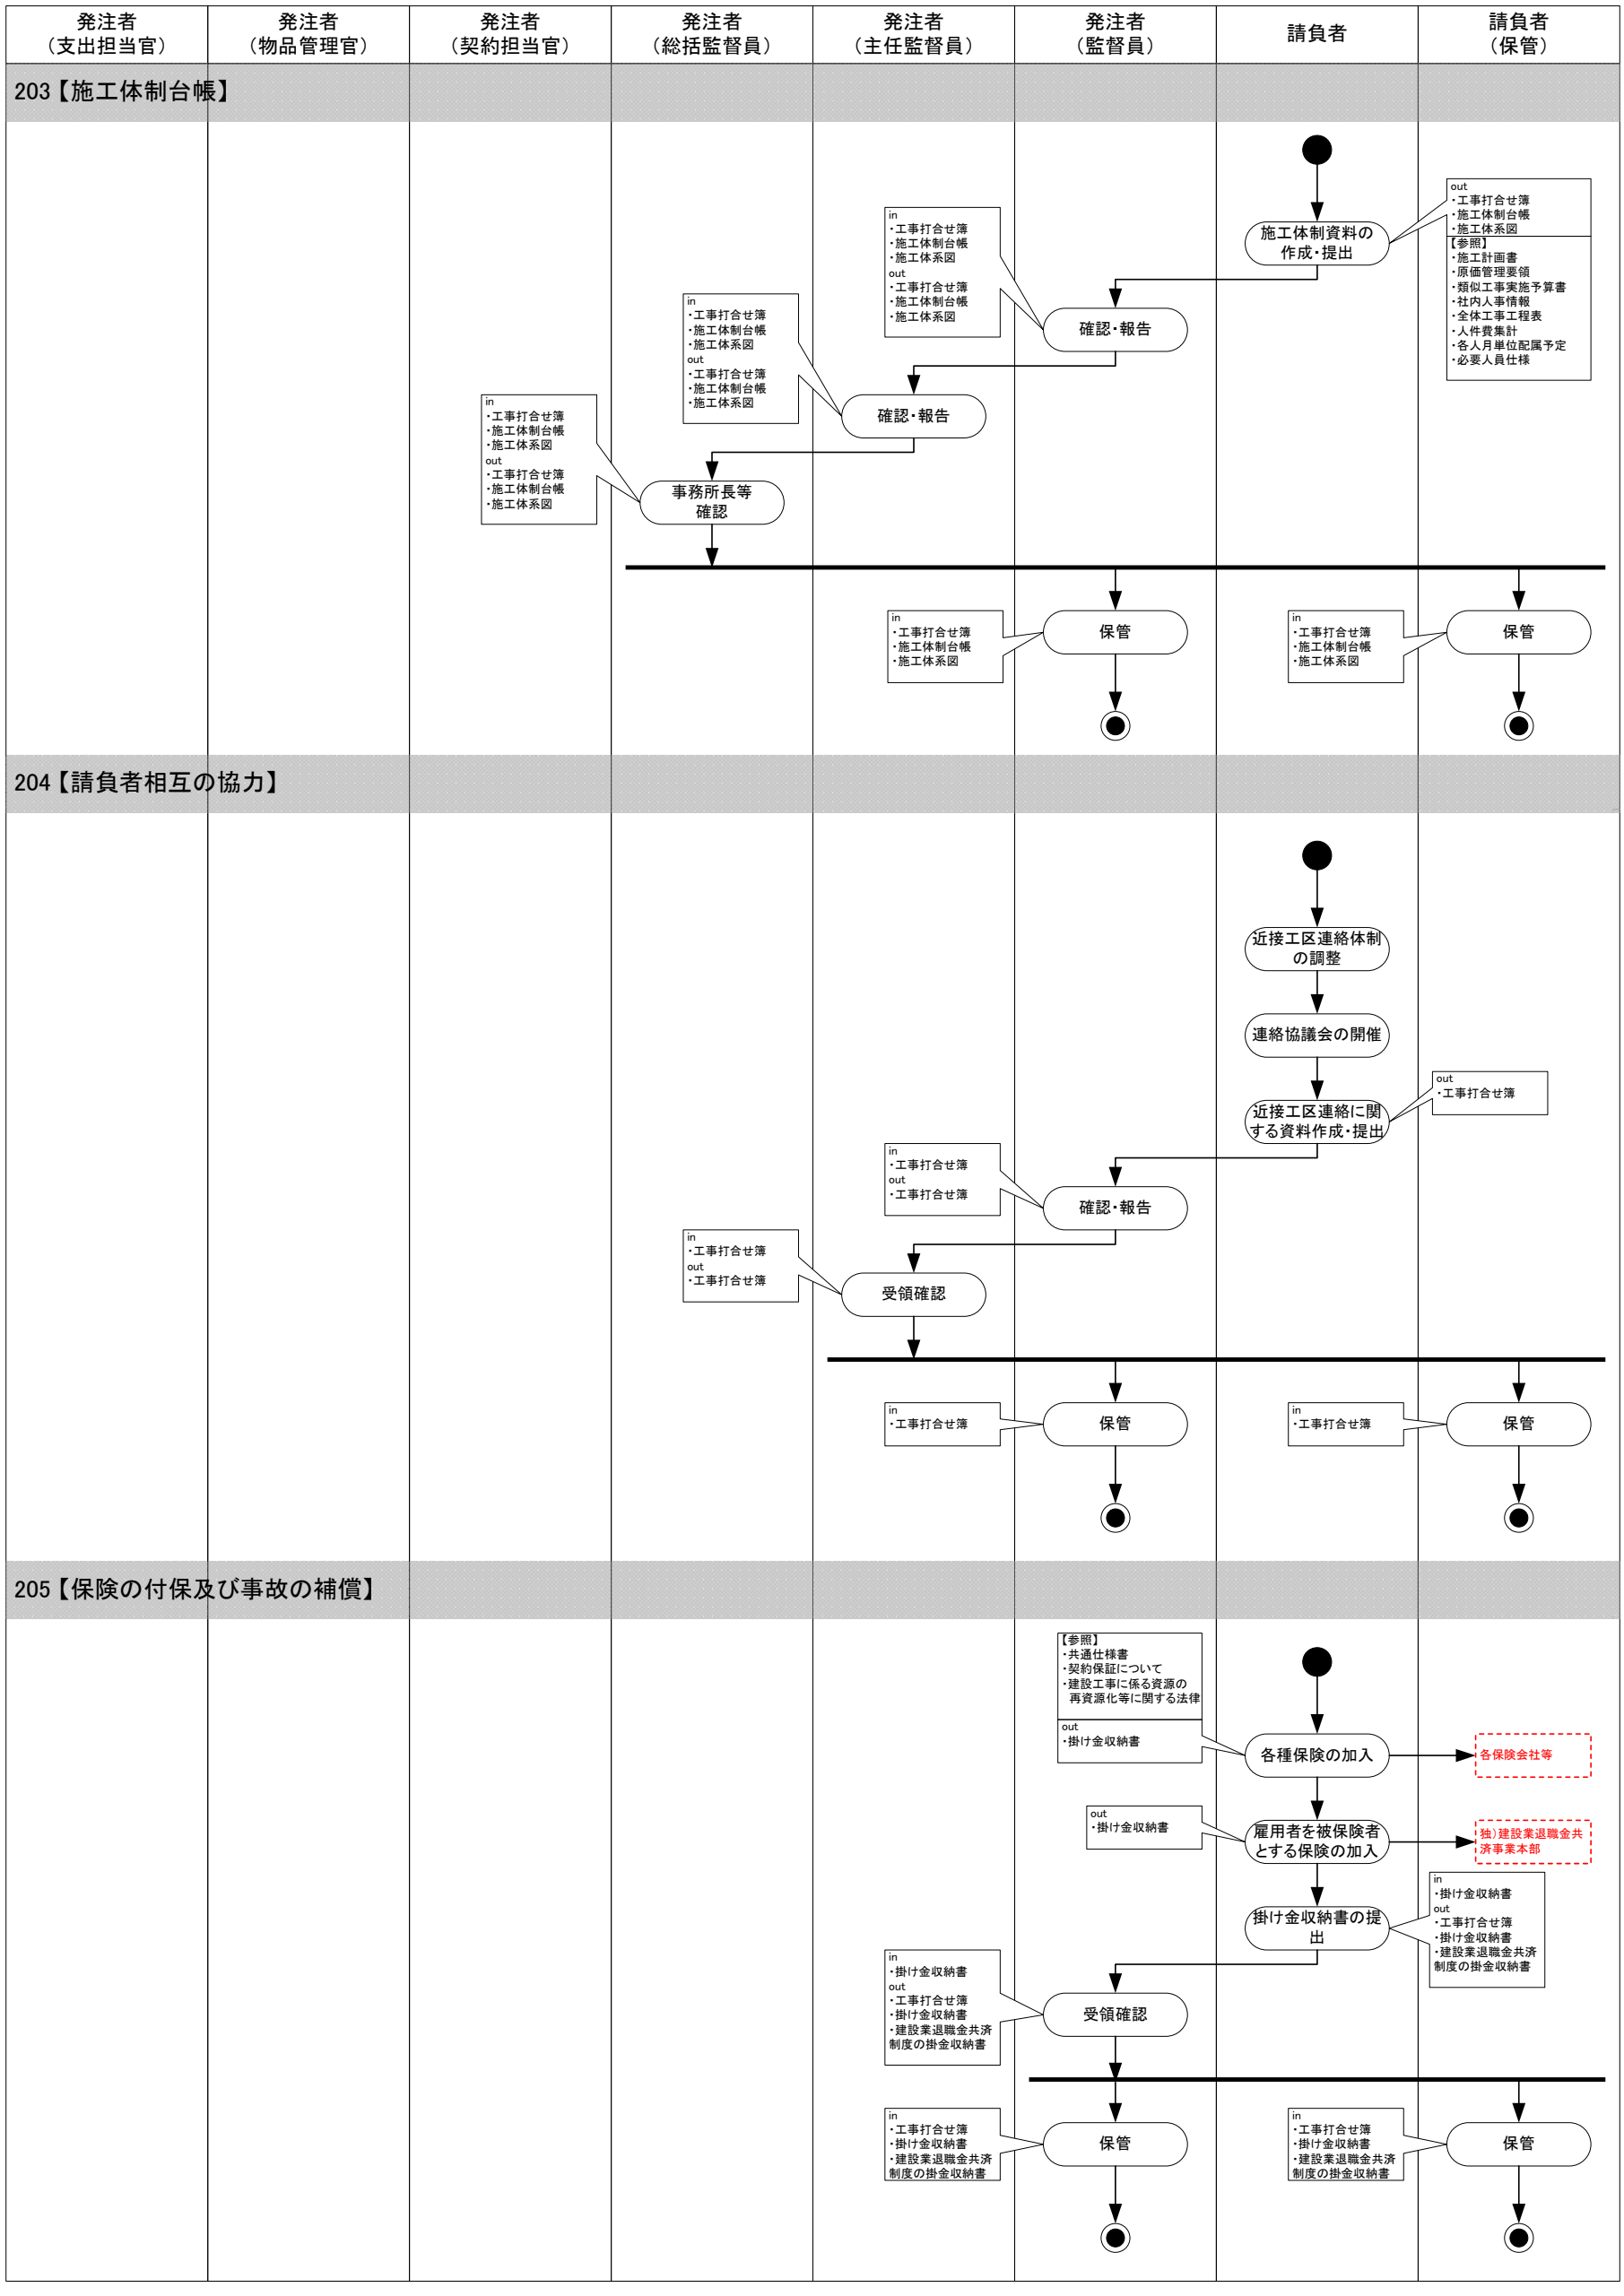

②施工準備（施工計画立案に必要な準備・調整事項）【工事契約～30日、及び箇所別施工前】

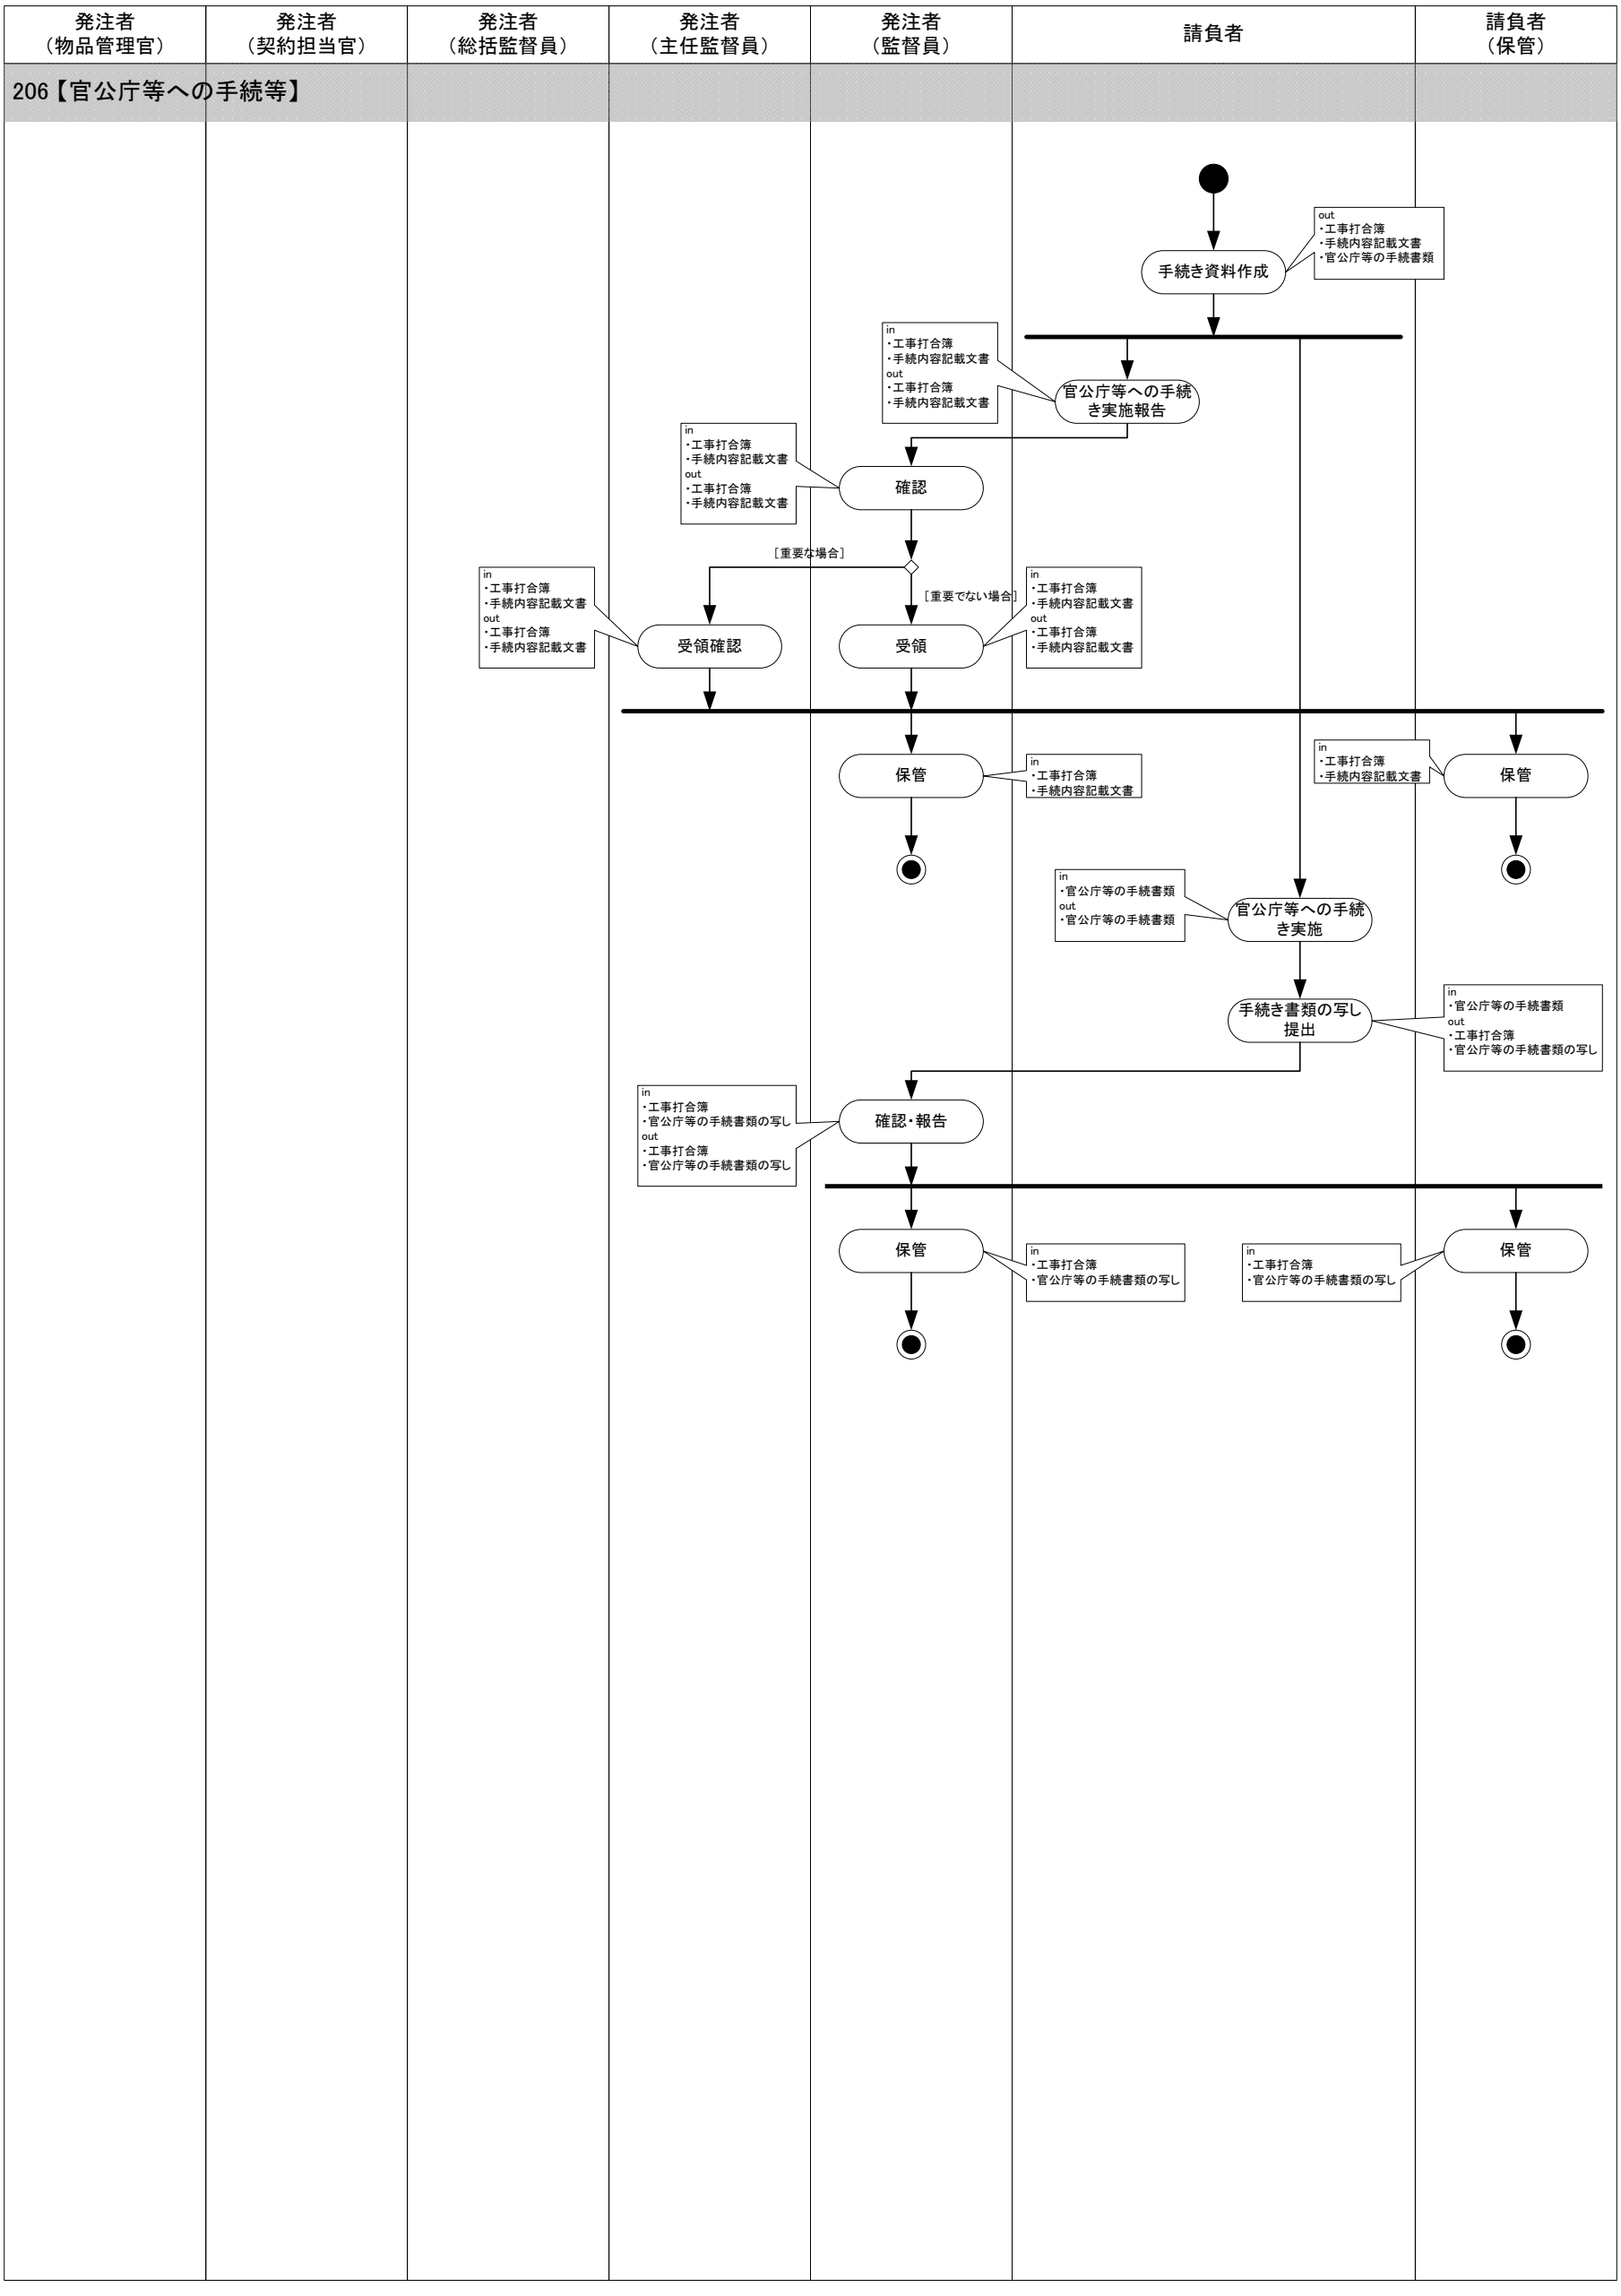

②施工準備（施工計画立案に必要な準備・調整事項）【工事契約～30日、及び箇所別施工前】

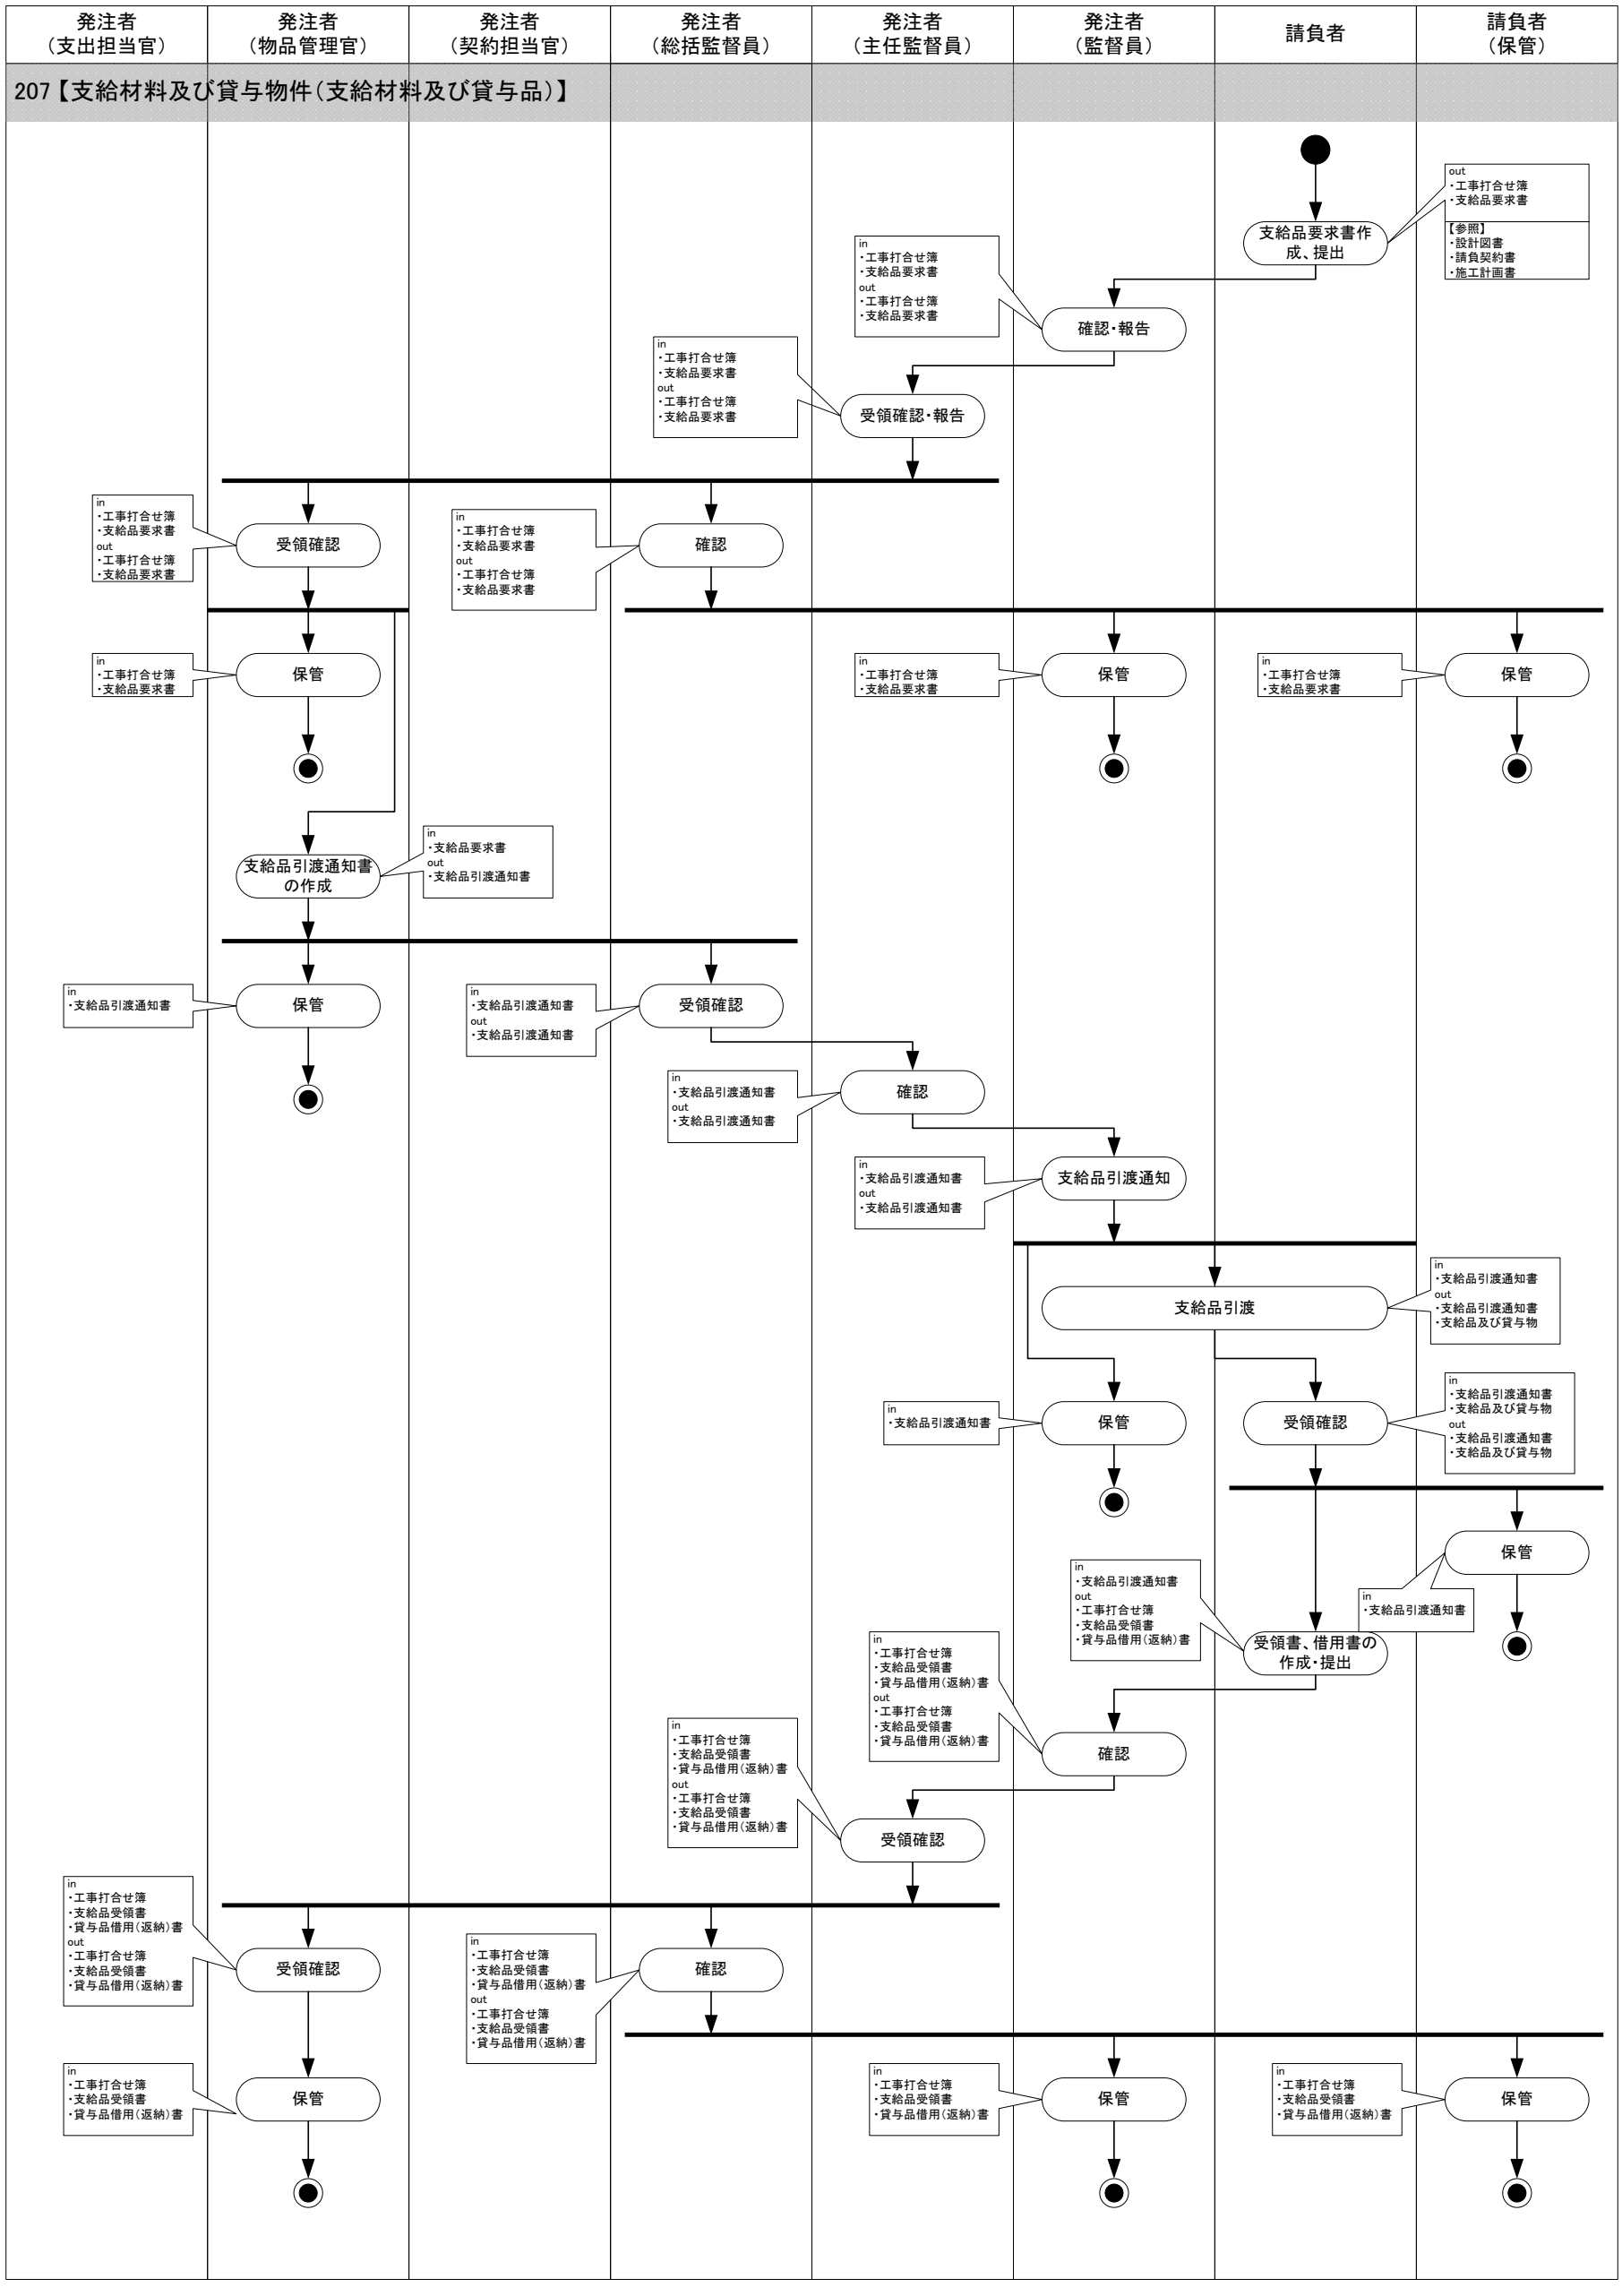

巻末資料2-1-11

②施工準備（施工計画立案に必要な準備・調整事項）【工事契約～30日、及び箇所別施工前】

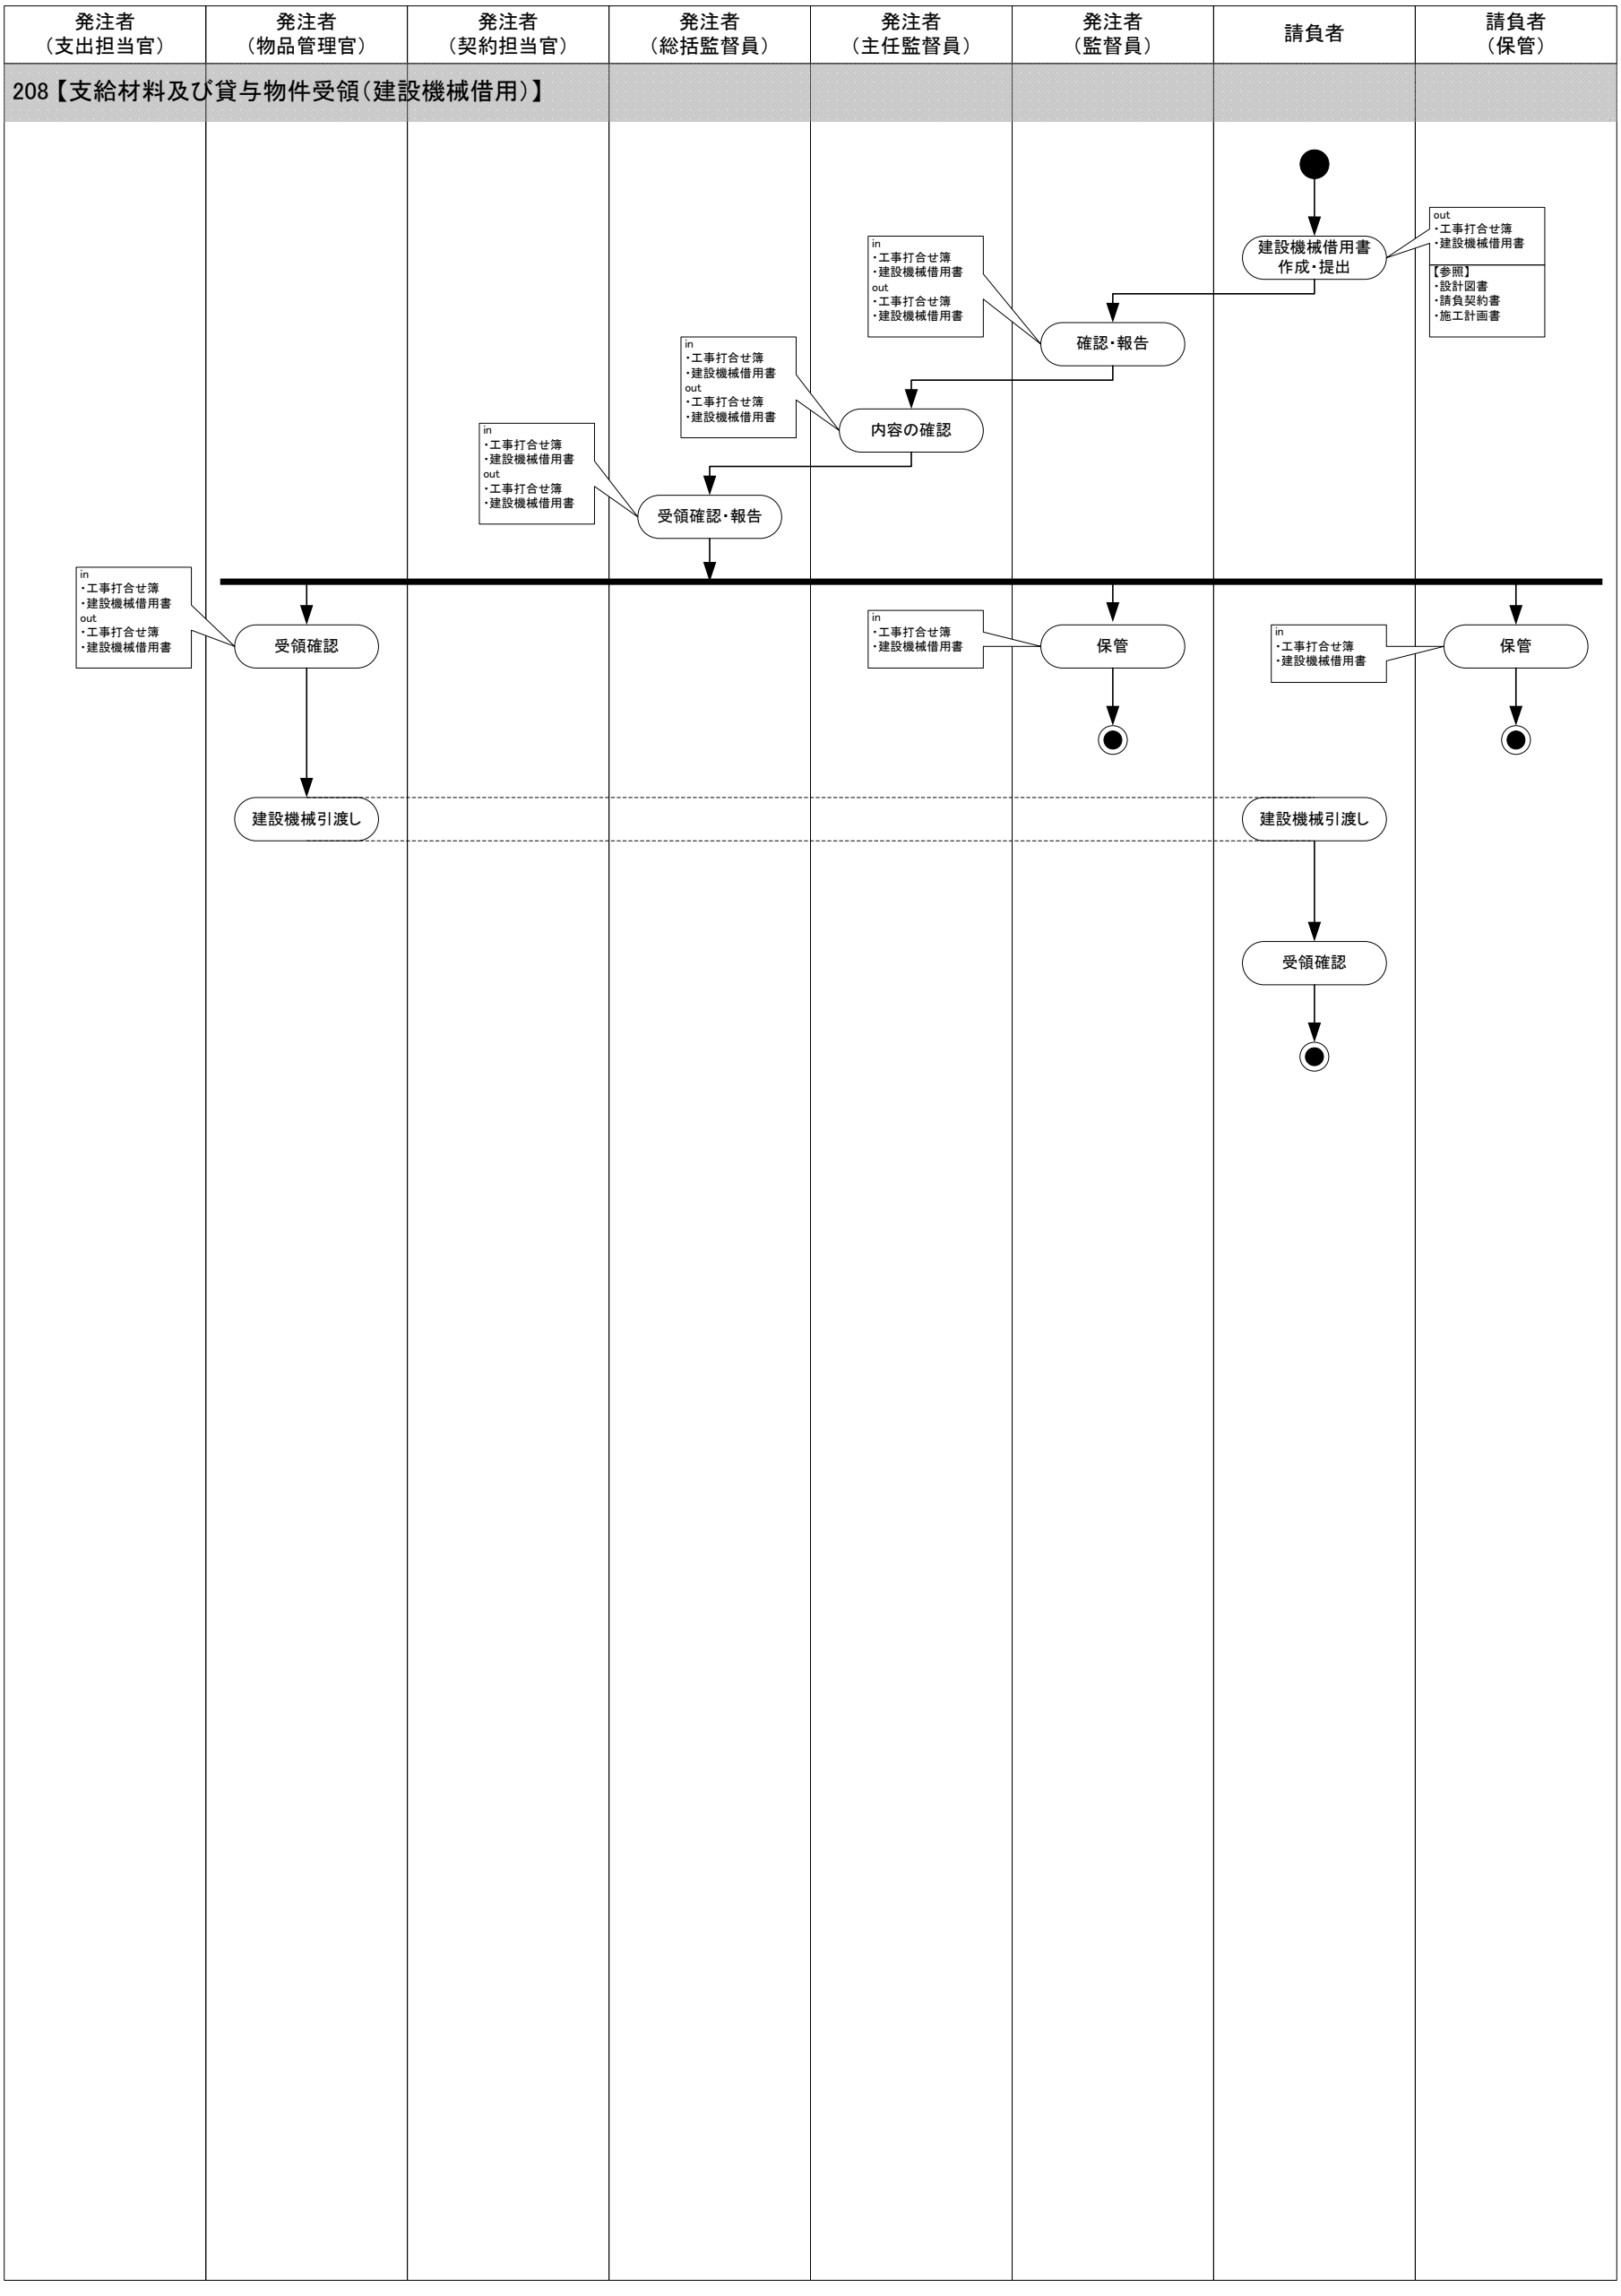

②施工準備（施工計画立案に必要な準備・調整事項）【工事契約～30日、及び箇所別施工前】

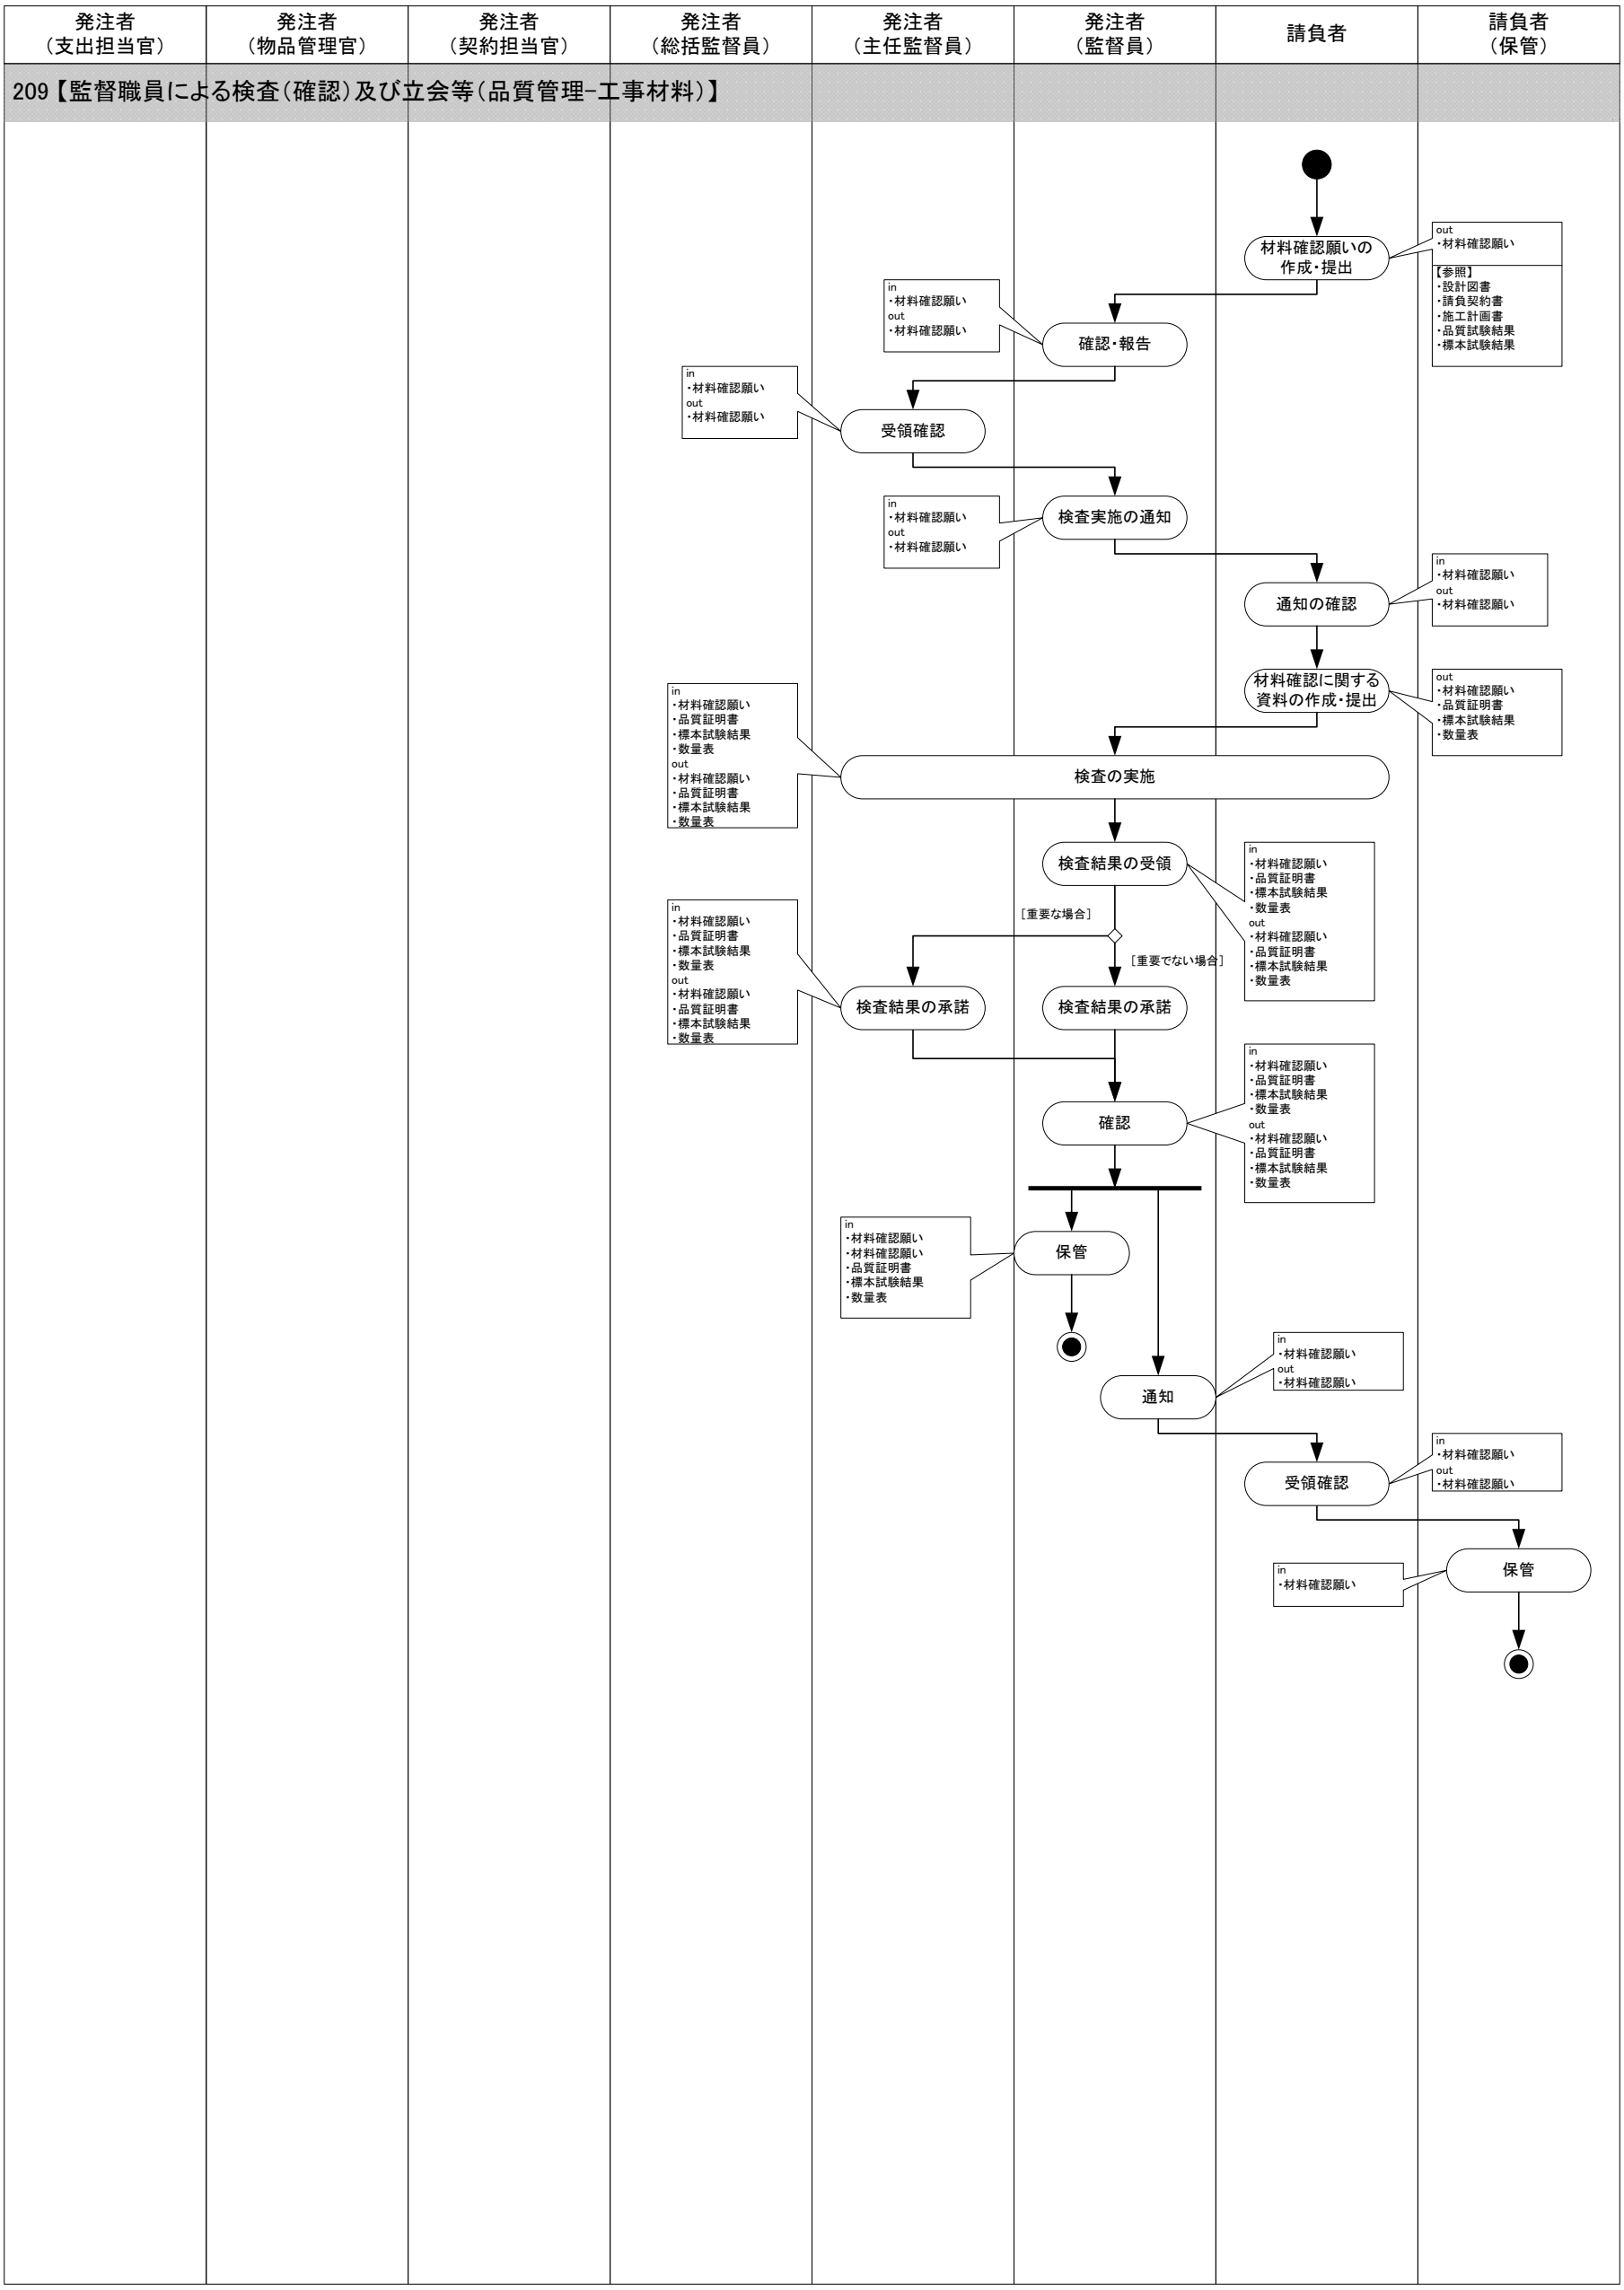

②施工準備（施工計画立案に必要な準備・調整事項）【工事契約～30日、及び箇所別施工前】

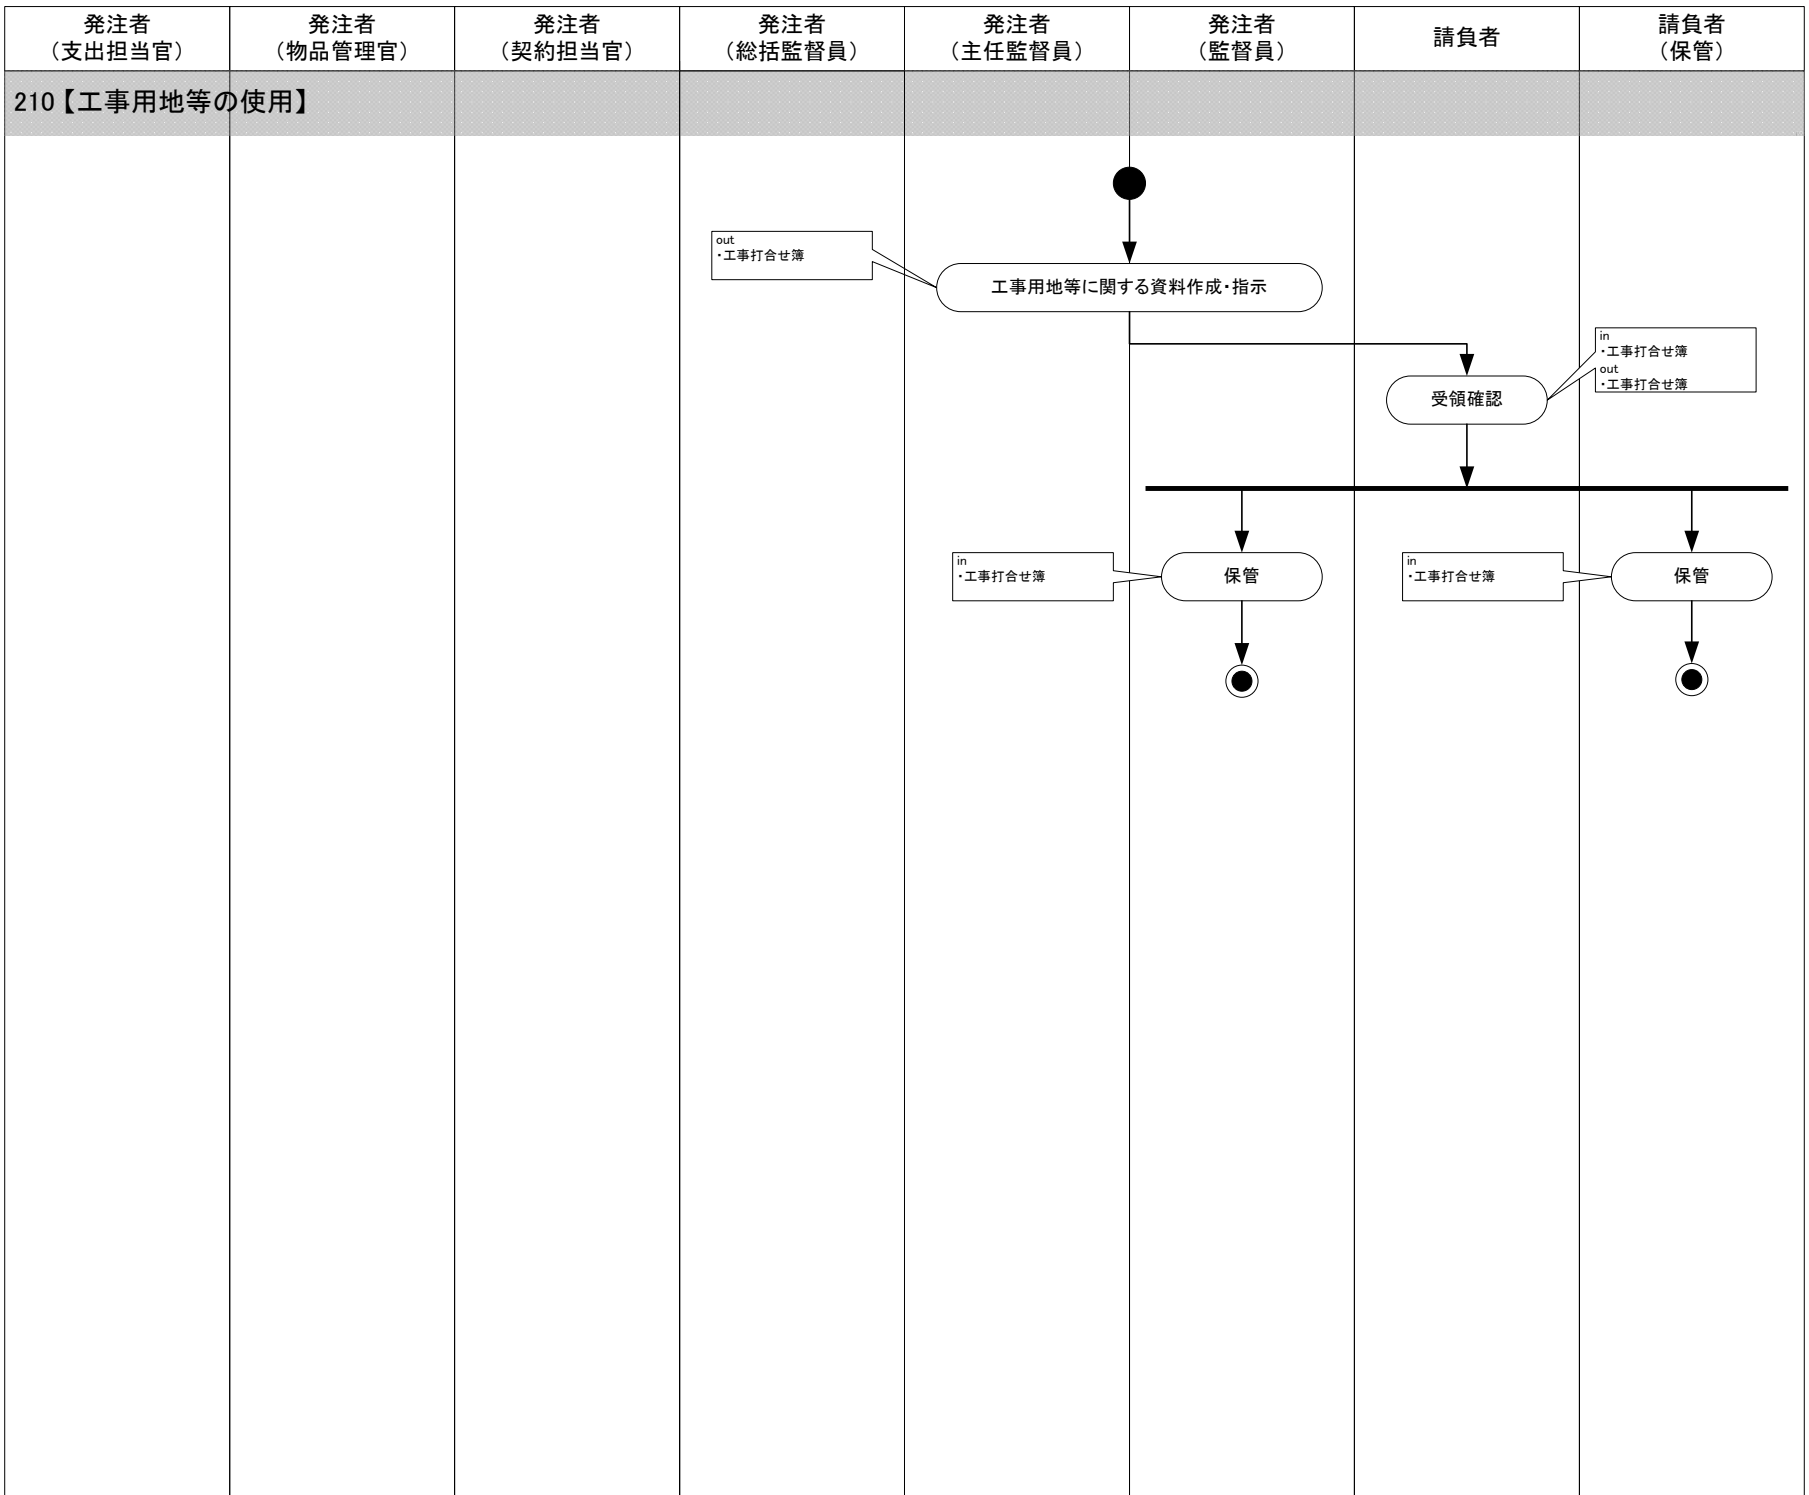

③施工計画【工事契約～30日、及び箇所・工種別施工計画】

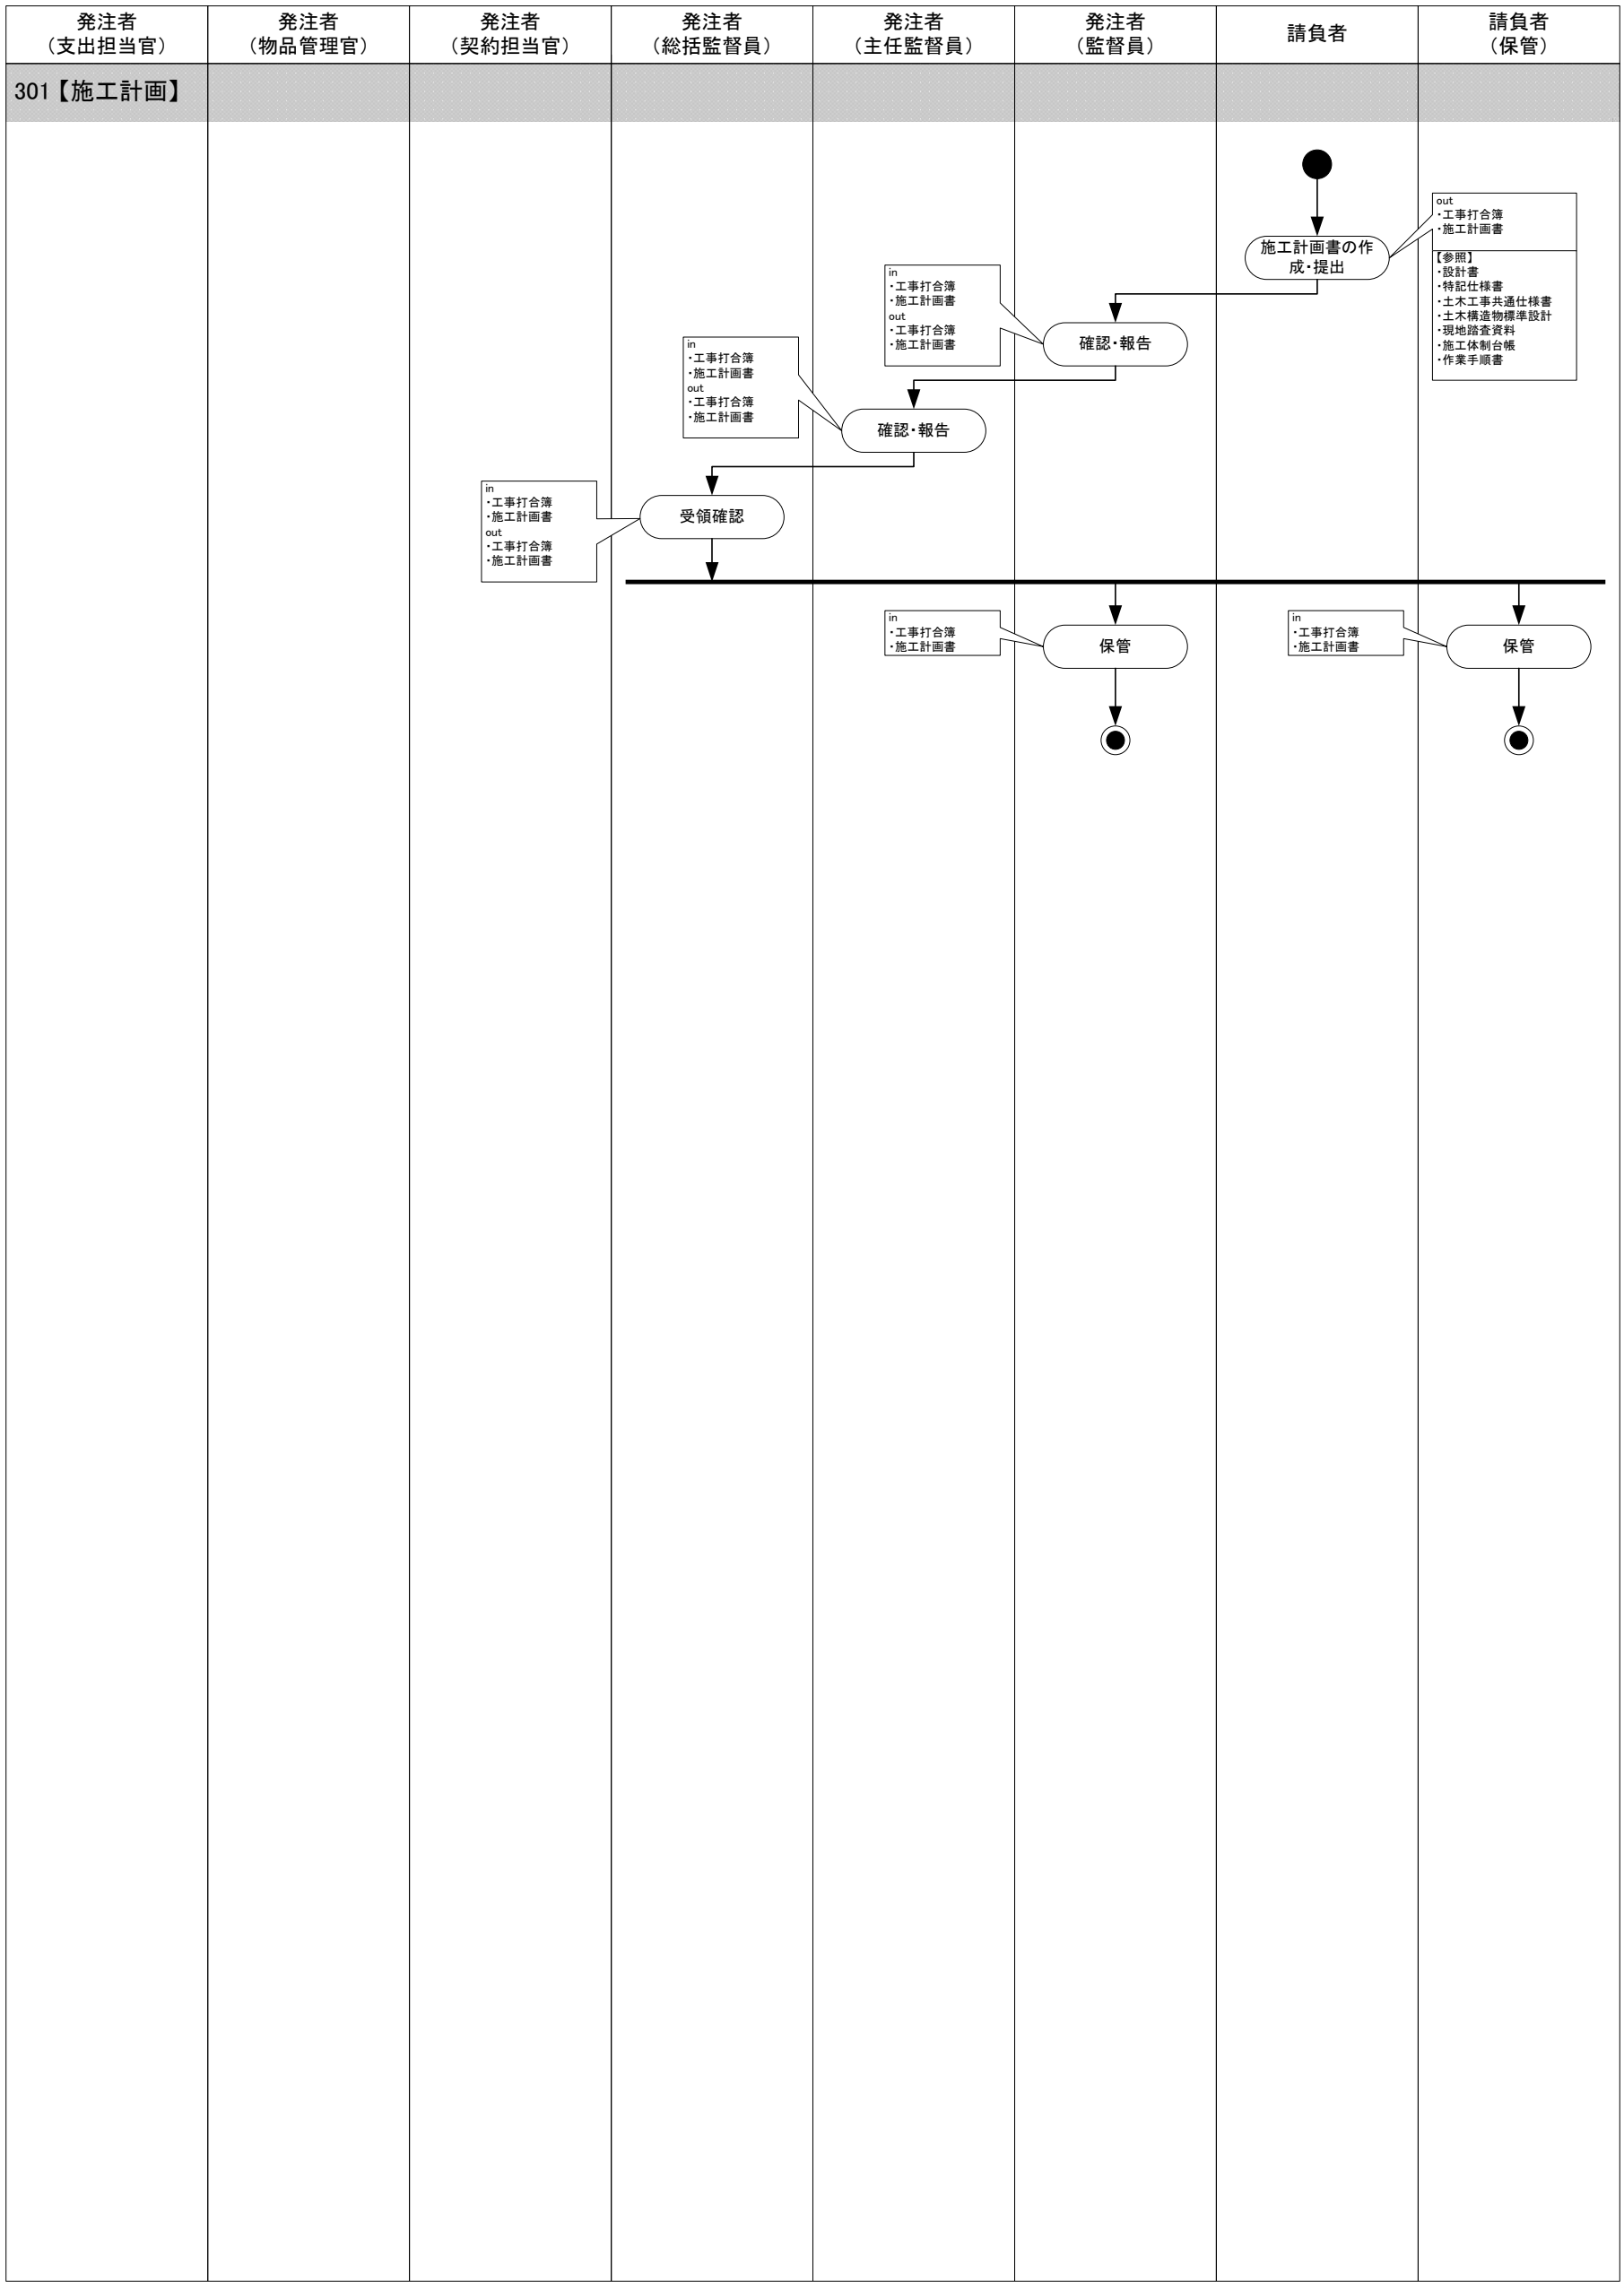

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

発注者 （支出担当官）	発注者 （物品管理官）	発注者 （契約担当官）	発注者 （総括監督員）	発注者 （主任監督員）	発注者 （監督員）	請負者	請負者 （保管）
401【本工事】							
		巻末資料2-2 参照					

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

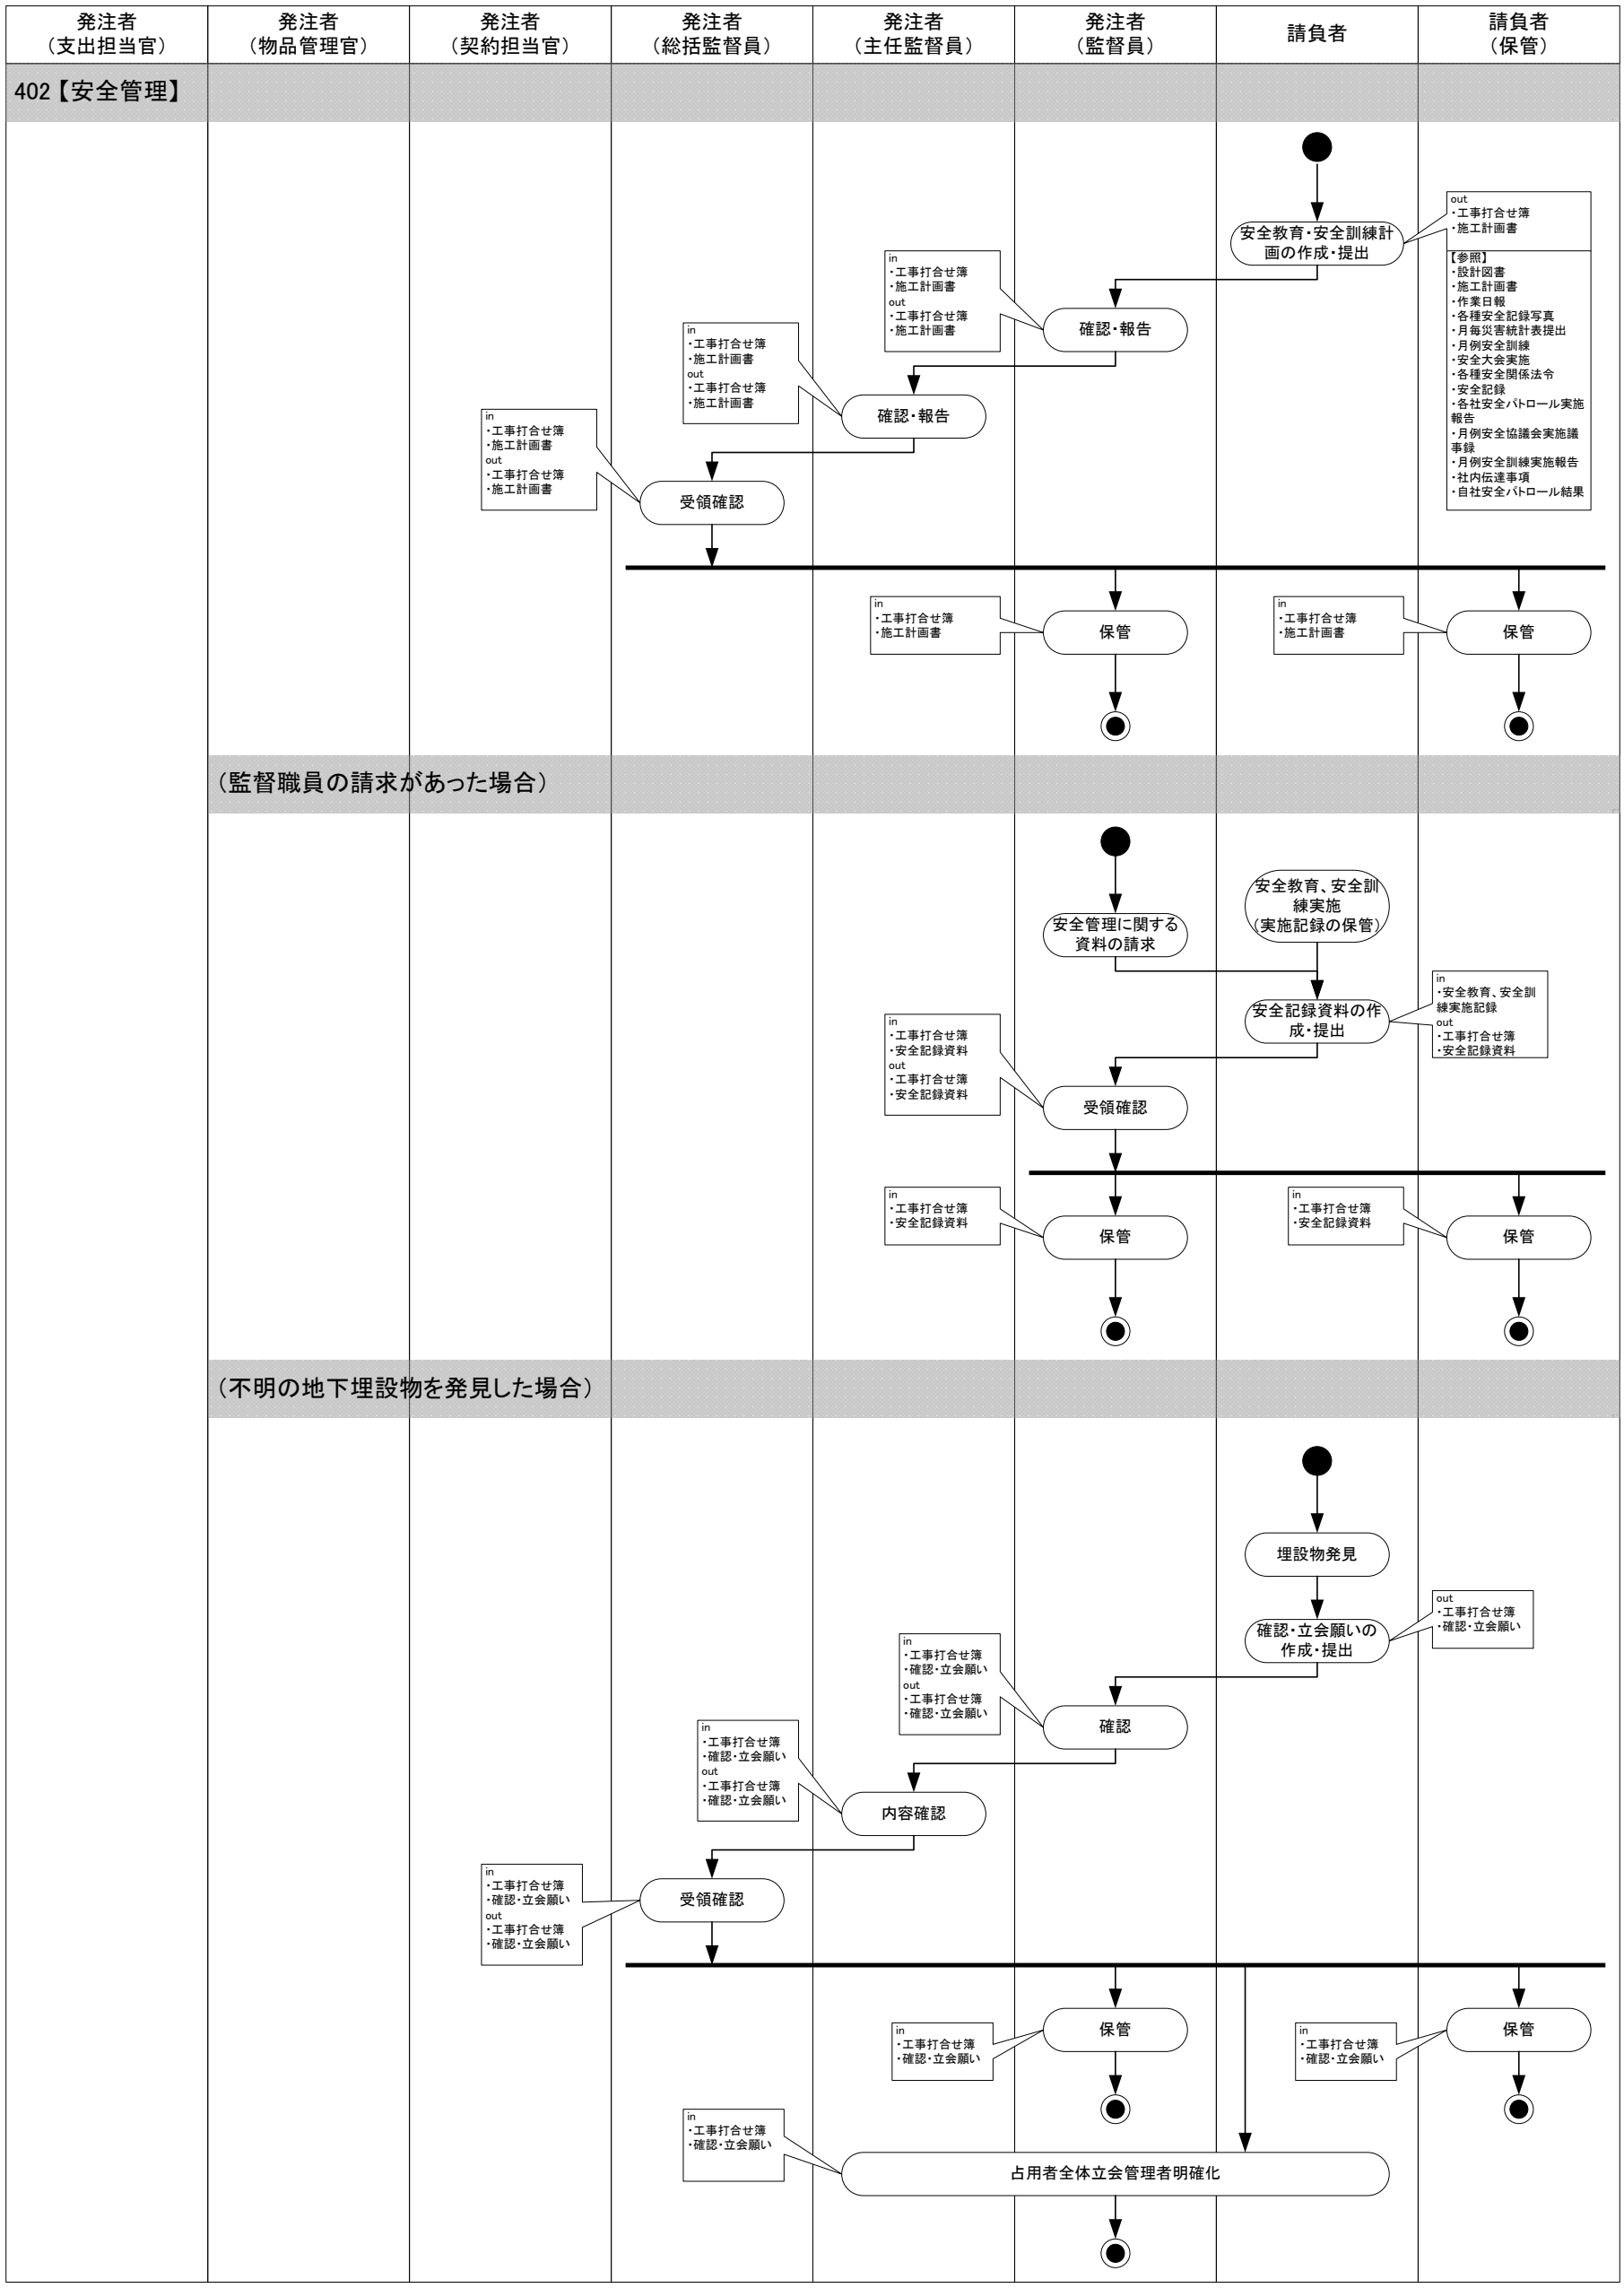

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

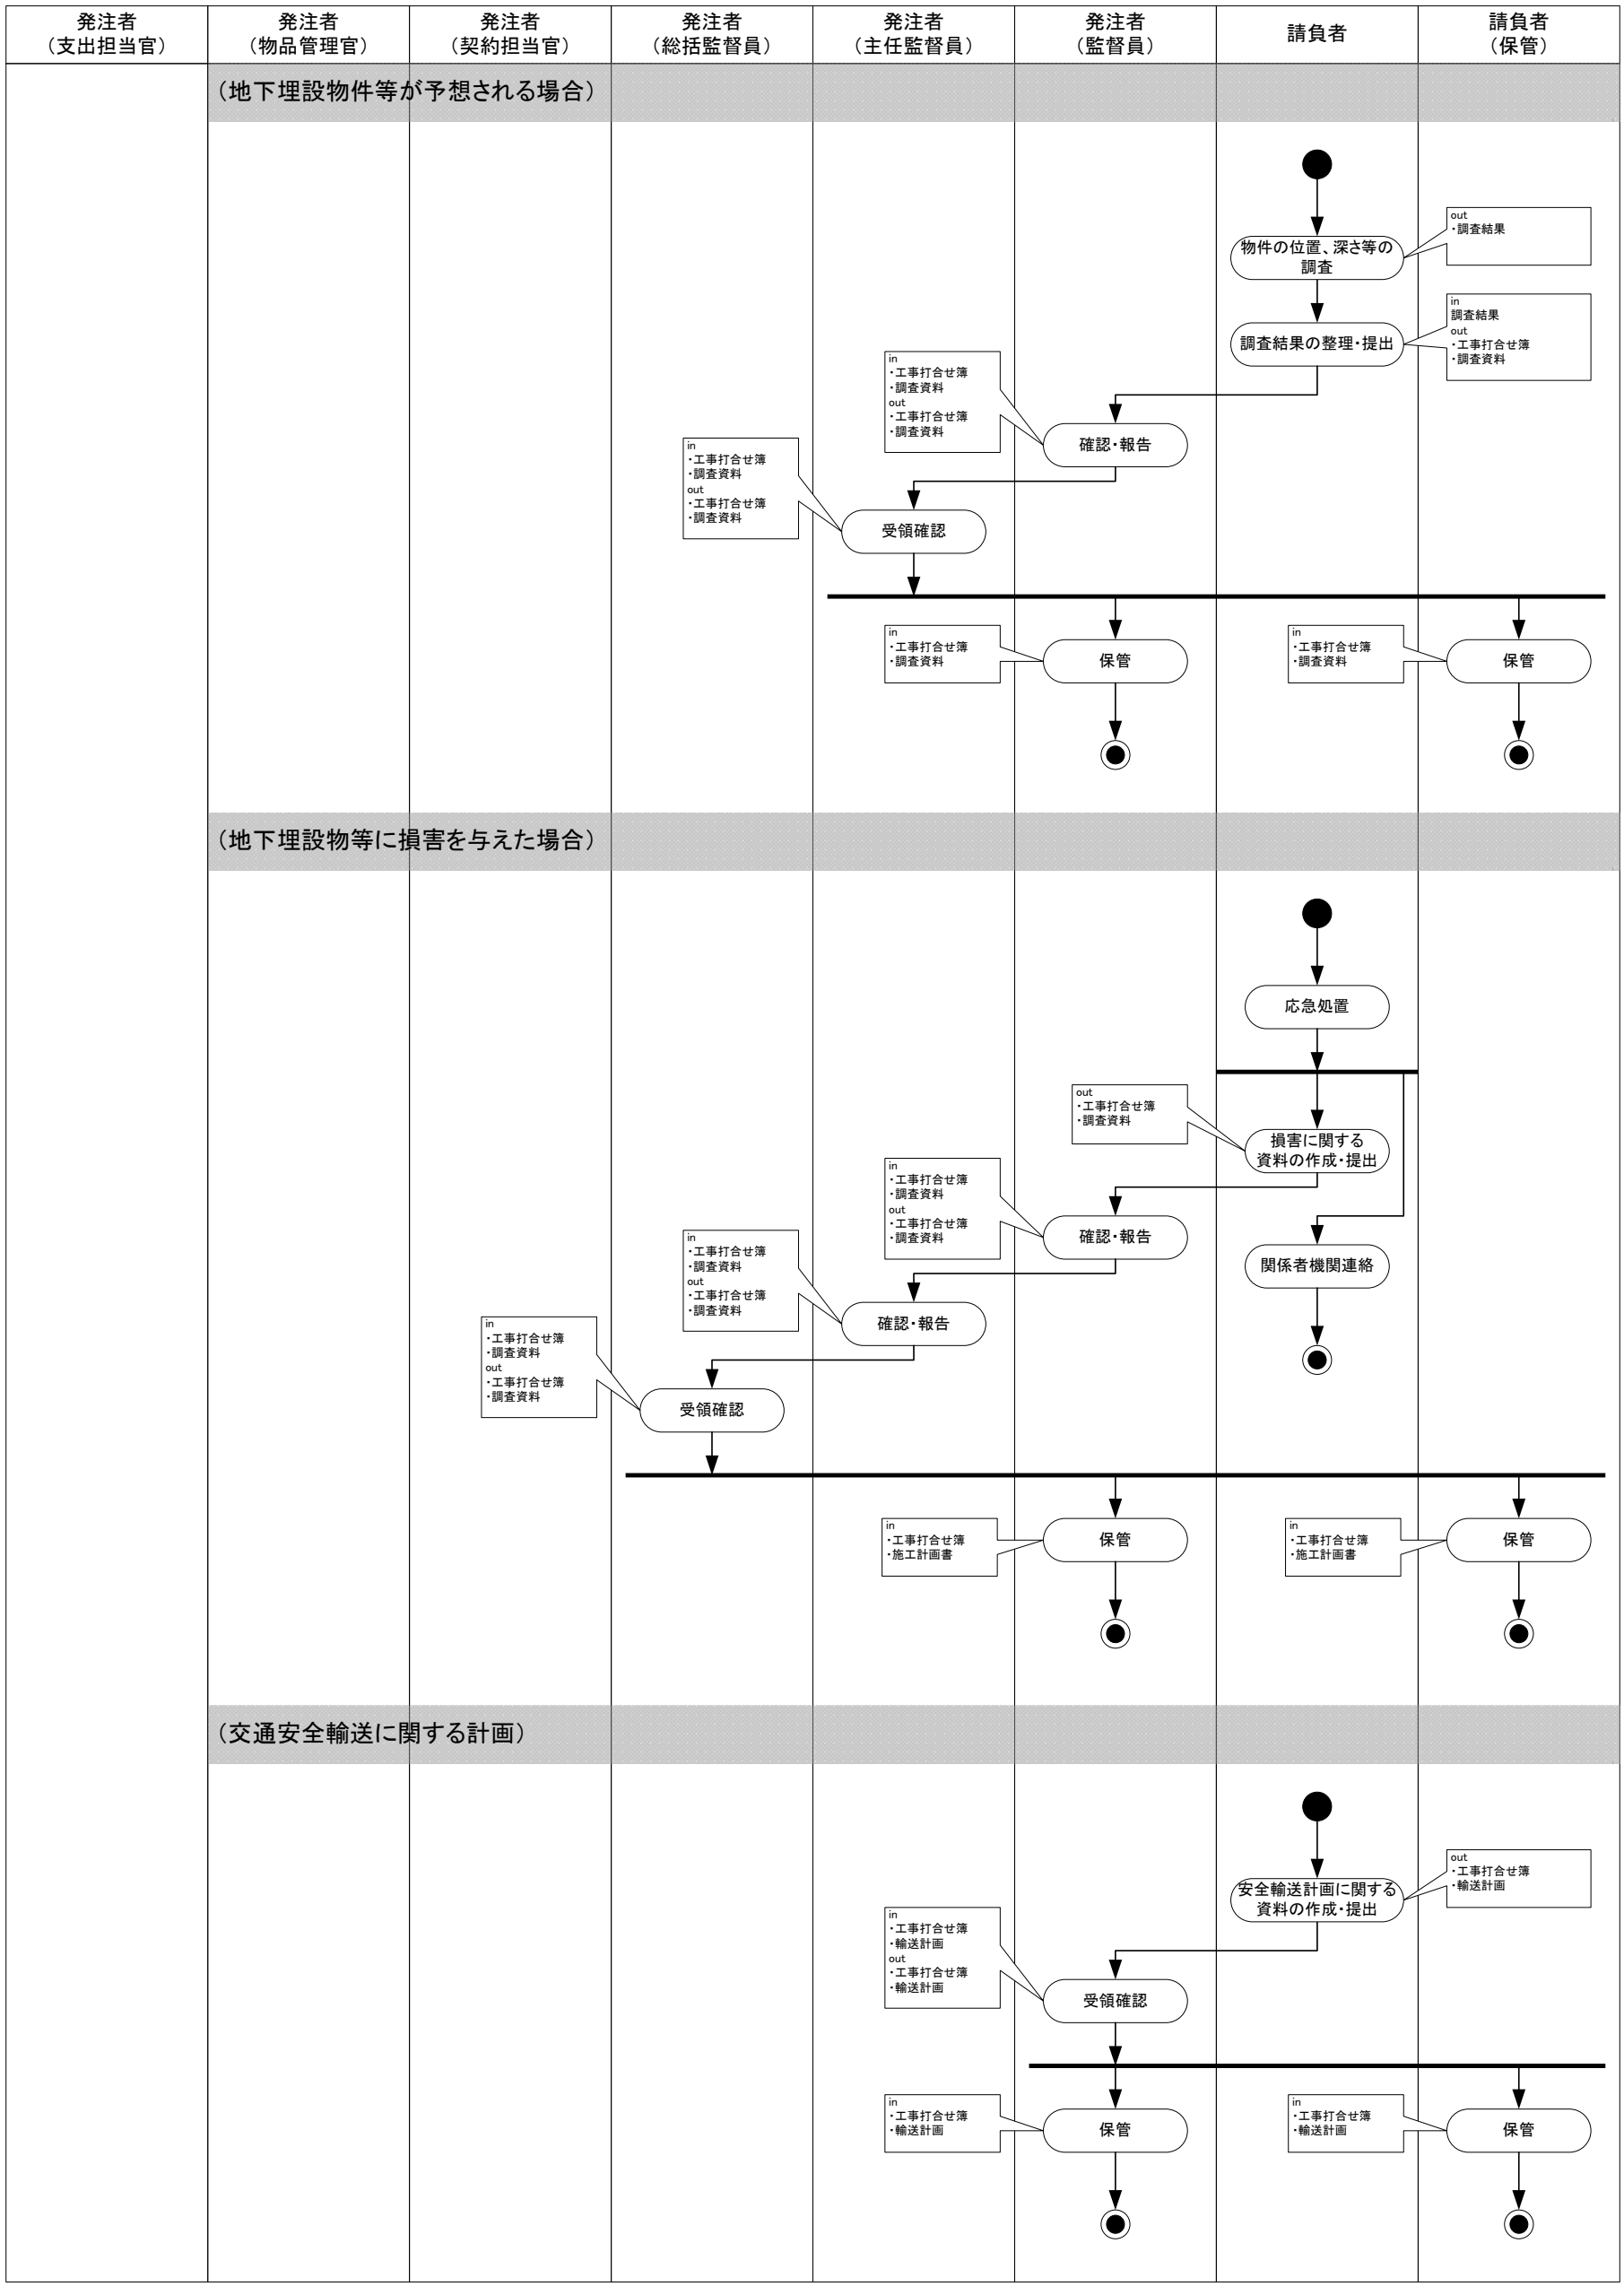

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

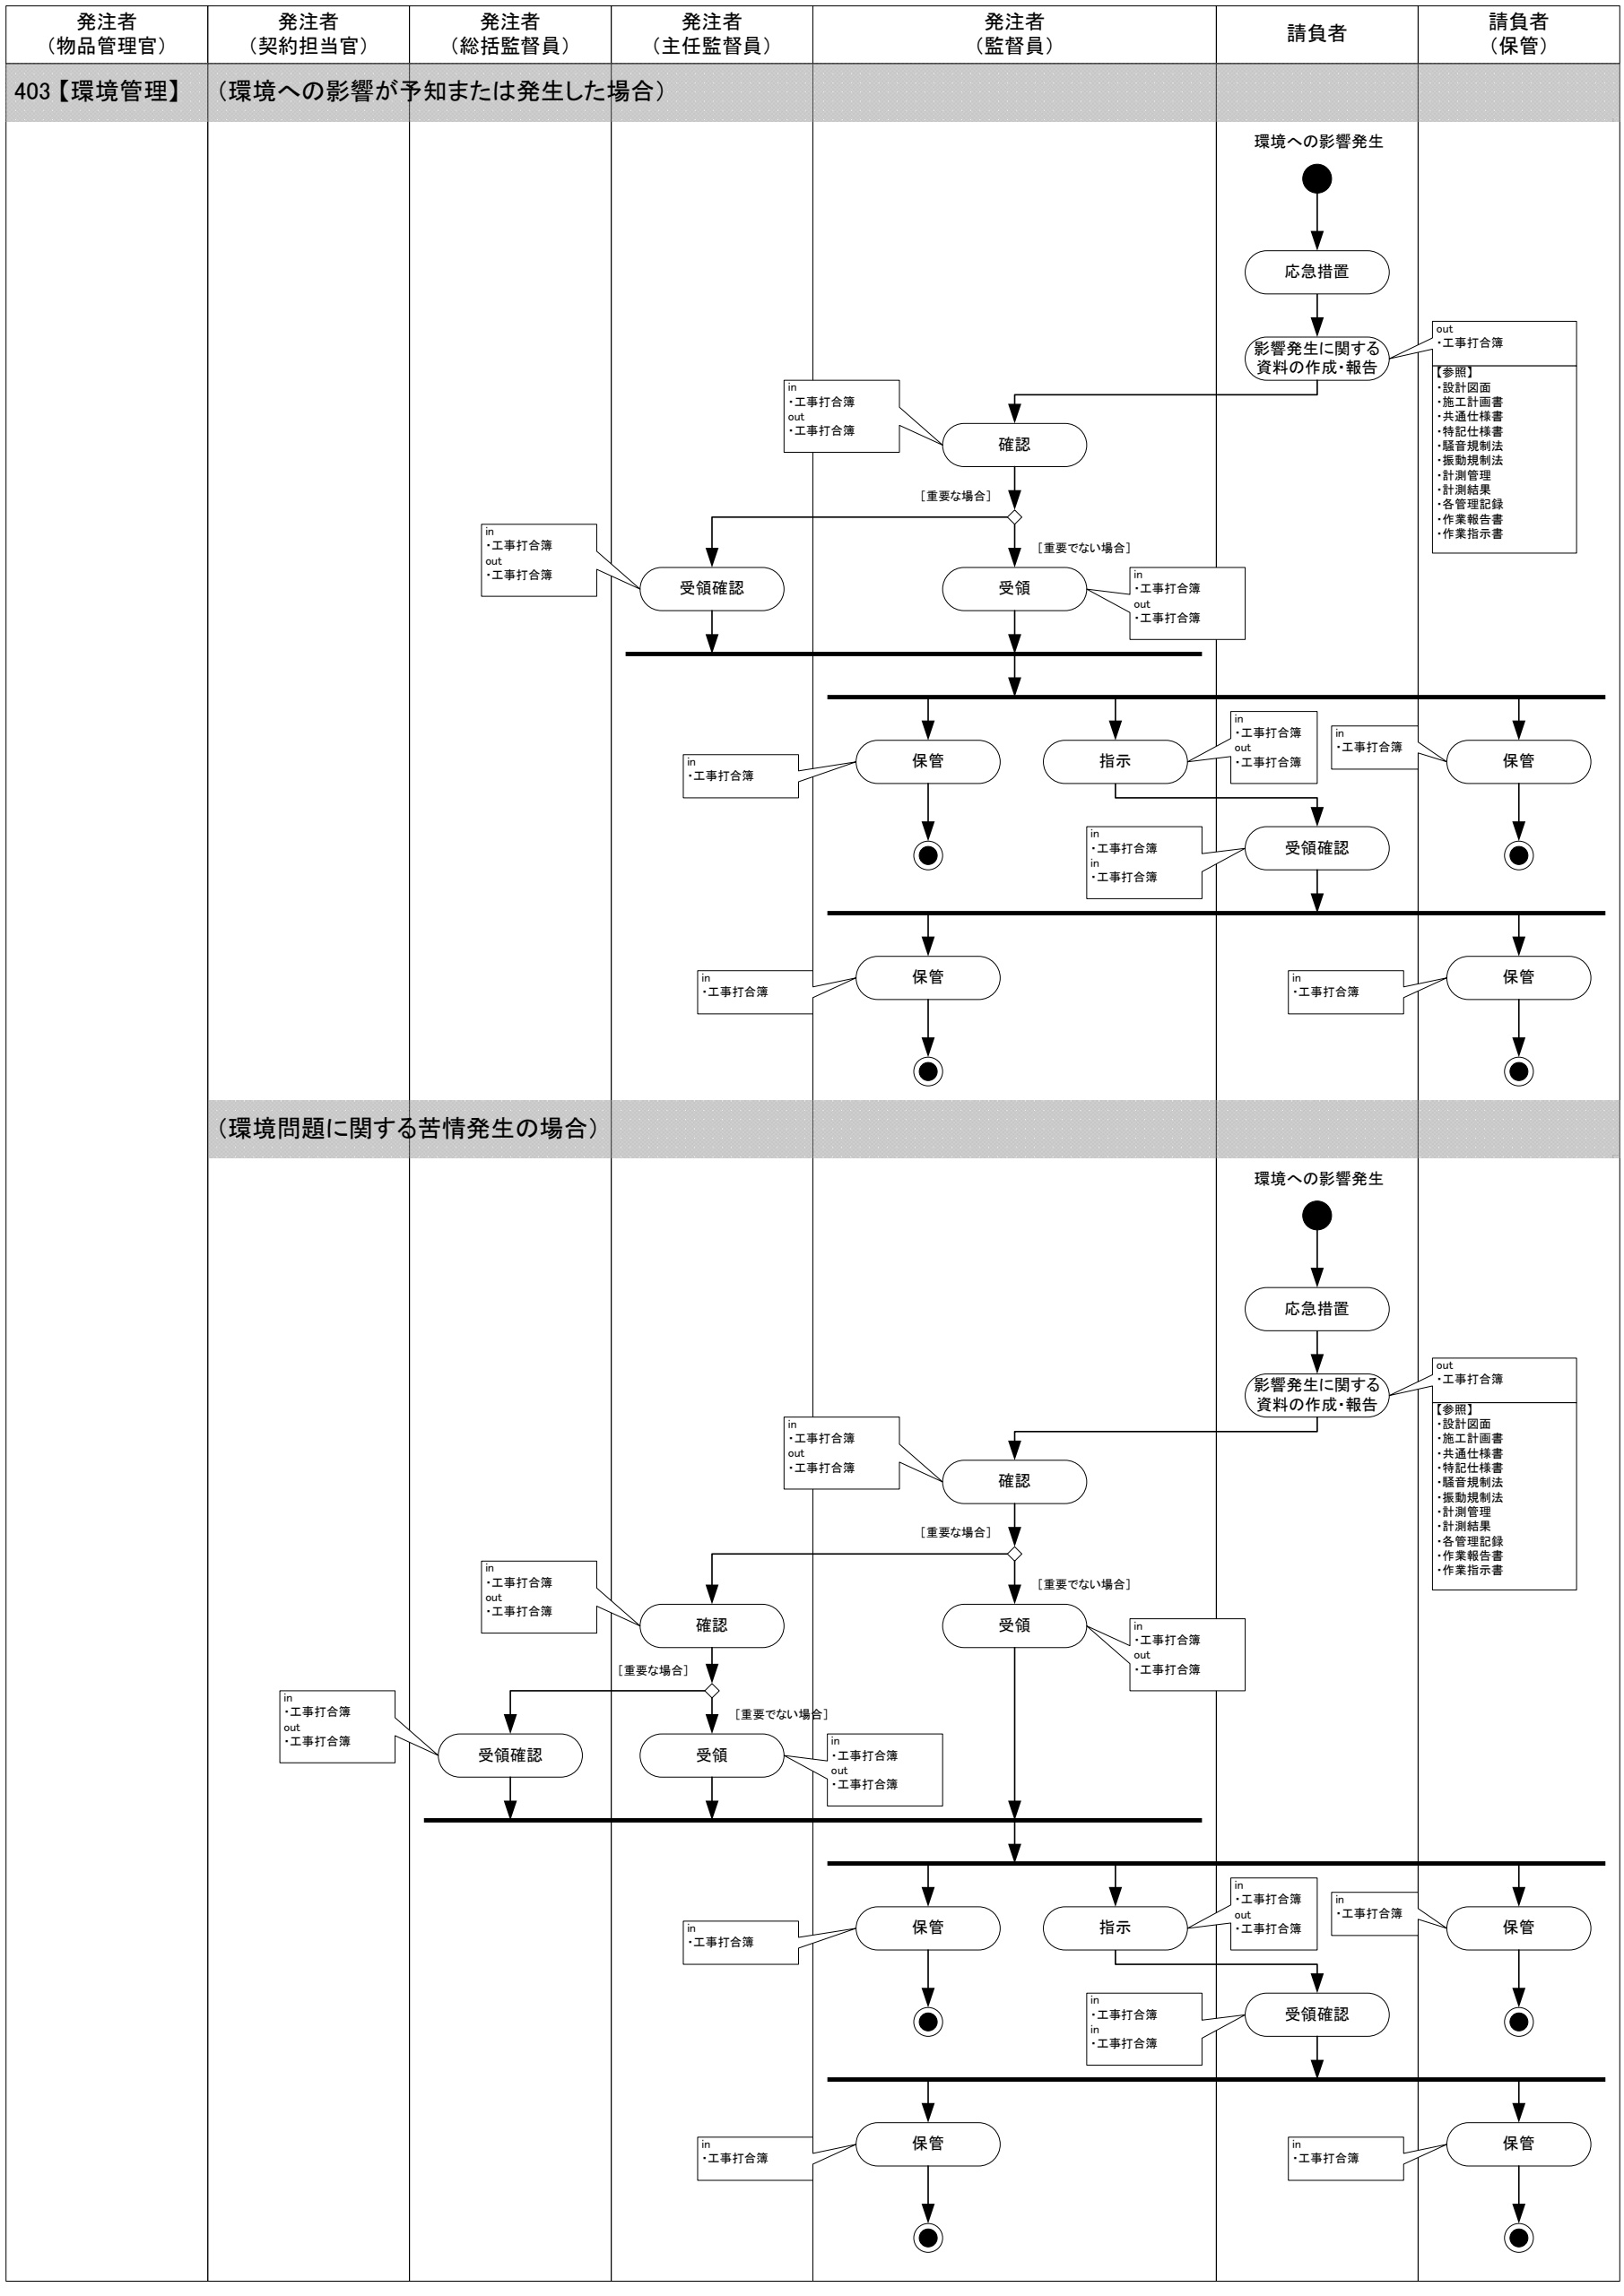

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

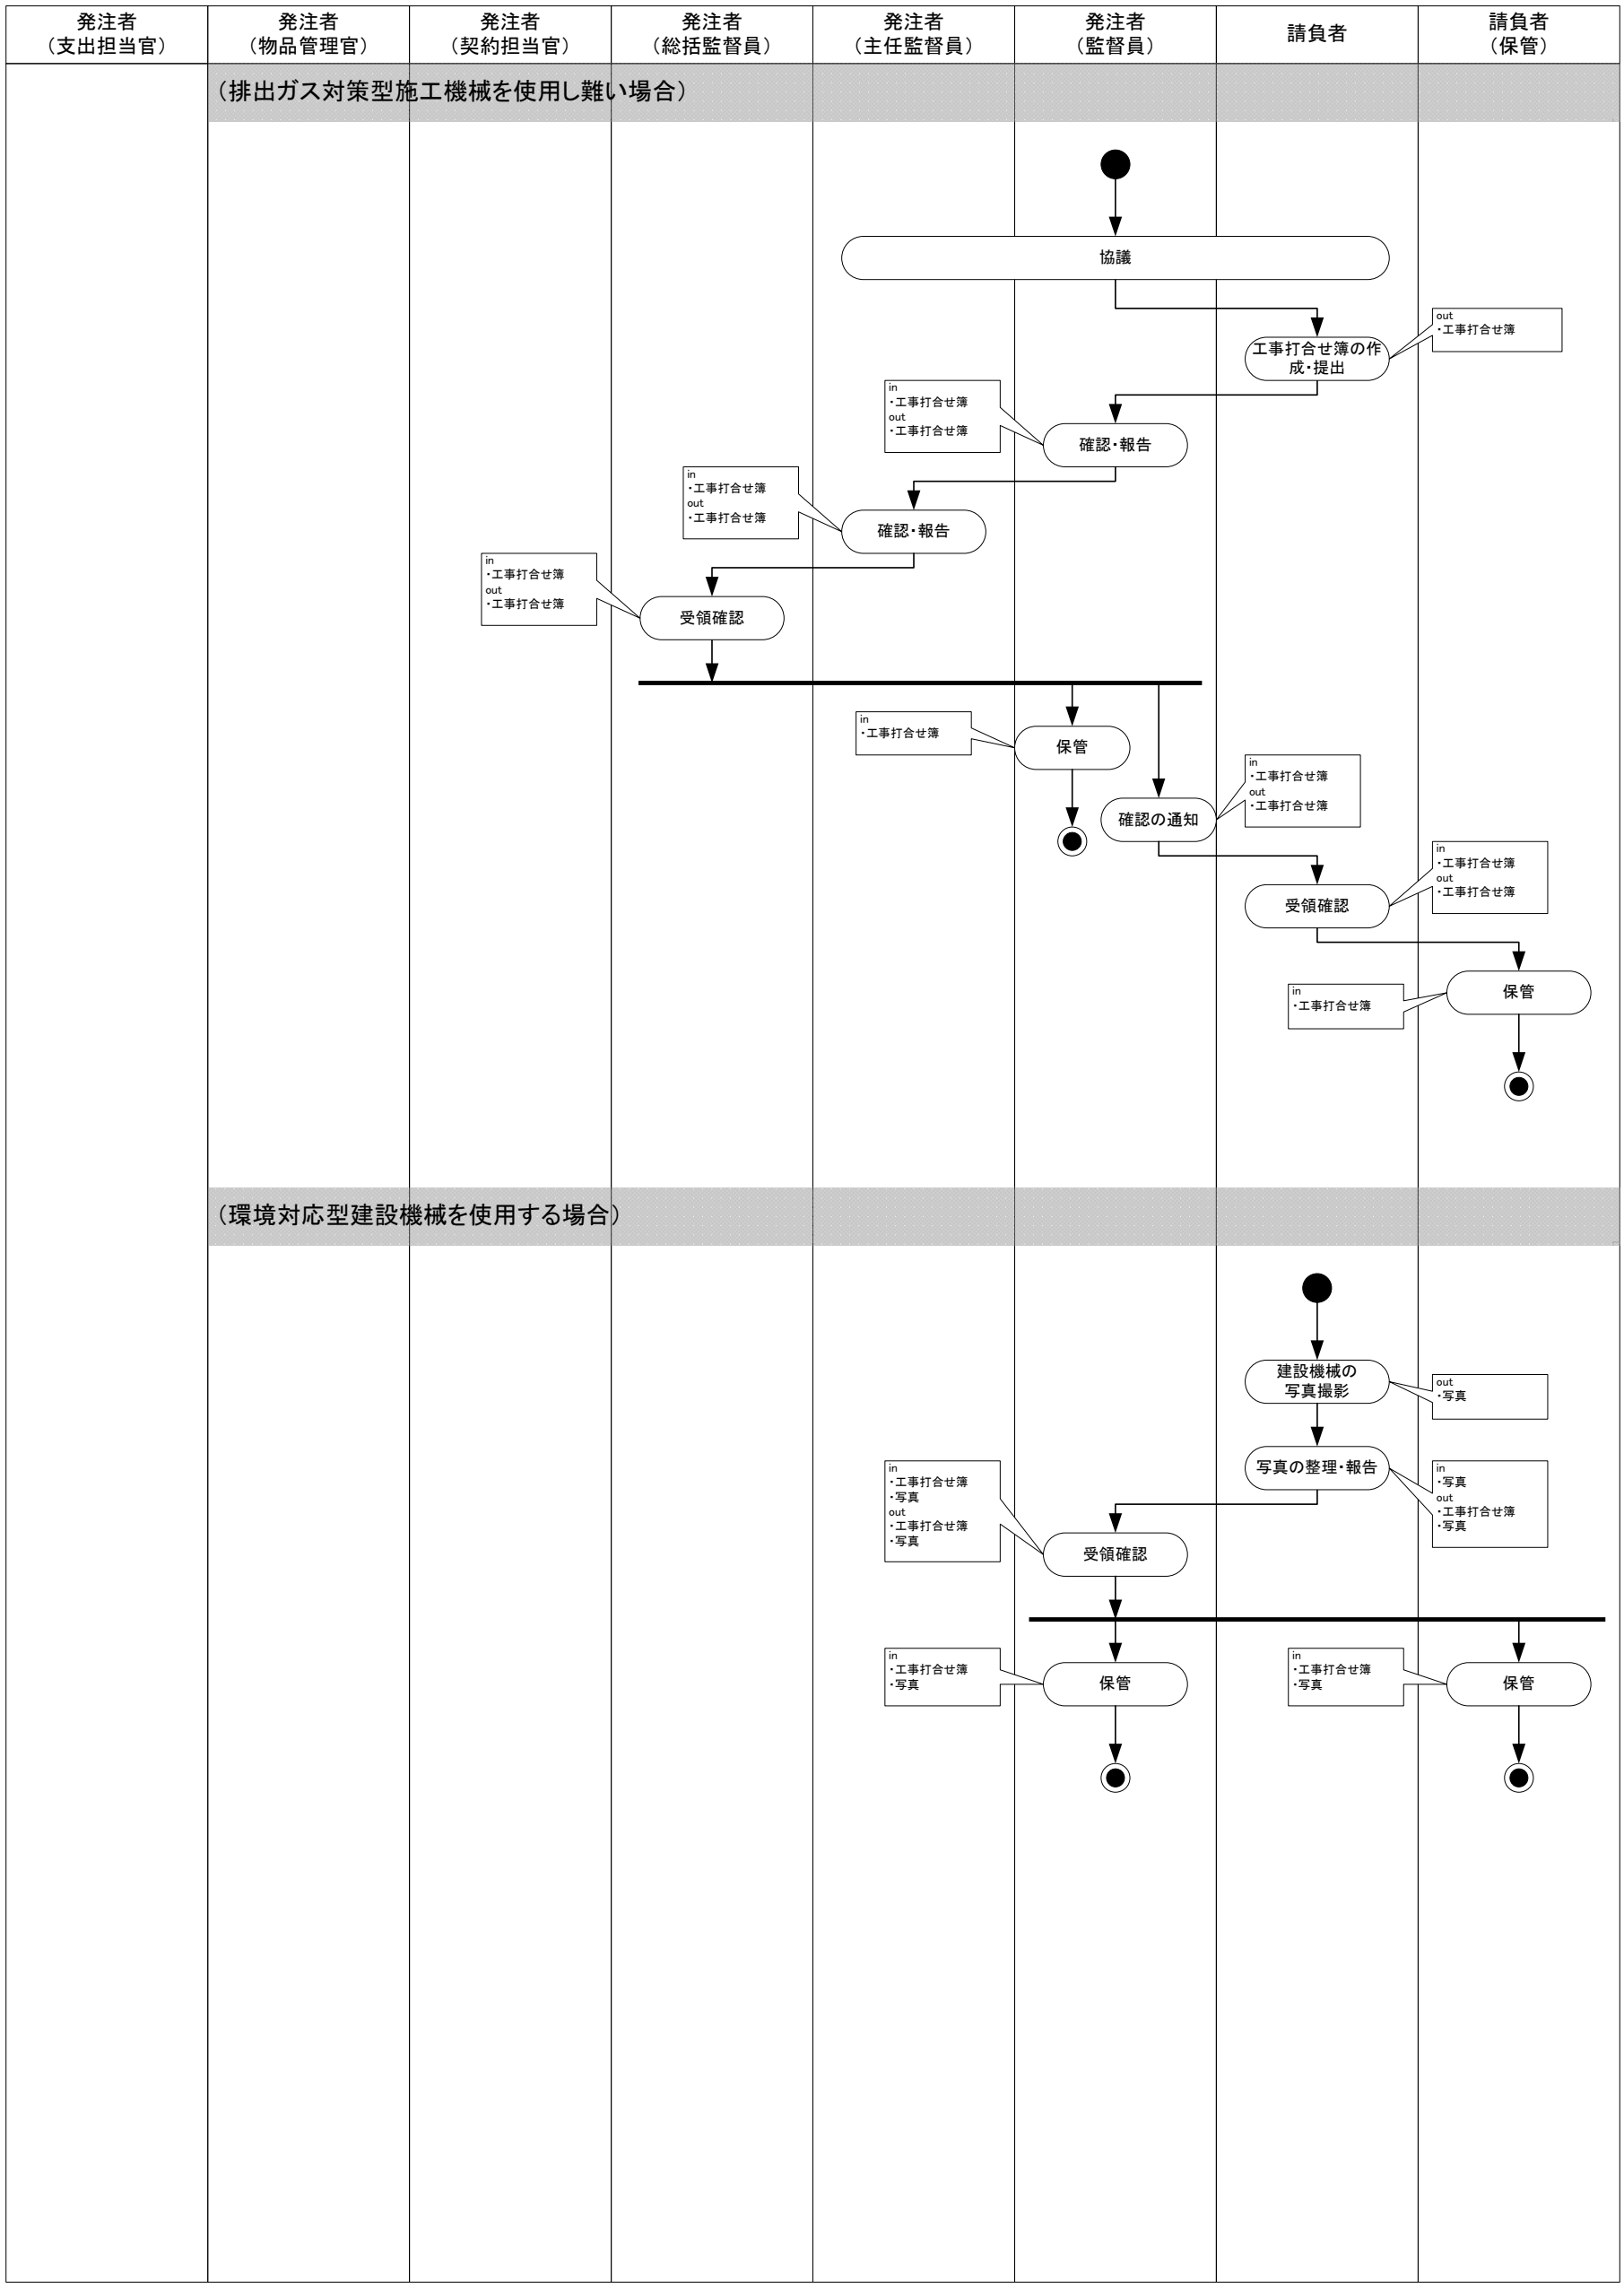

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

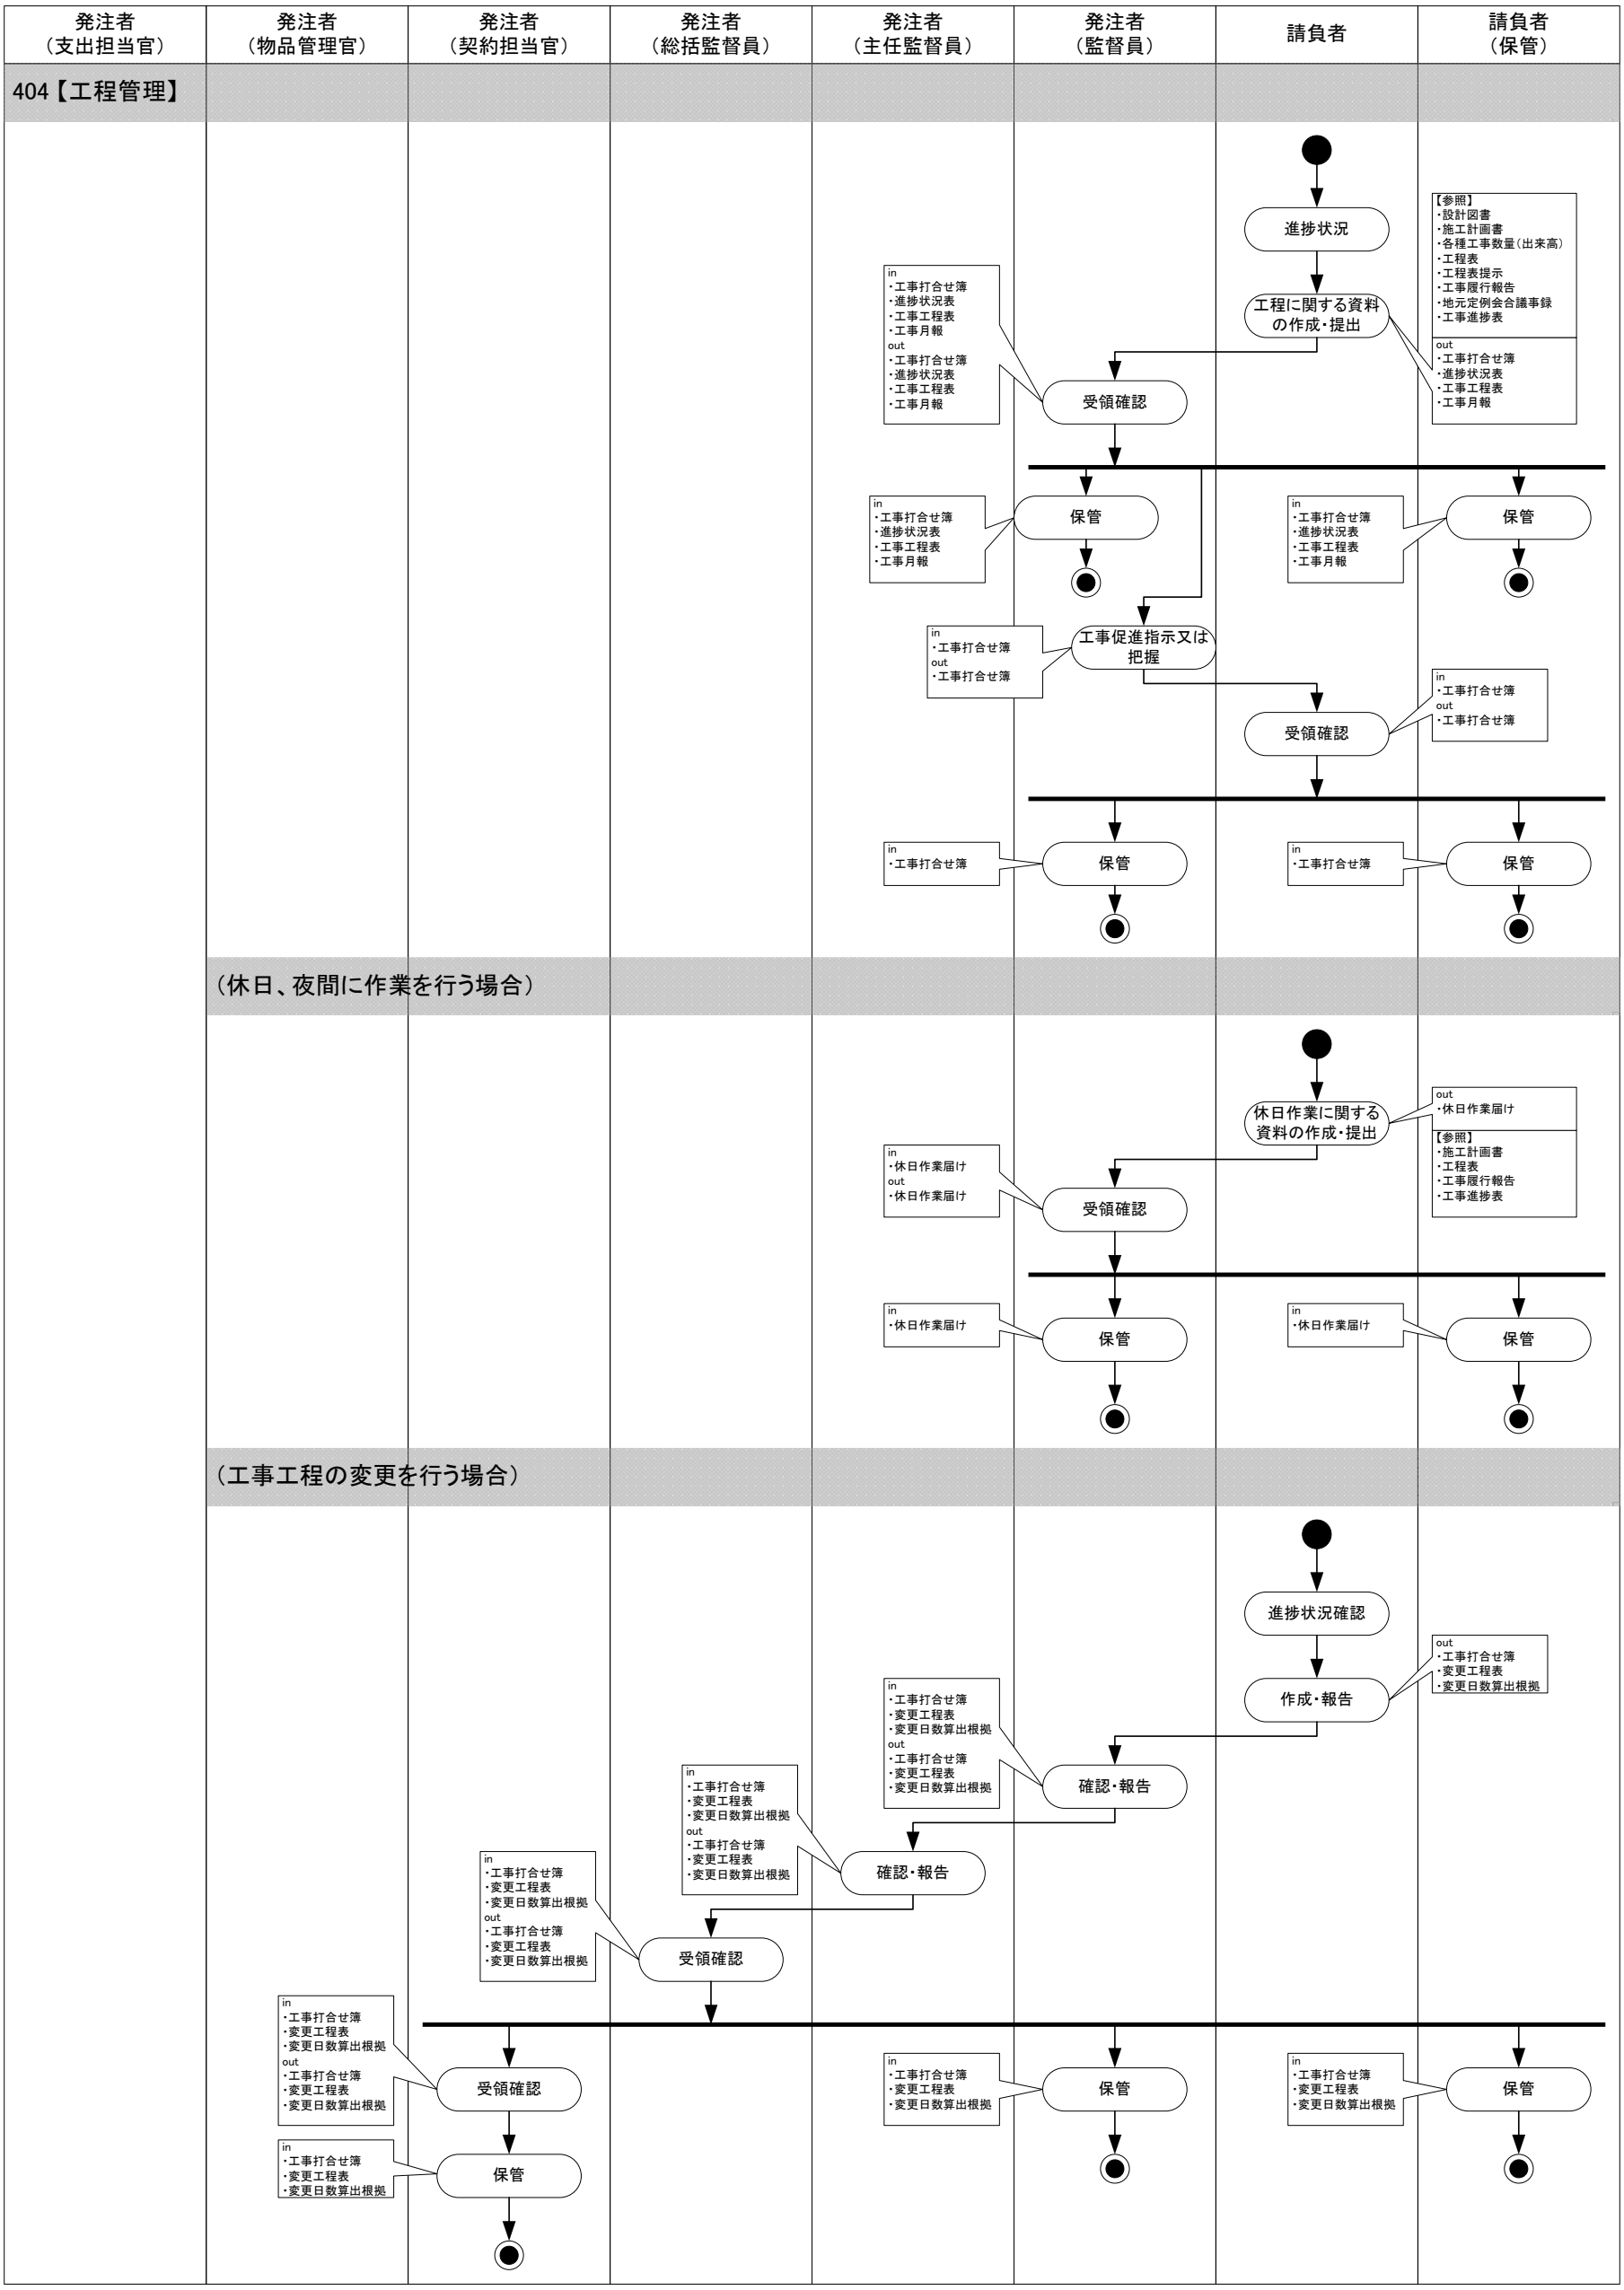

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

発注者 （支出担当官）	発注者 （物品管理官）	発注者 （契約担当官）	発注者 （総括監督員）	発注者 （主任監督員）	発注者 （監督員）	請負者	請負者 （保管）
405【品質管理】							
						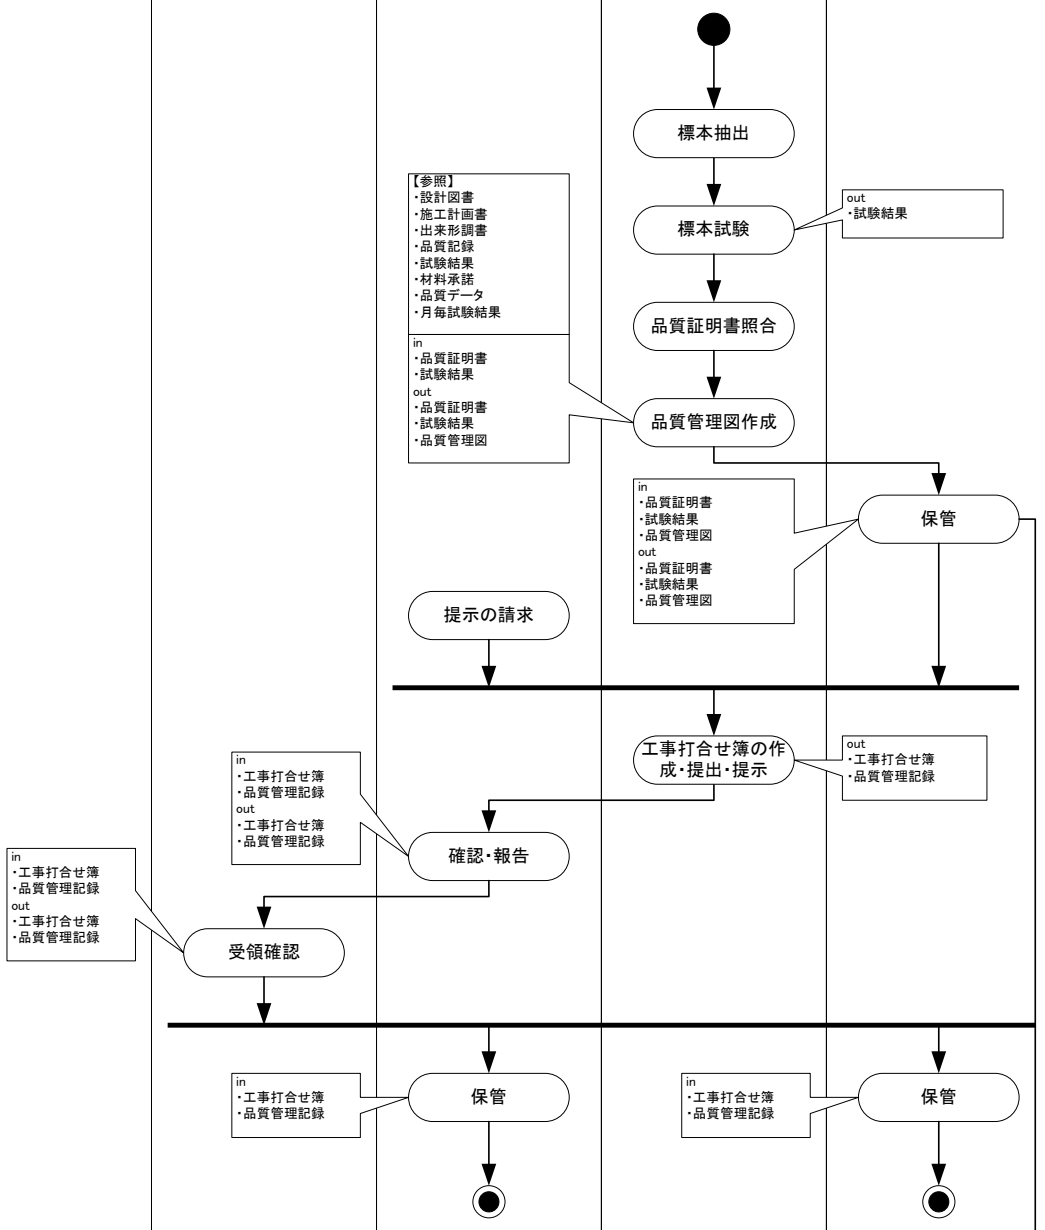	
406【品質管理-工事材料-立会「監督職員による検査（確認）及び立会等」】							
						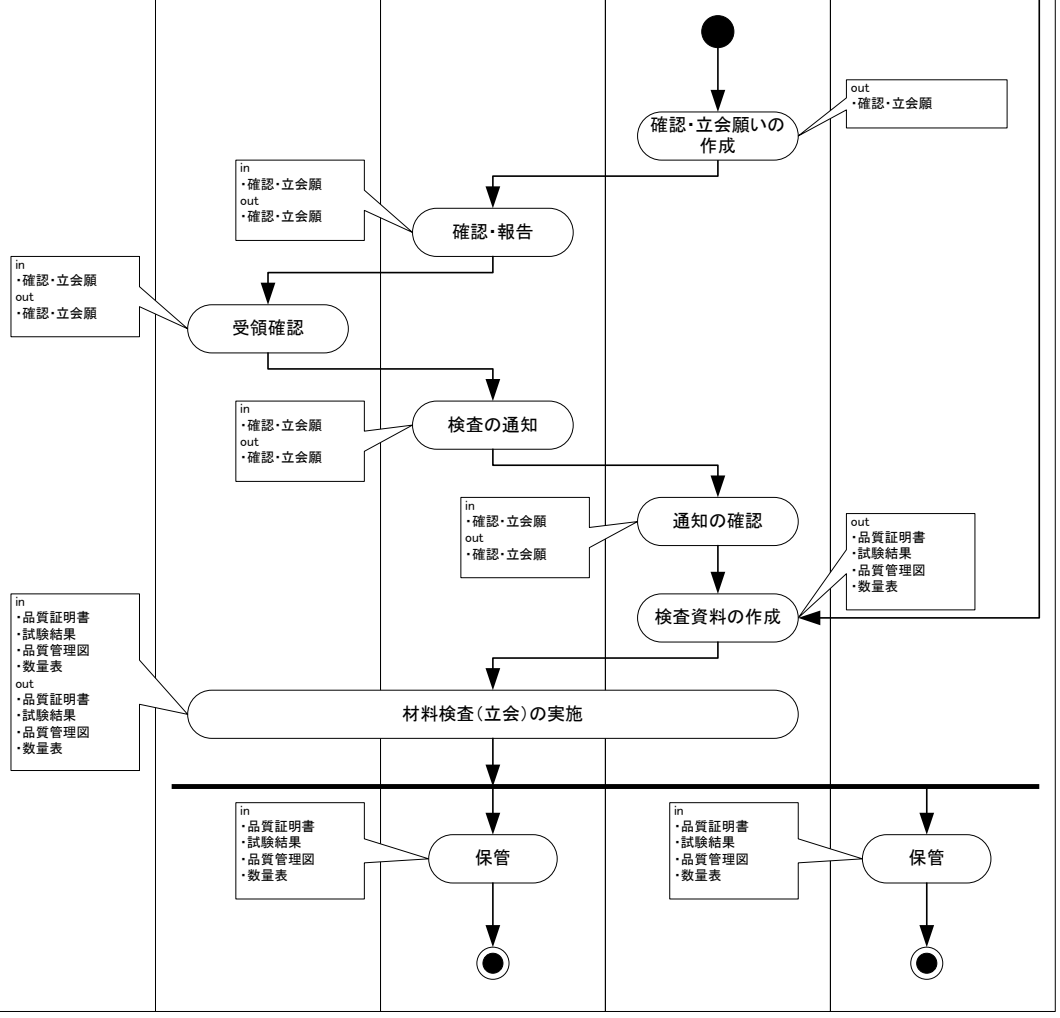	

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

発注者（支出担当官）	発注者（物品管理官）	発注者（契約担当官）	発注者（総括監督員）	発注者（主任監督員）	発注者（監督員）	請負者	請負者（保管）
407【出来形管理】							
						検測・写真撮影 出来形に関する資料作成 提示の請求 工事打合せ簿の作成・提出・提示 確認・報告 受領確認 保管 保管	【参照】 ・施工管理要領 ・特記仕様書 ・基本計画書 ・出来形管理計画書 ・設計図書 ・管理位置図 ・基準値 ・社内規格値 ・出来形測量結果 ・異常値のﾁｪｯｸﾘｽﾄ out ・検測結果 ・出来形写真 保管 out ・工事打合せ簿 ・出来形管理記録 保管
408【出来形管理−段階確認「監督職員による検査（確認）及び立会等」】							
						確認・立会願いの作成 確認・報告 受領確認 検査の通知 通知の確認 検査資料の作成 検査（立会）の実施 承諾・確認 承諾・確認 通知 保管 受領確認 保管	out ・段階確認書 out ・出来形管理図 ・出来形管理表 ・測定結果一覧表 in ・段階確認書 out ・段階確認書 in ・段階確認書 out ・段階確認書 in ・段階確認書

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

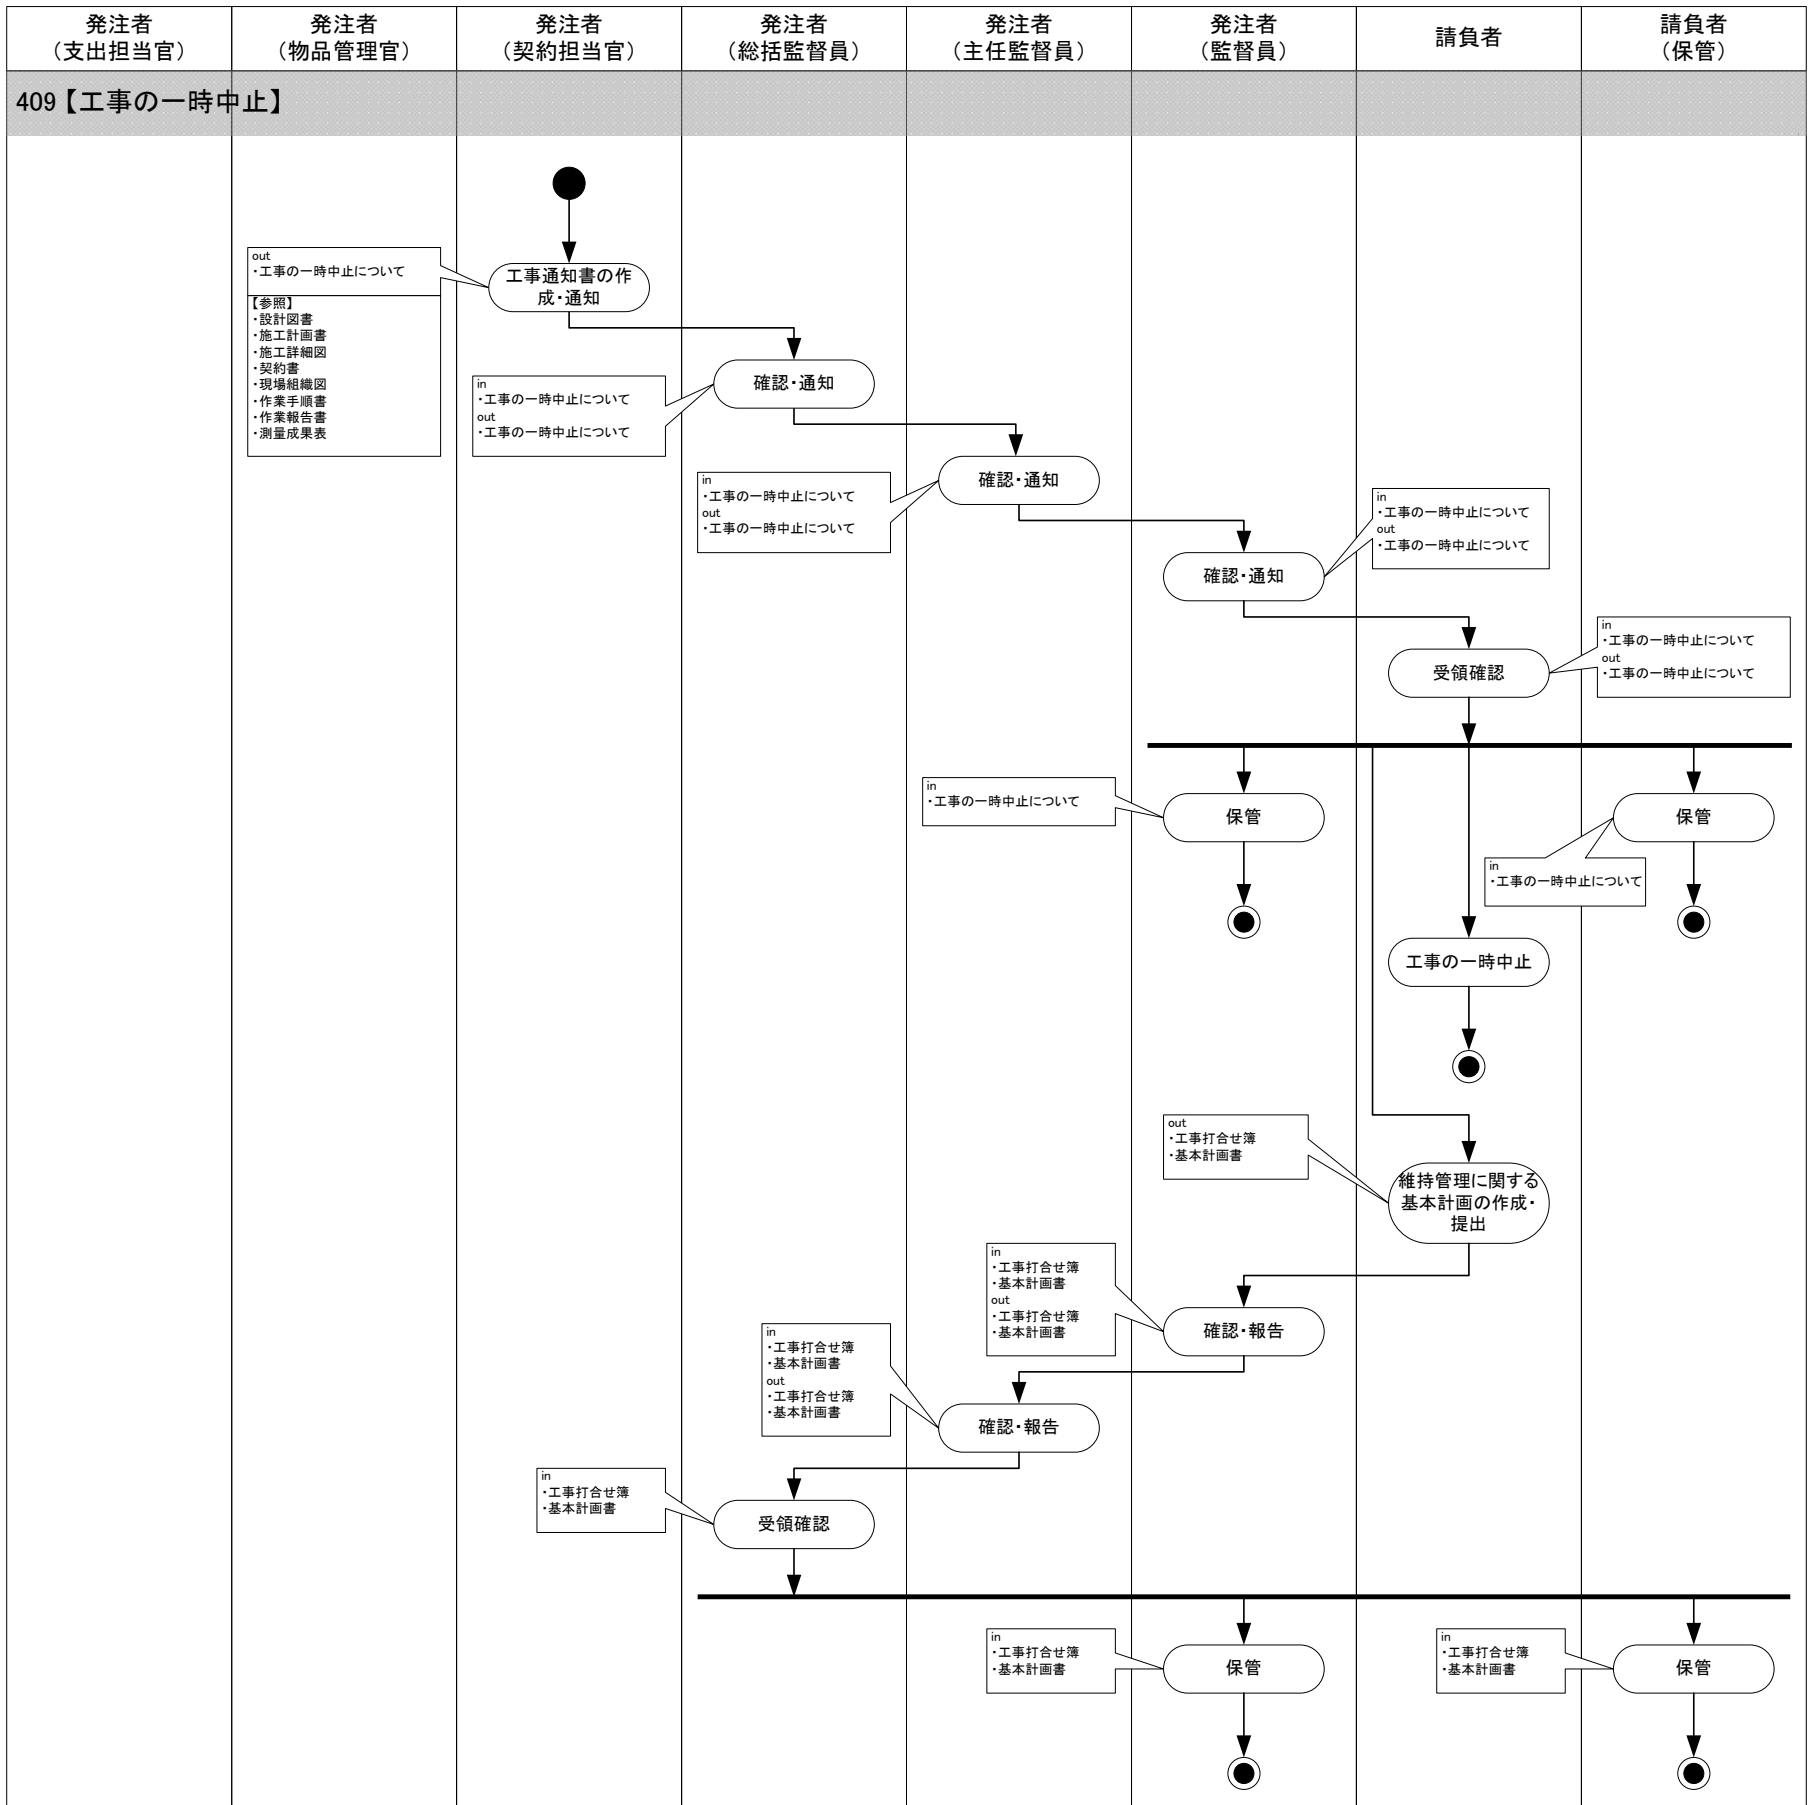

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

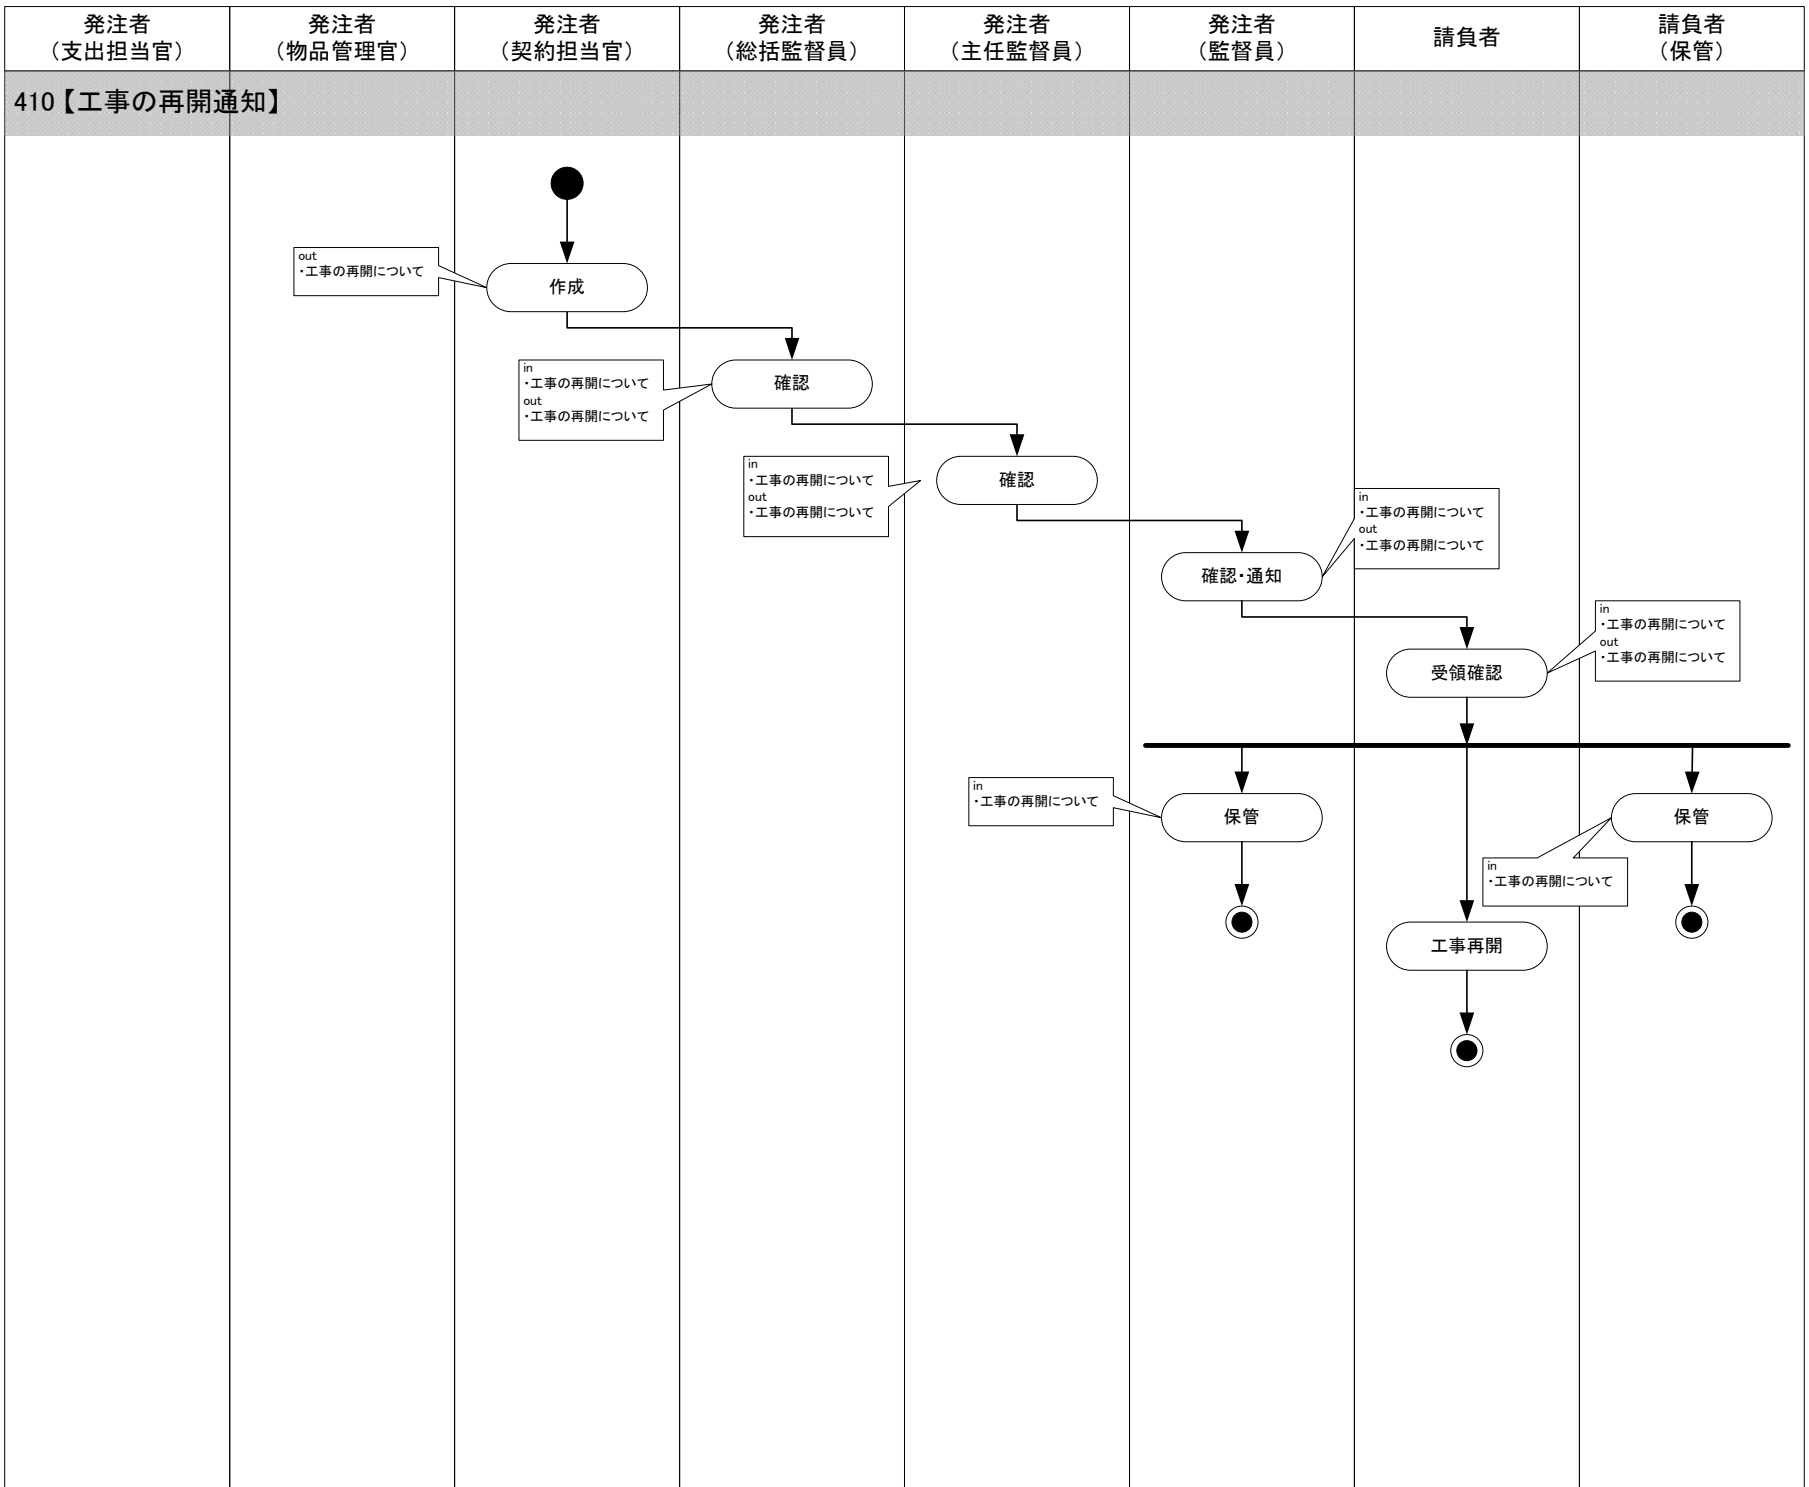

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

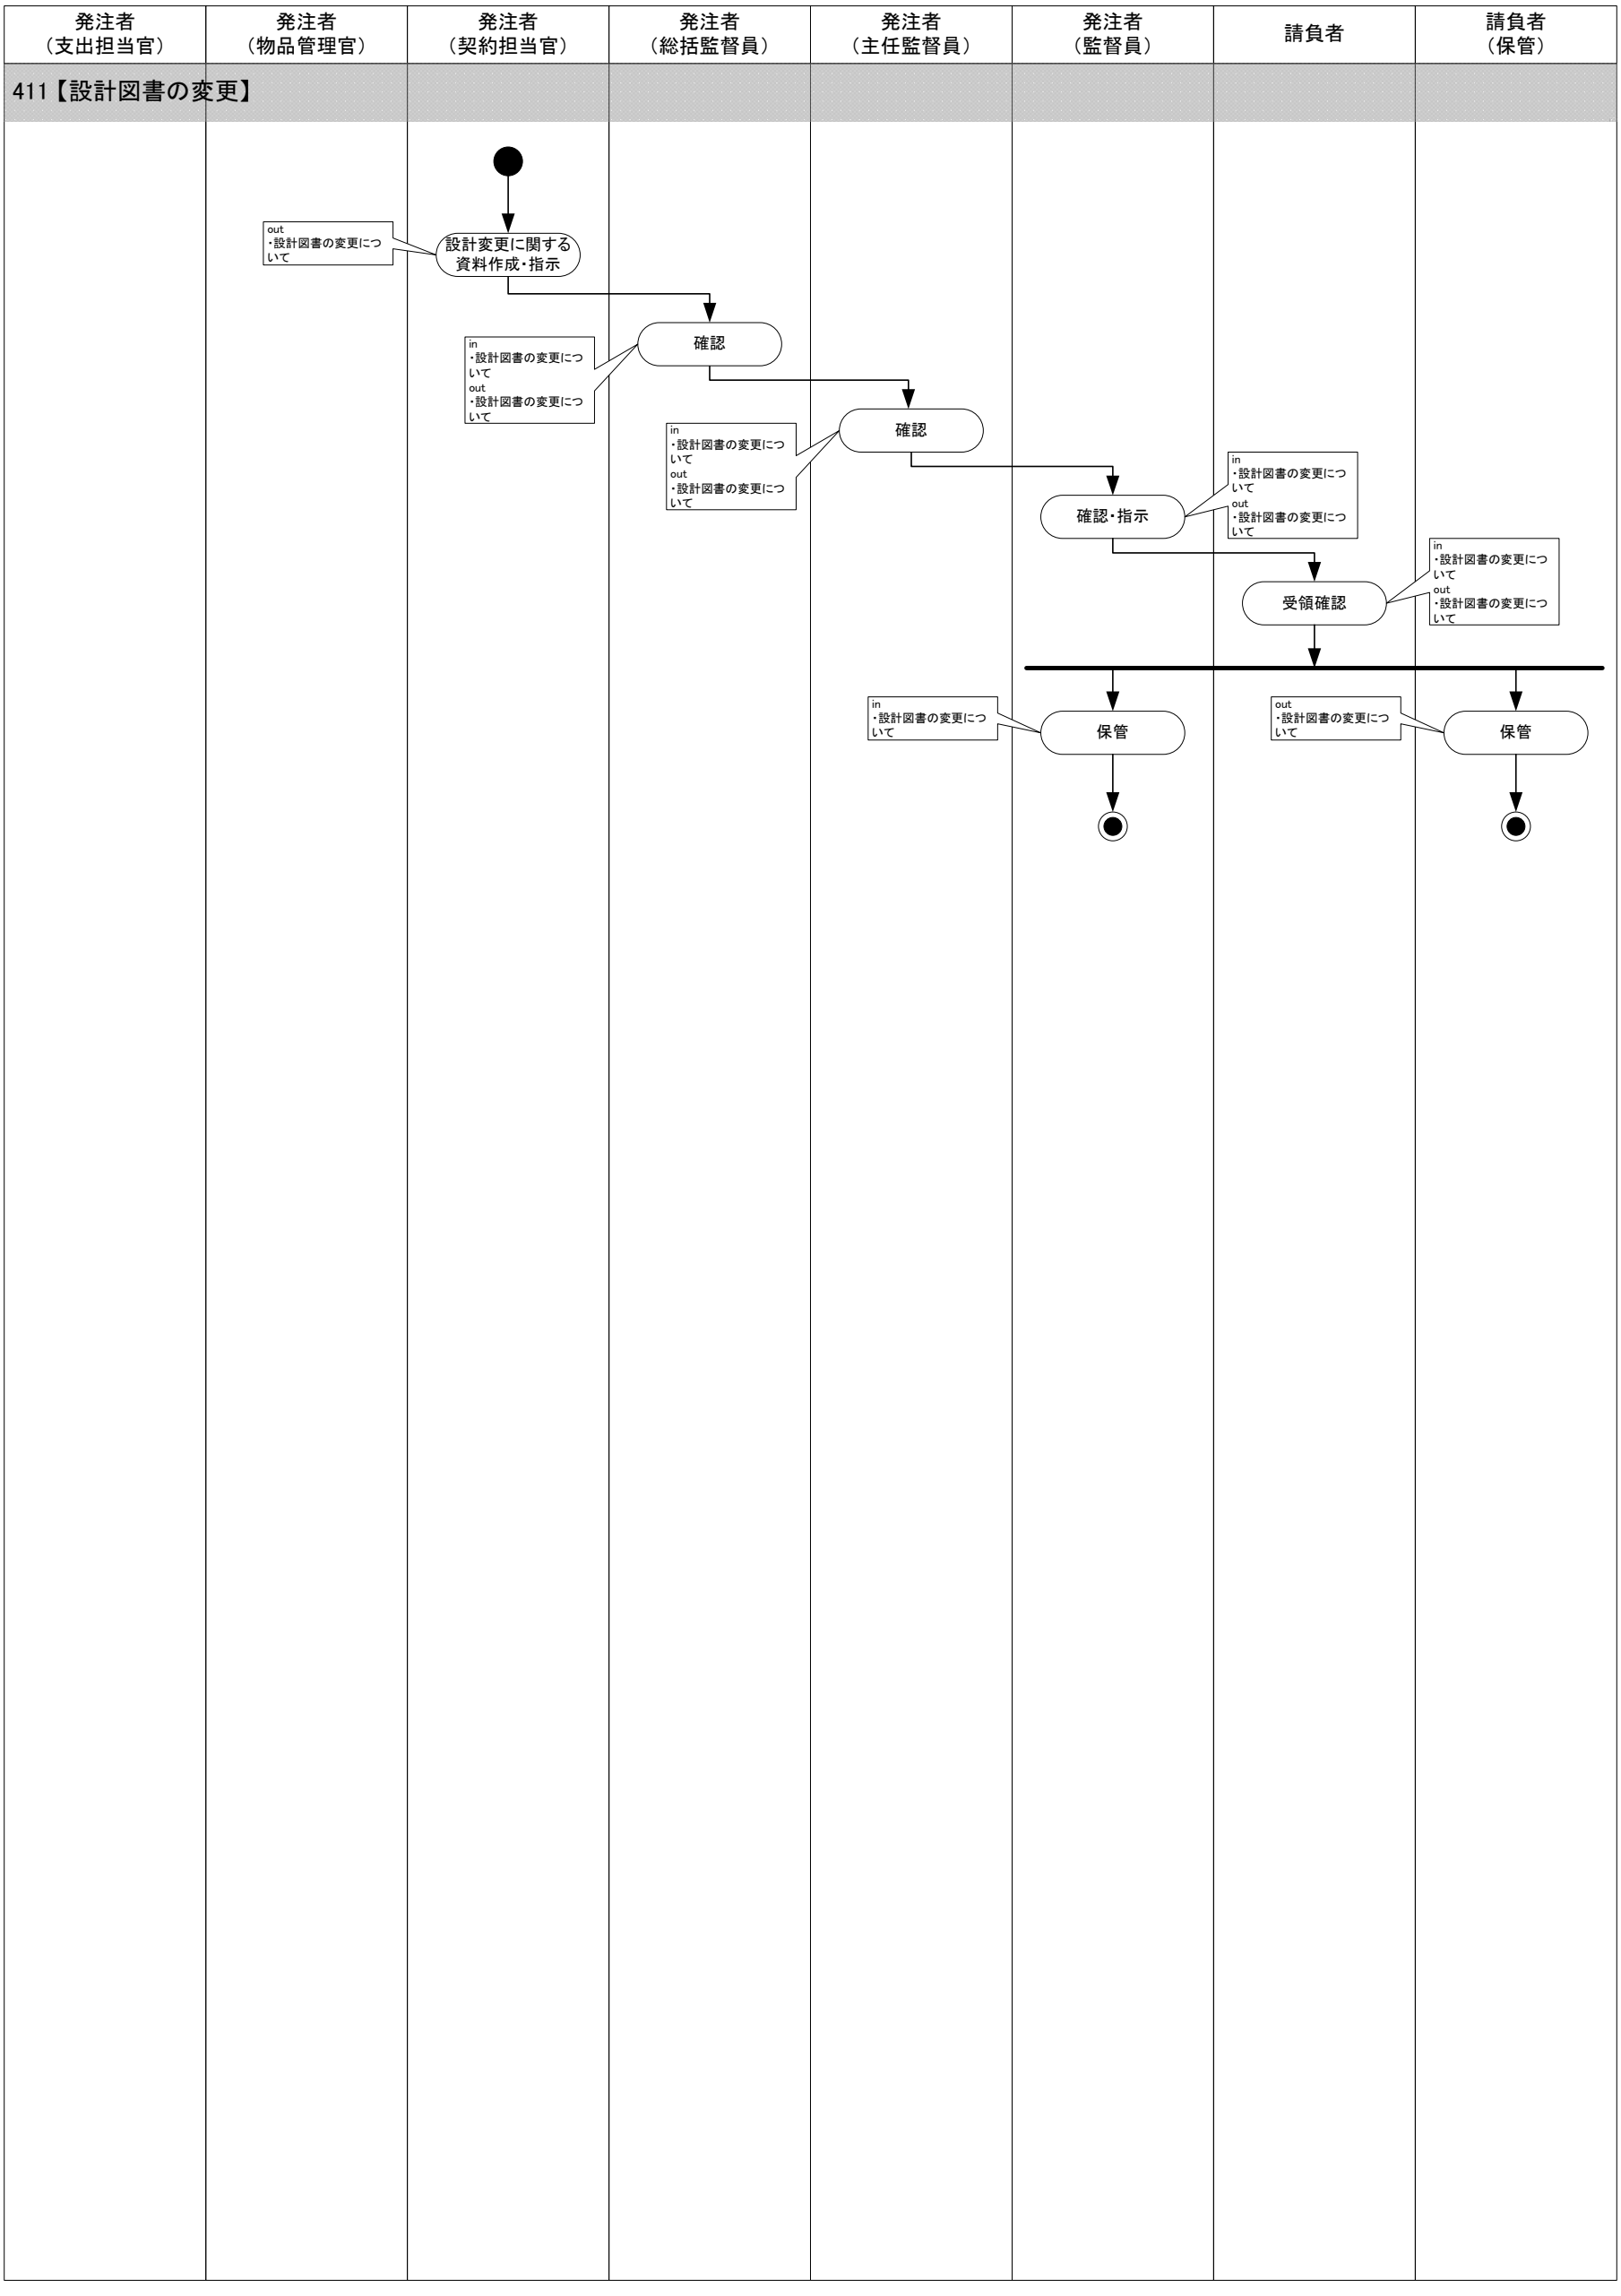

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

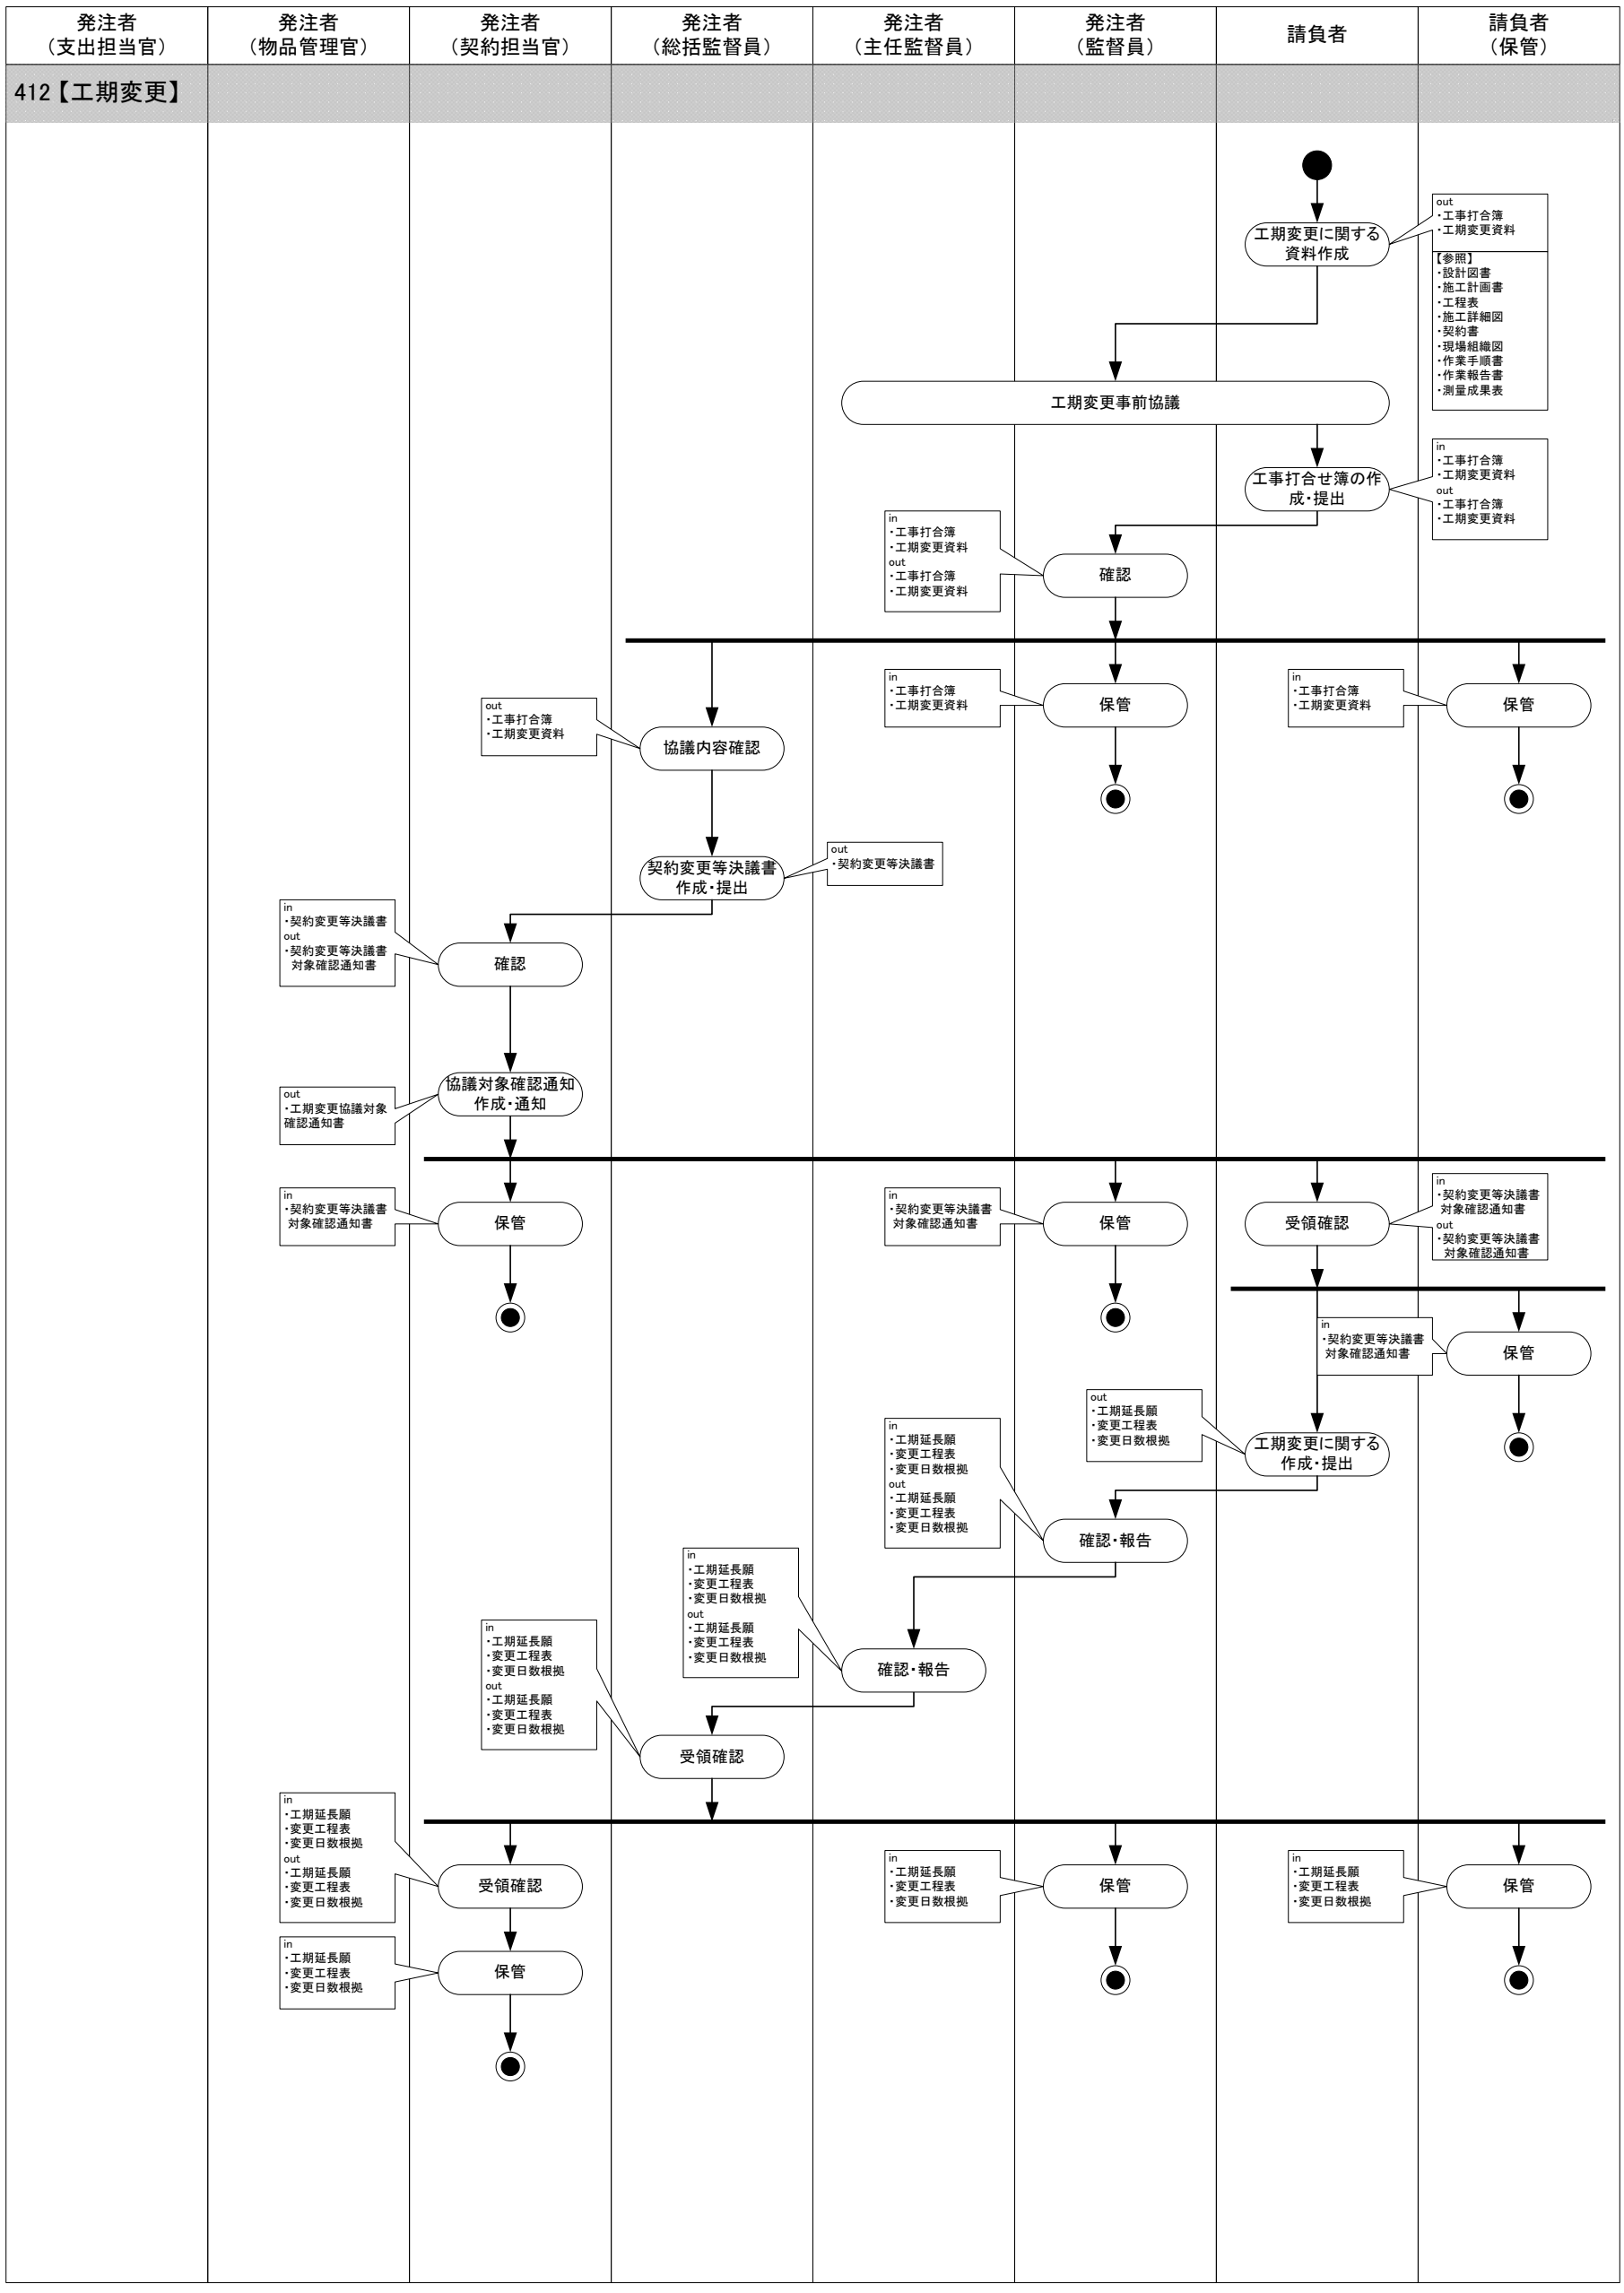

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

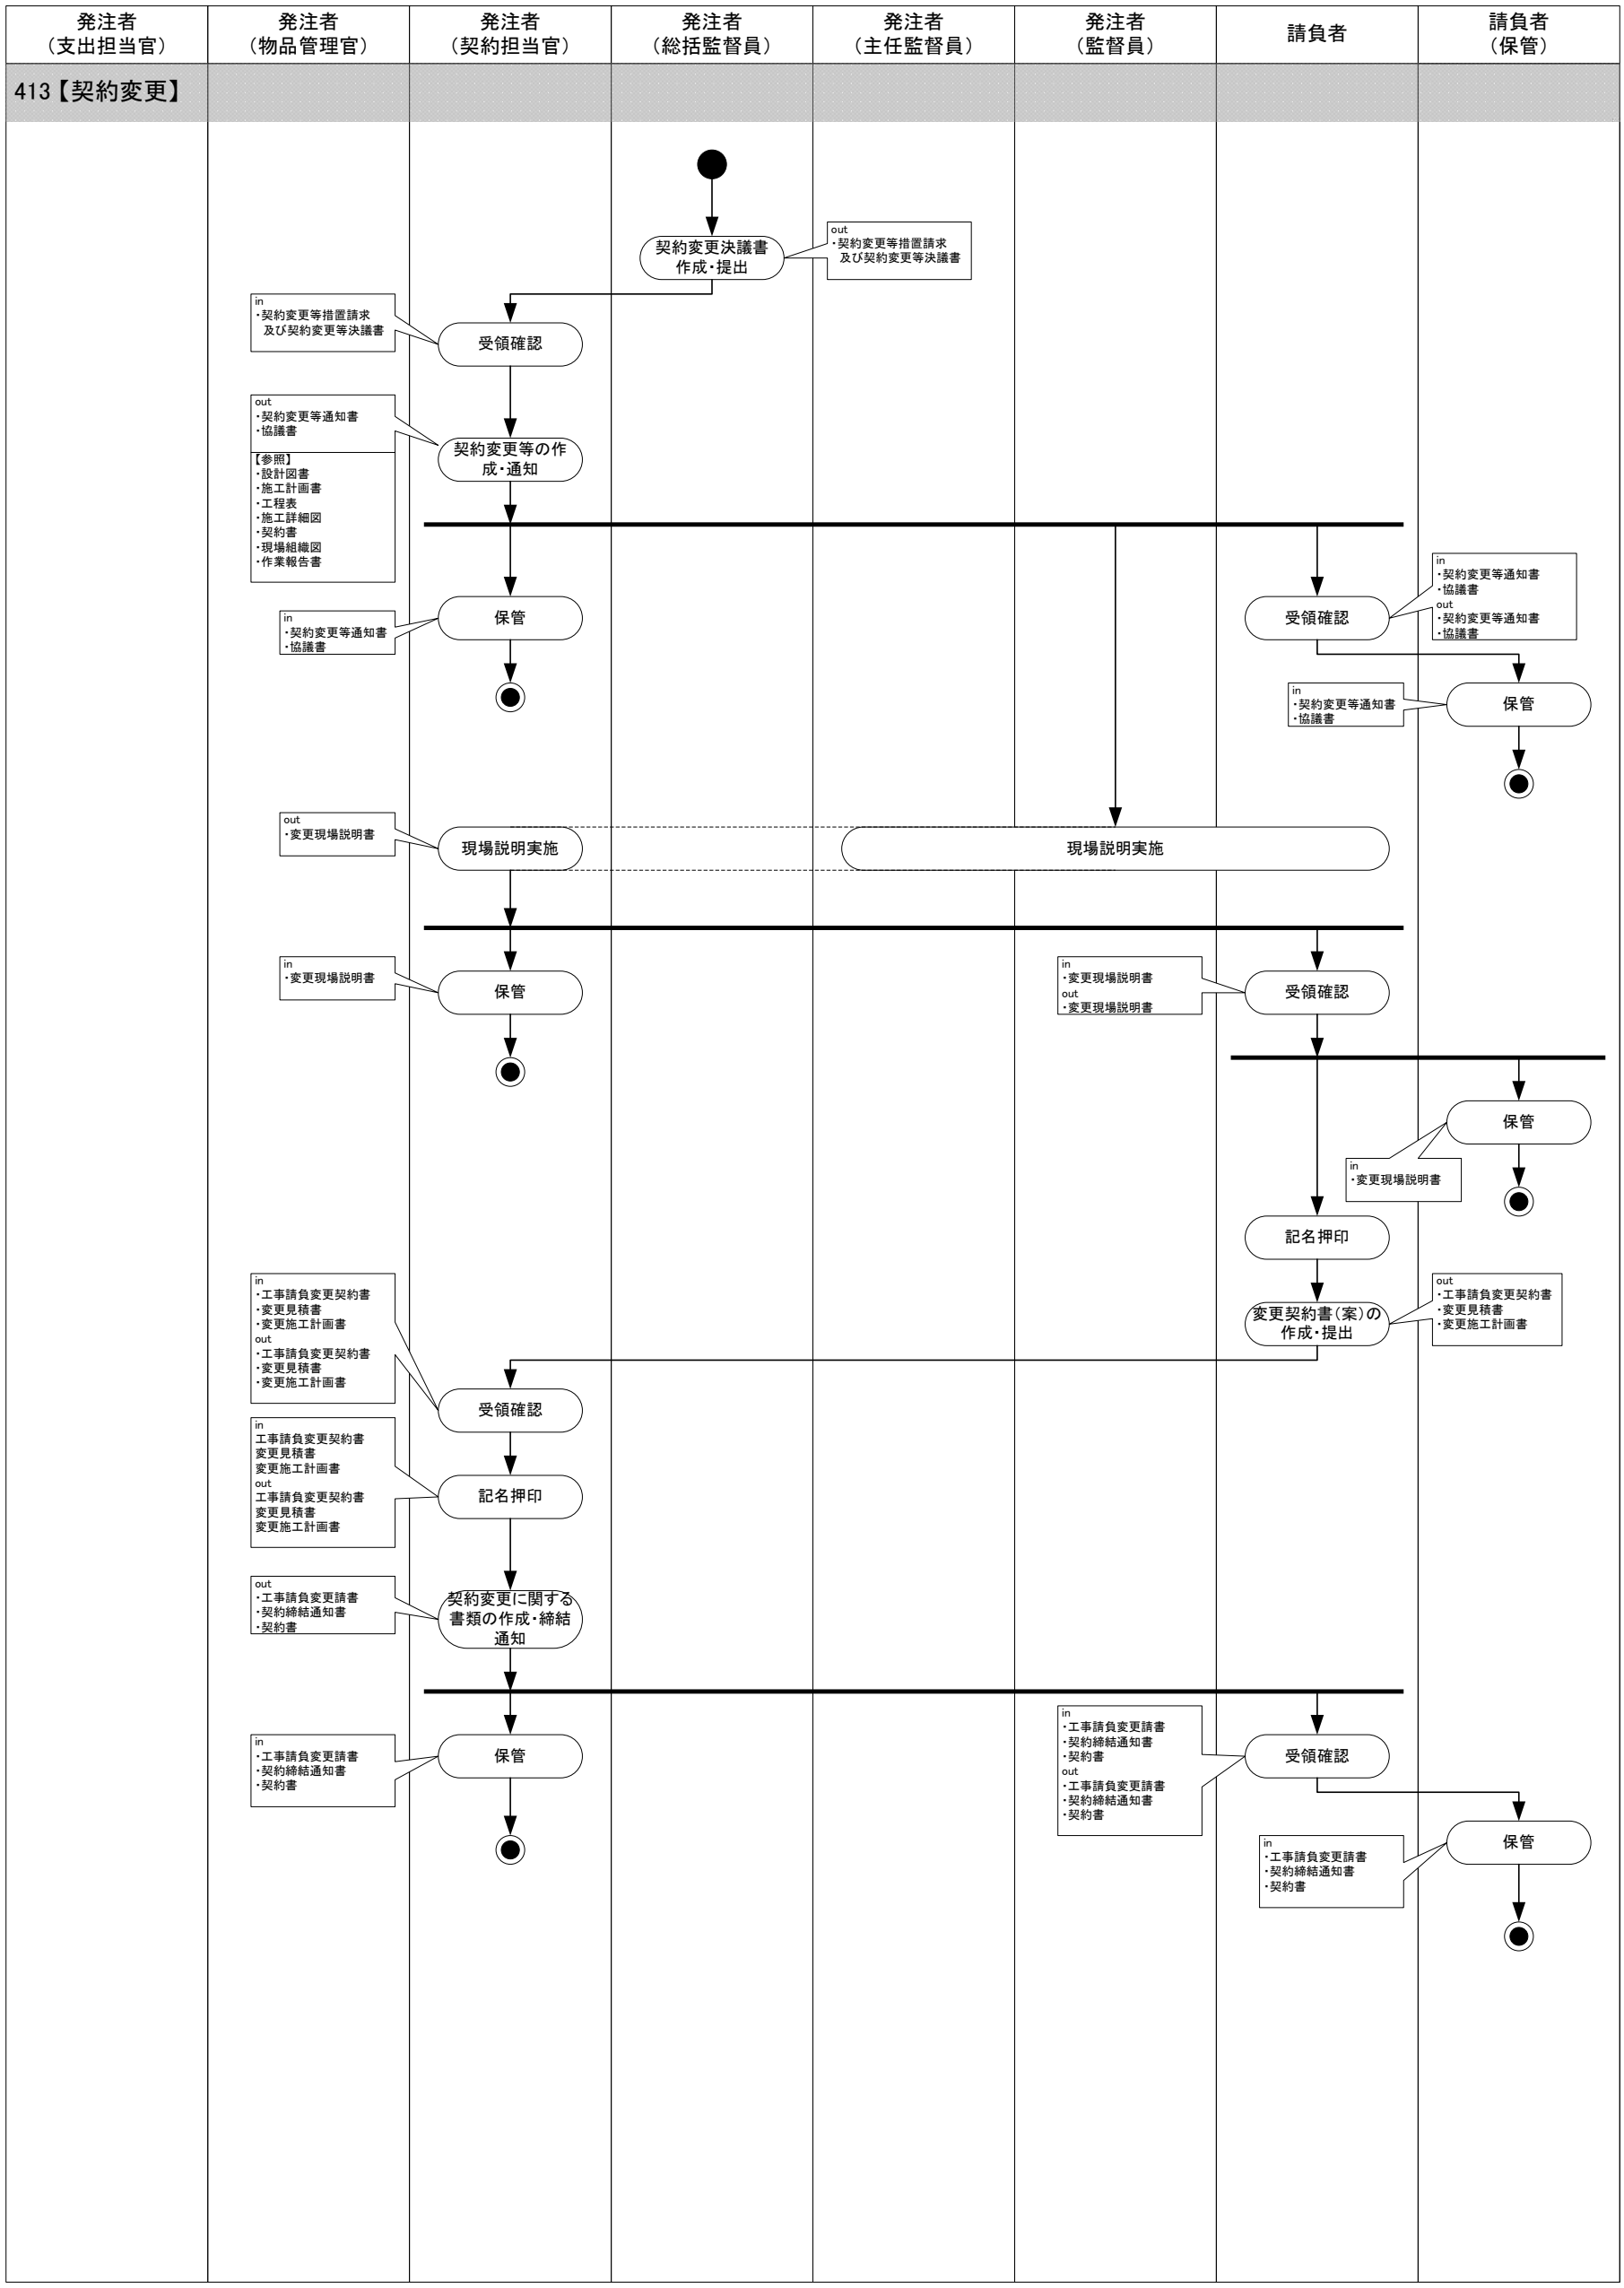

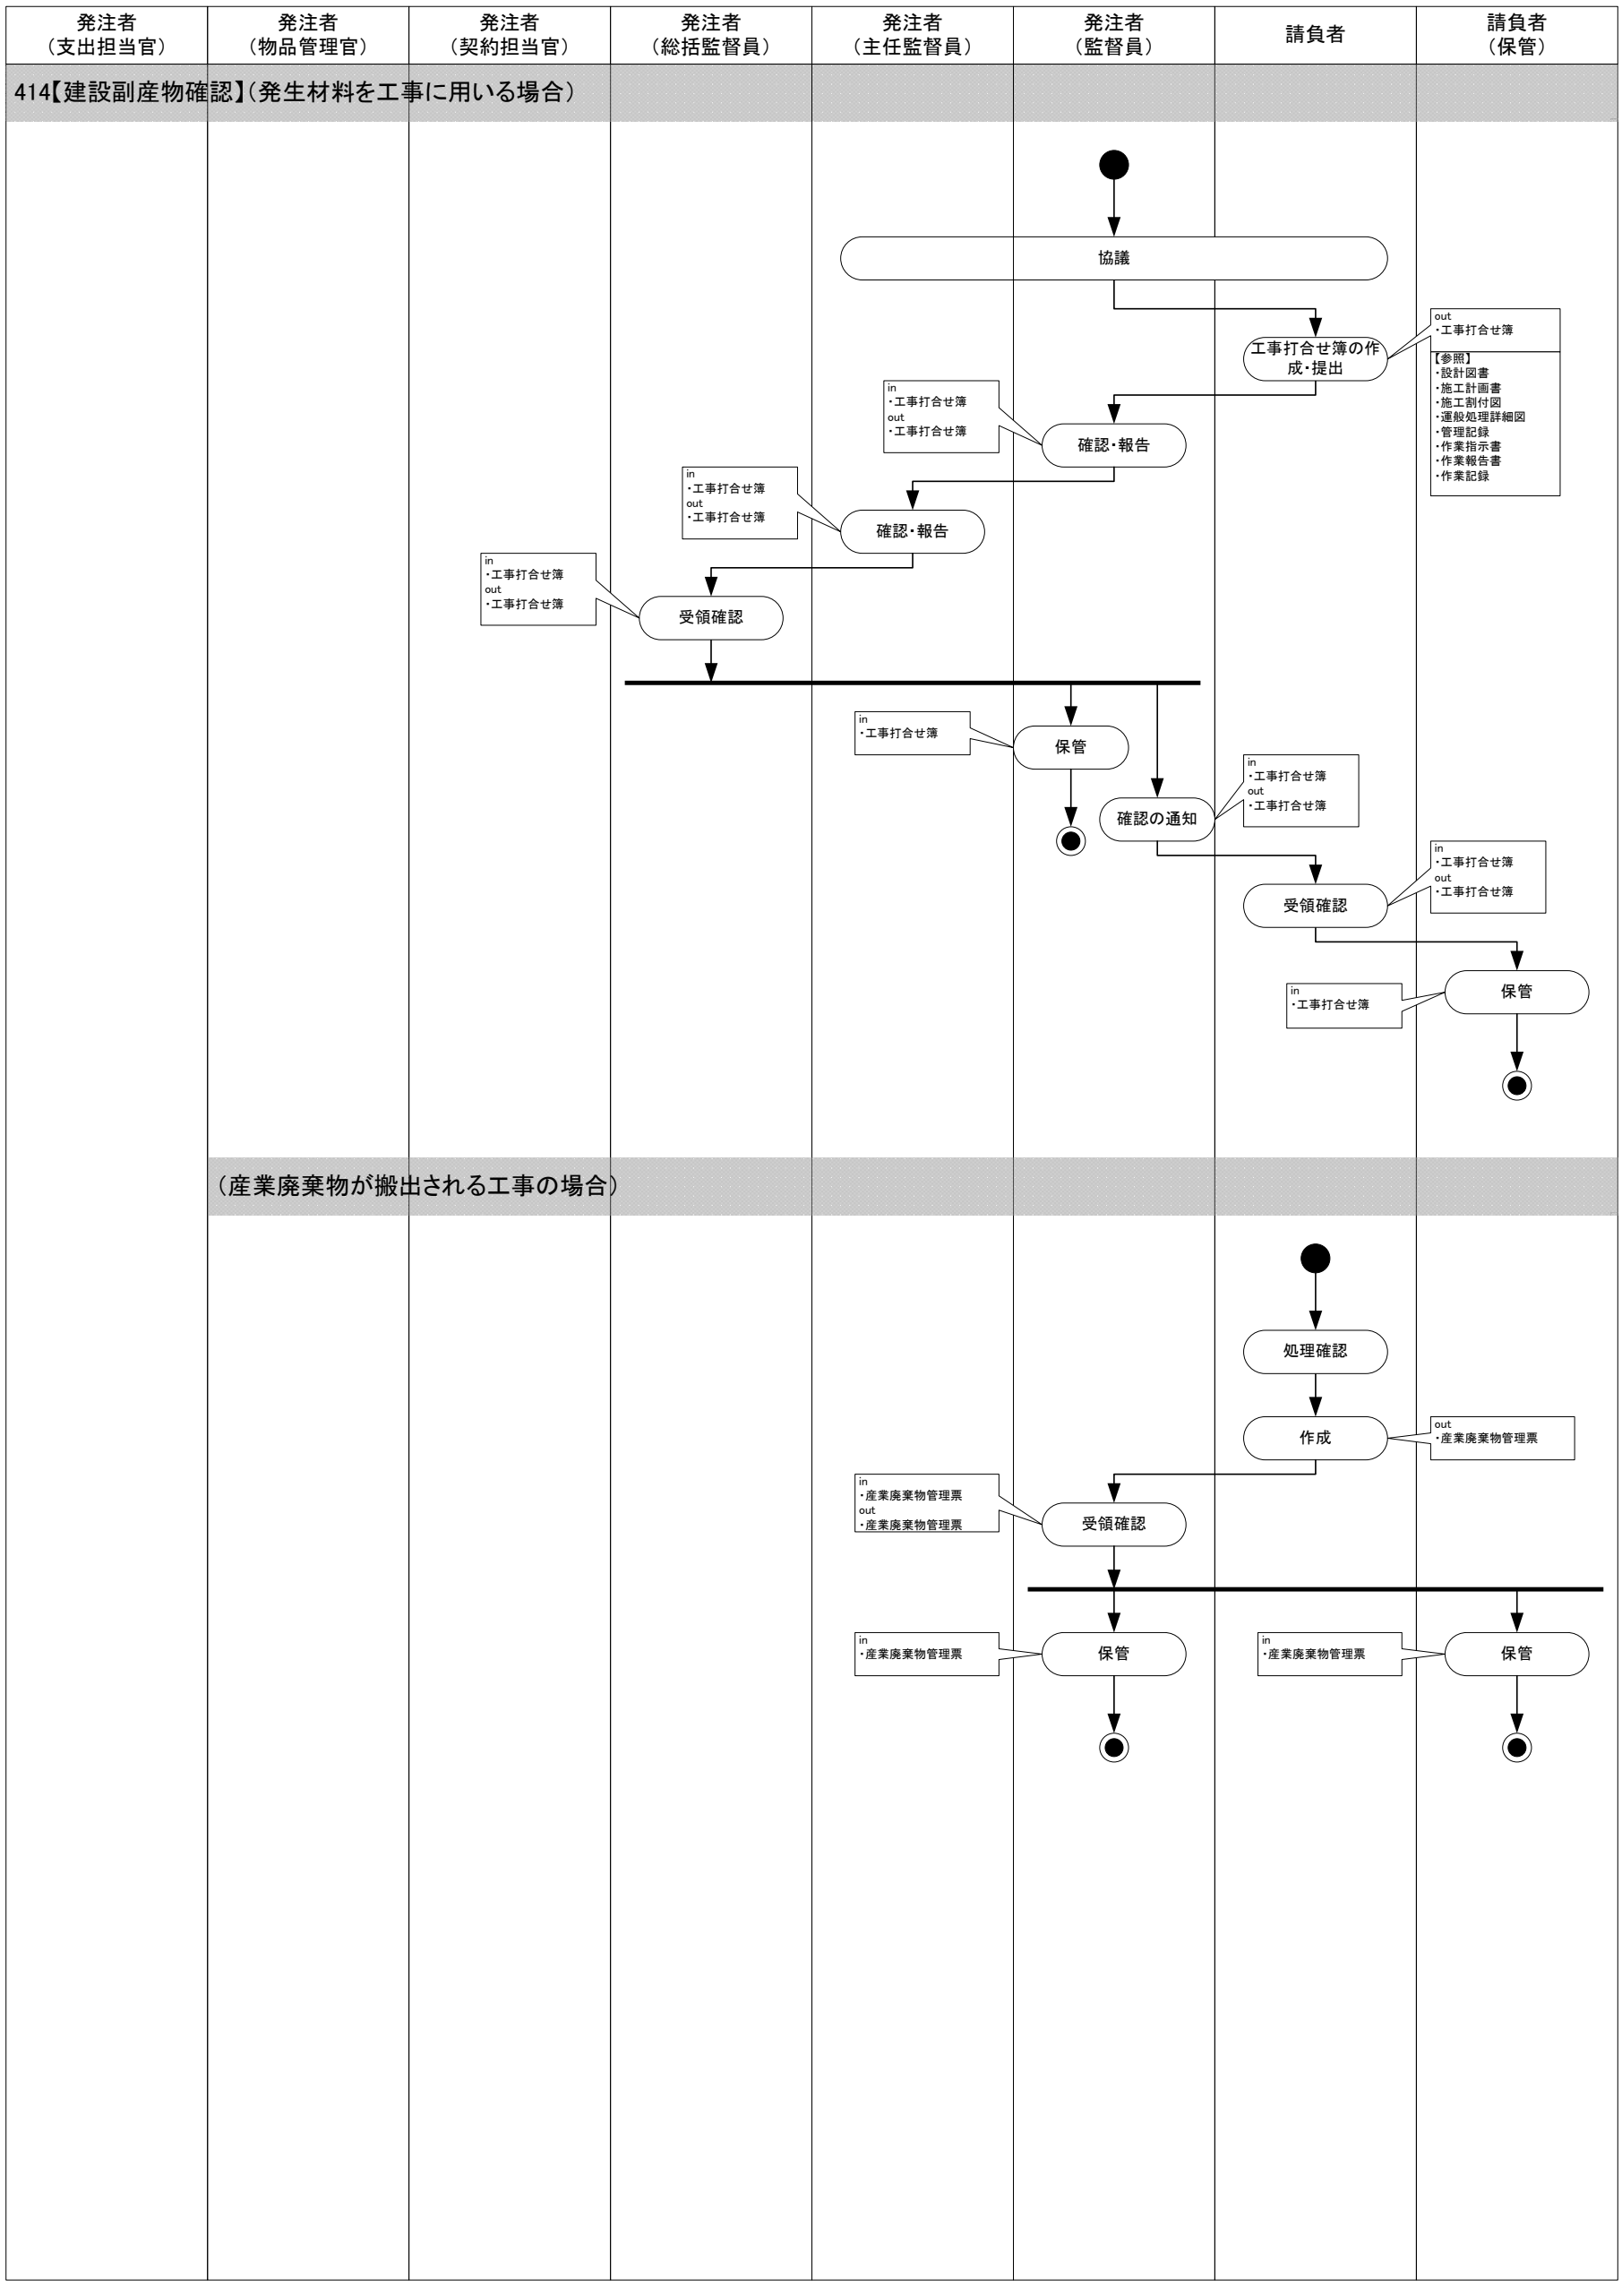
発注者
（支出担当官）
発注者
（物品管理官）
発注者
（契約担当官）
発注者
（総括監督員）
発注者
（主任監督員）
発注者
（監督員）
請負者
請負者
（保管）
414【建設副産物確認】（発生材料を工事に用いる場合）
協議
工事打合せ簿の作成・提出
out
・工事打合せ簿
【参照】
・設計図書
・施工計画書
・施工割付図
・運般処理詳細図
・管理記録
・作業指示書
・作業報告書
・作業記録
in
・工事打合せ簿
out
・工事打合せ簿
確認・報告
in
・工事打合せ簿
out
・工事打合せ簿
確認・報告
in
・工事打合せ簿
out
・工事打合せ簿
受領確認
in
・工事打合せ簿
保管
in
・工事打合せ簿
out
・工事打合せ簿
確認の通知
in
・工事打合せ簿
out
・工事打合せ簿
受領確認
in
・工事打合せ簿
保管
（産業廃棄物が搬出される工事の場合）
処理確認
作成
out
・産業廃棄物管理票
in
・産業廃棄物管理票
out
・産業廃棄物管理票
受領確認
in
・産業廃棄物管理票
保管
in
・産業廃棄物管理票
保管

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

発注者 （支出担当官）	発注者 （物品管理官）	発注者 （契約担当官）	発注者 （総括監督員）	発注者 （主任監督員）	発注者 （監督員）	請負者	請負者 （保管）
	（土砂、採石、加熱アスファルト混合物を搬入する場合）						
	（建設発生土、コンクリート塊等または建設混合廃棄物を搬出する場合）						

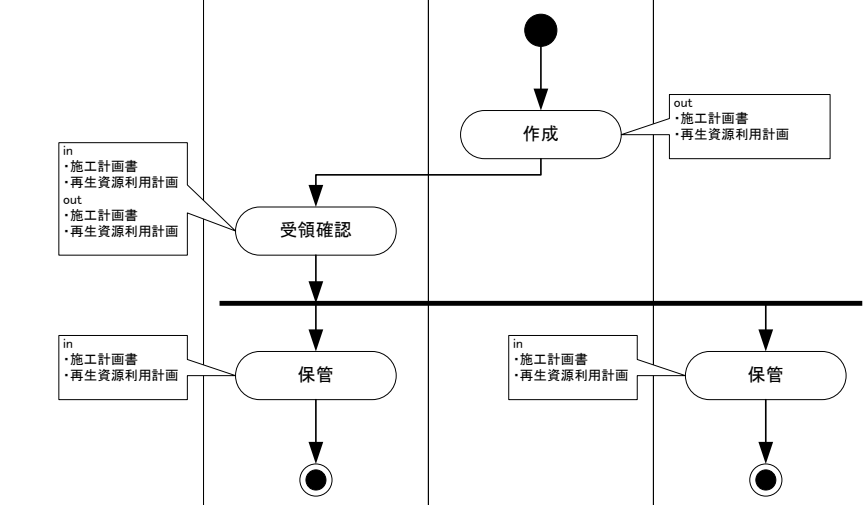

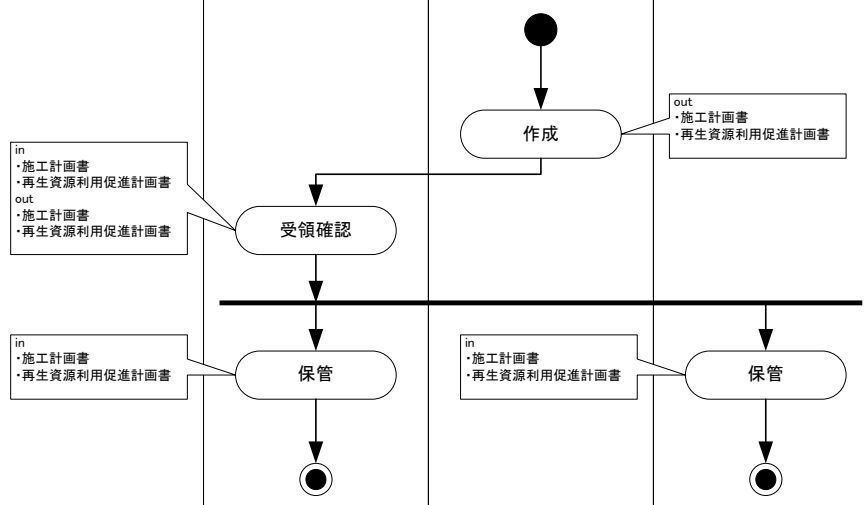

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

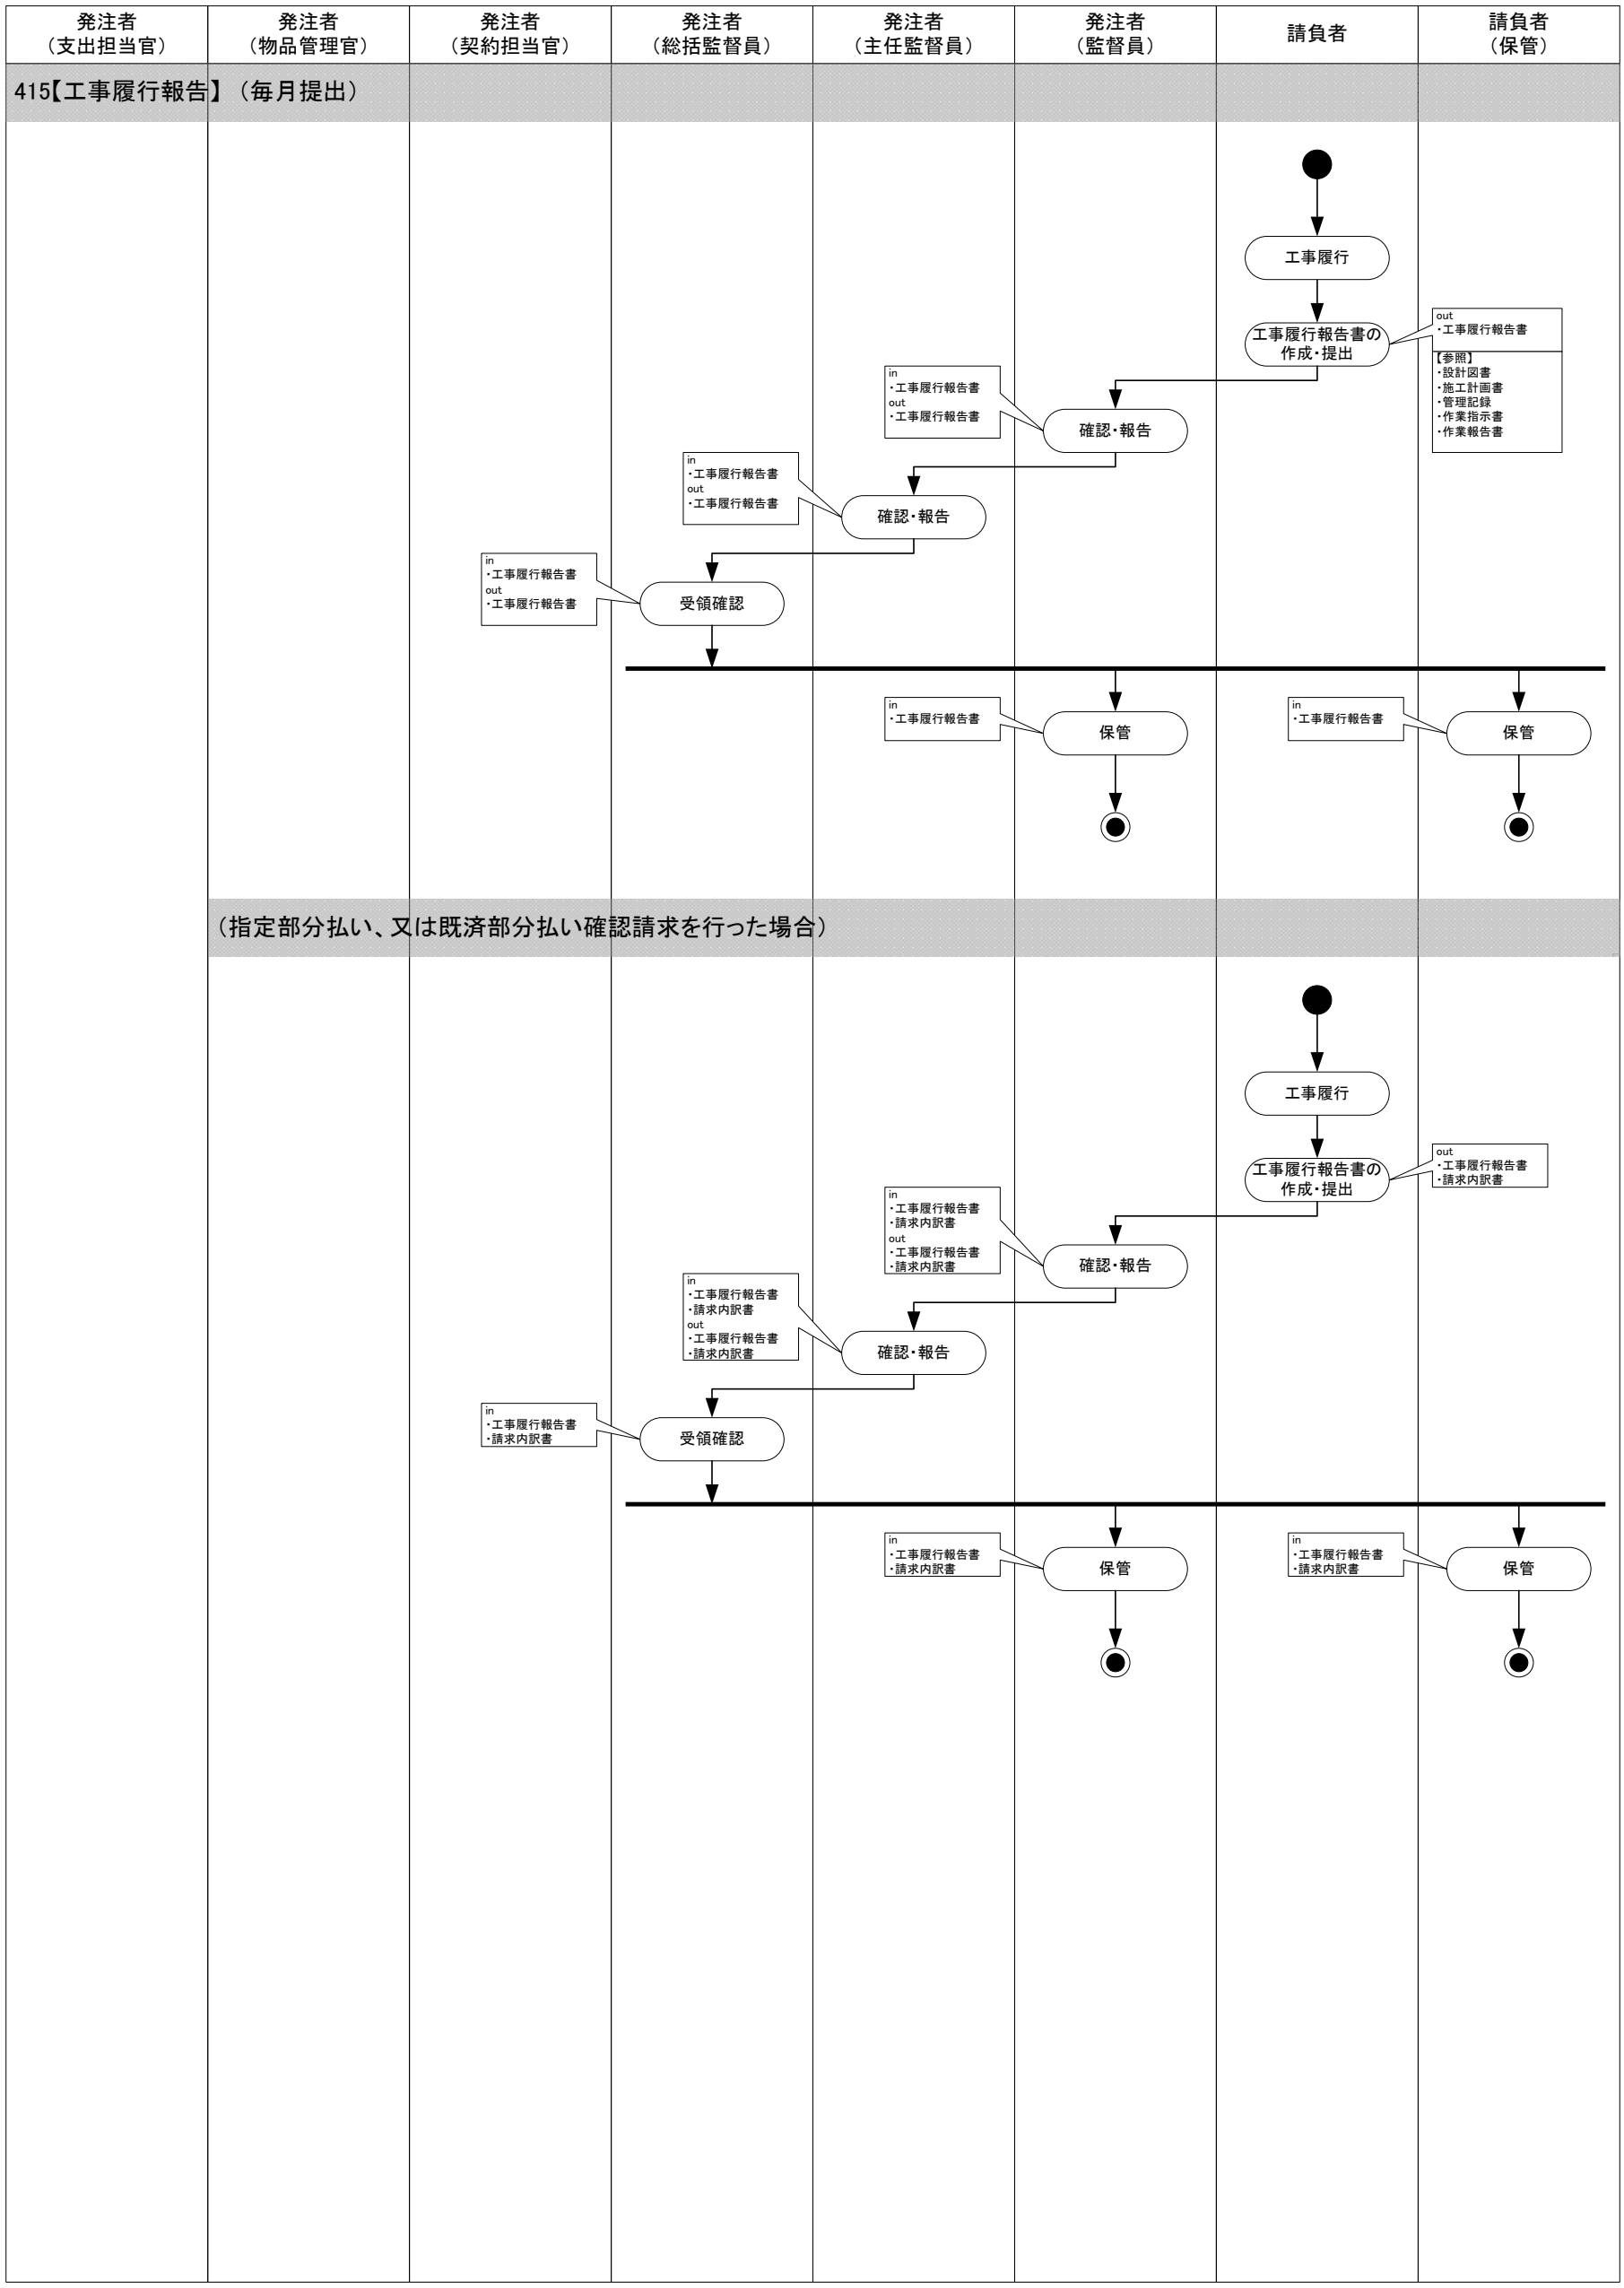

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

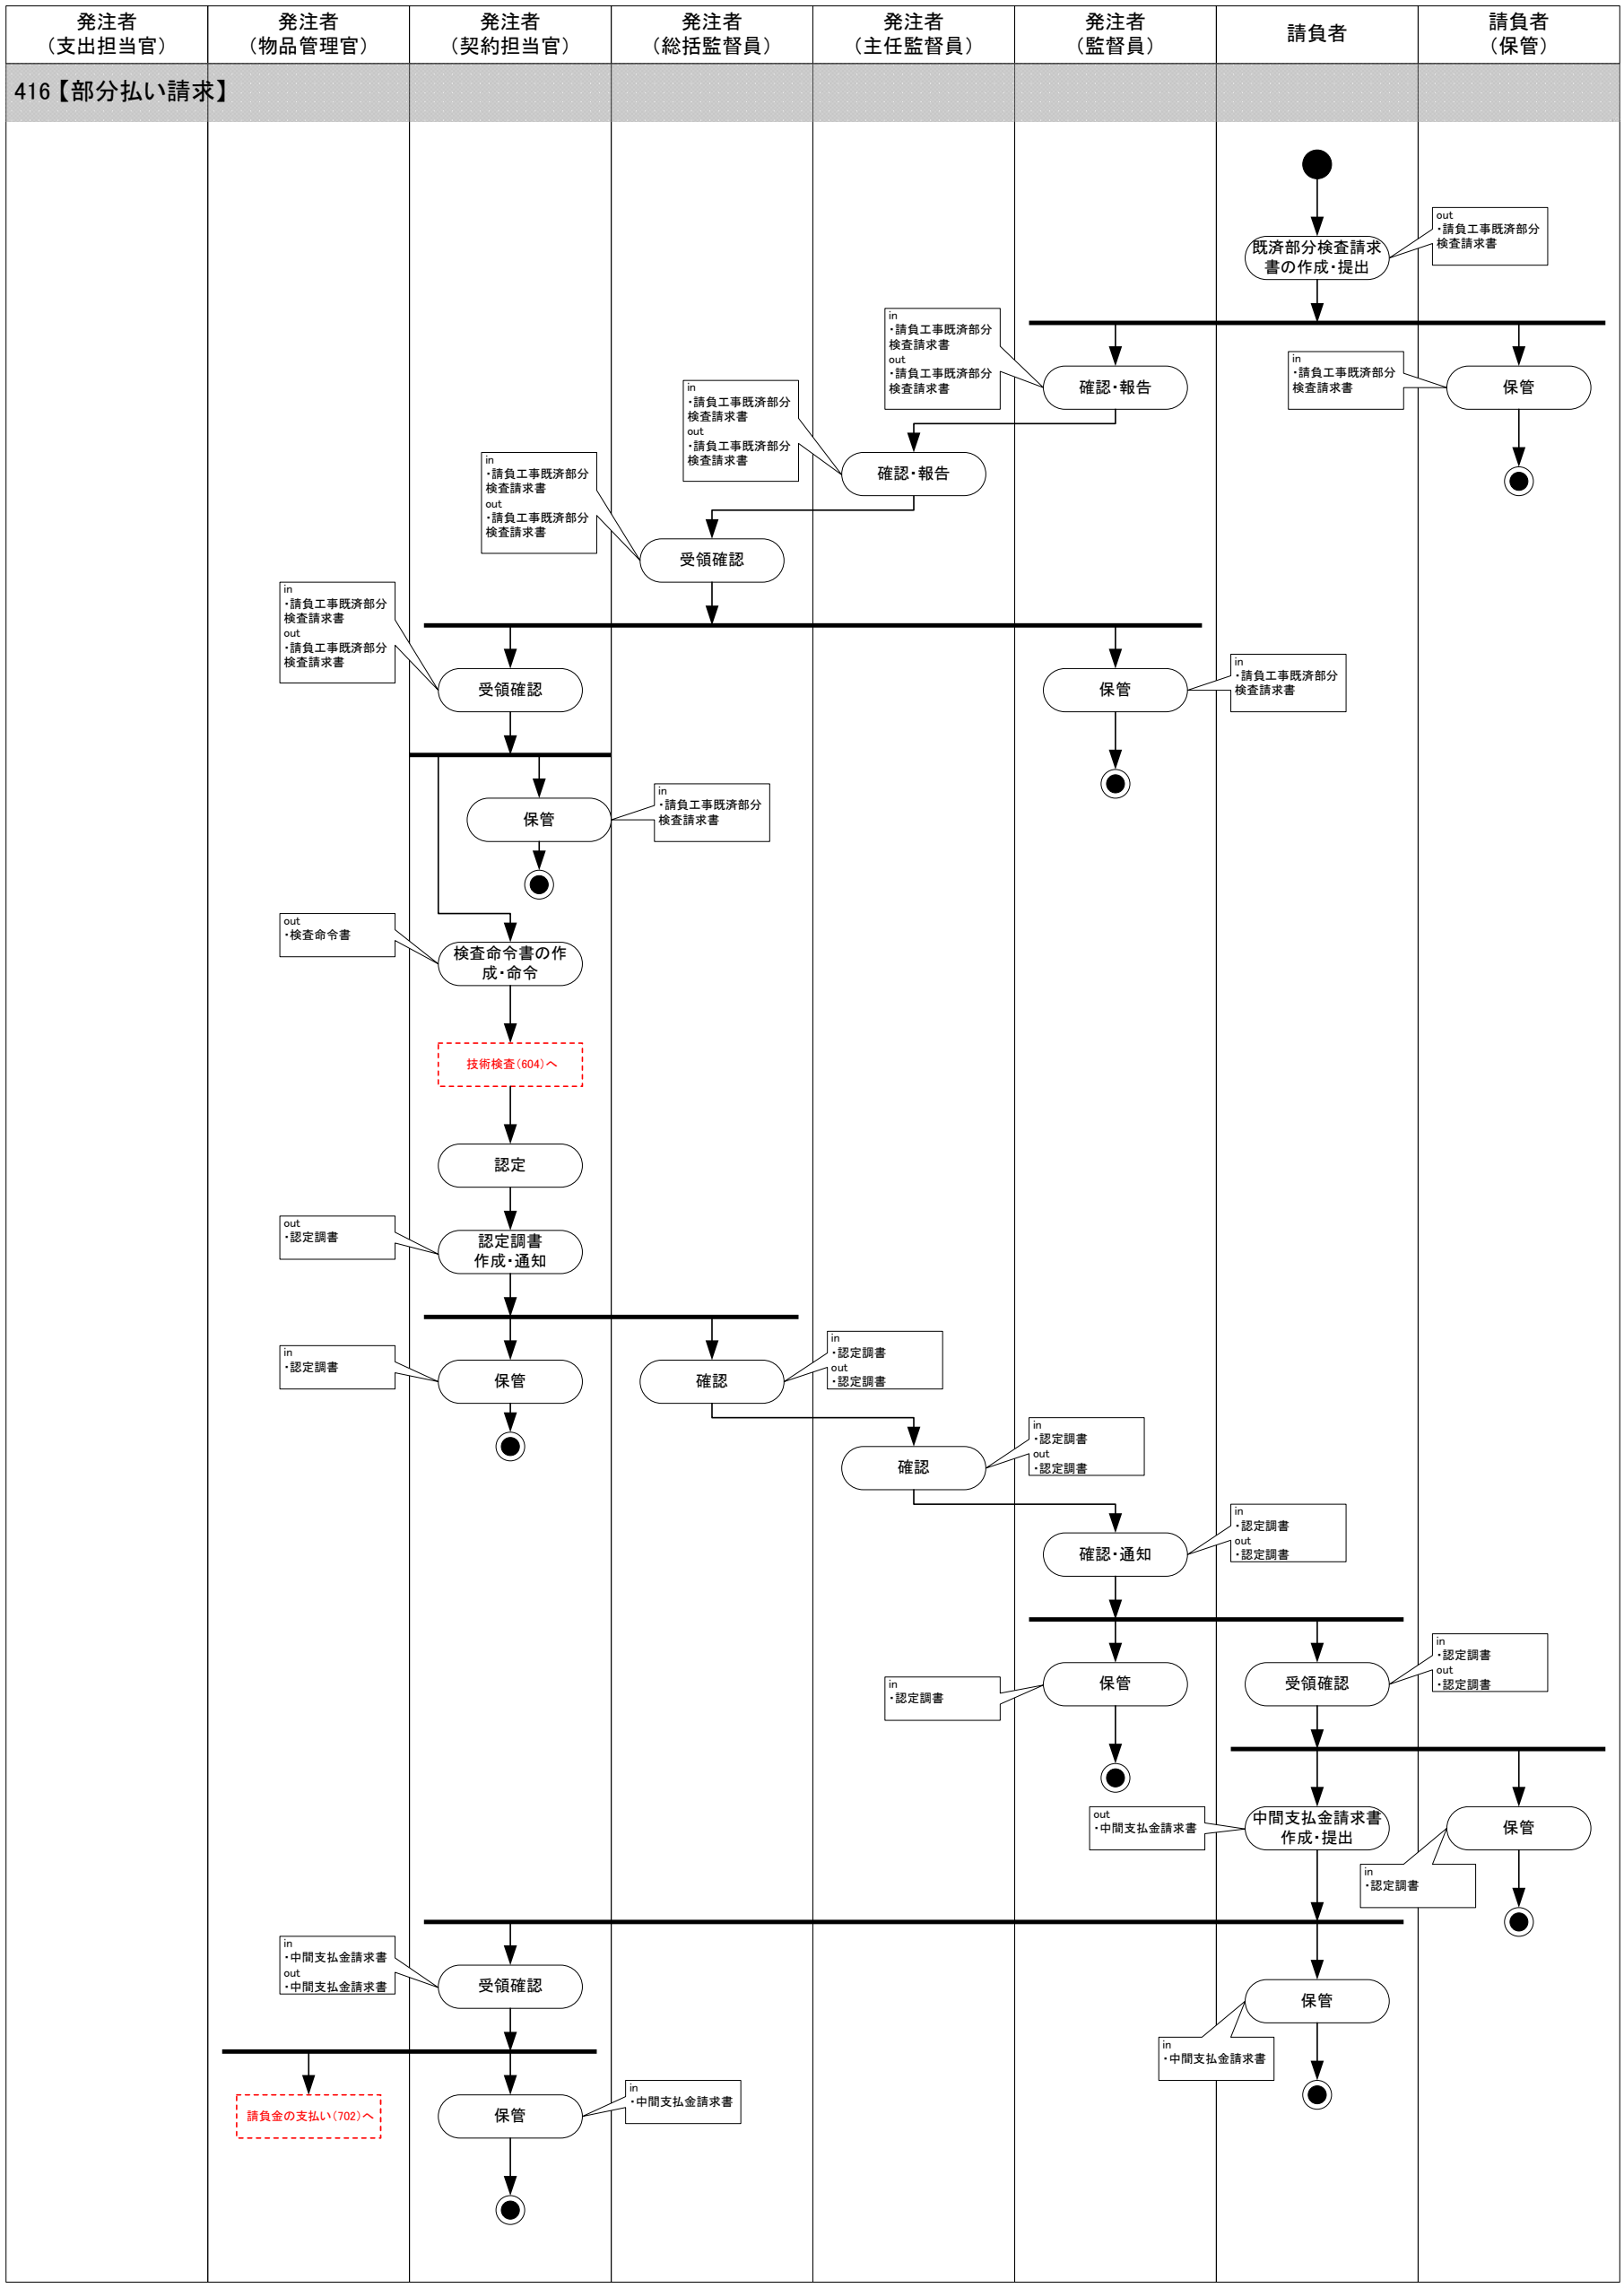

④工事施工、施工管理【工事契約 30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

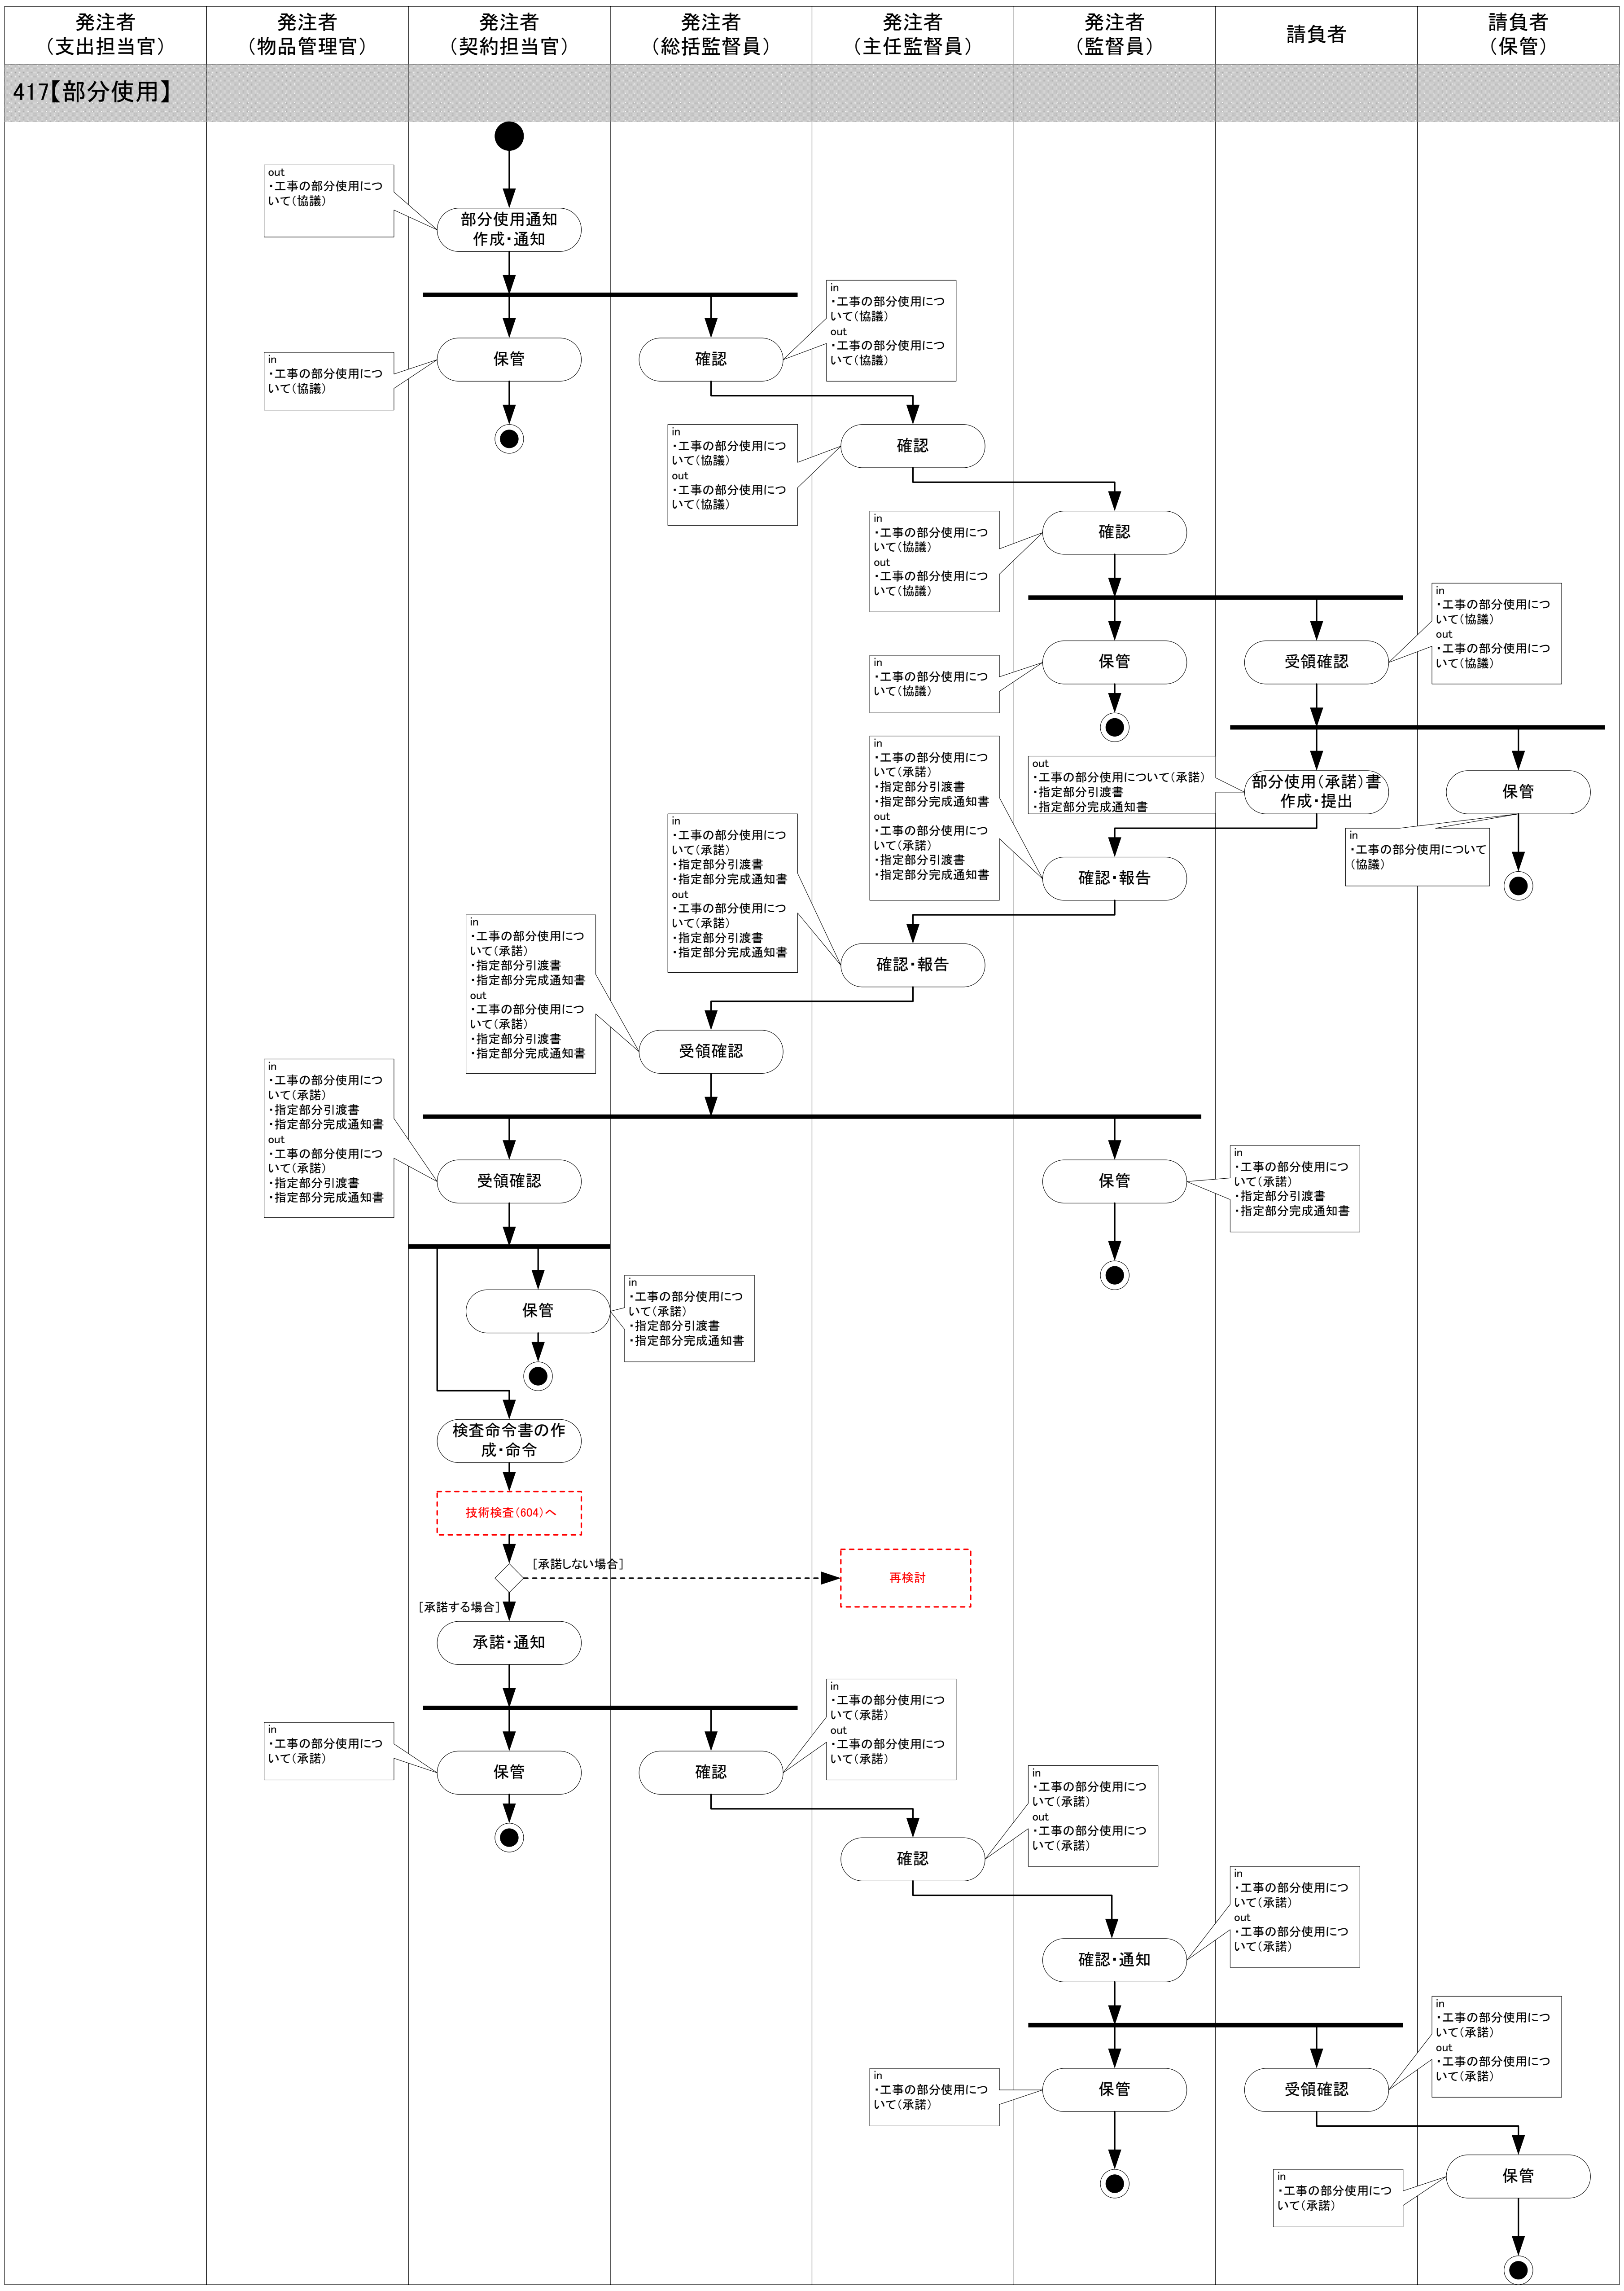

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

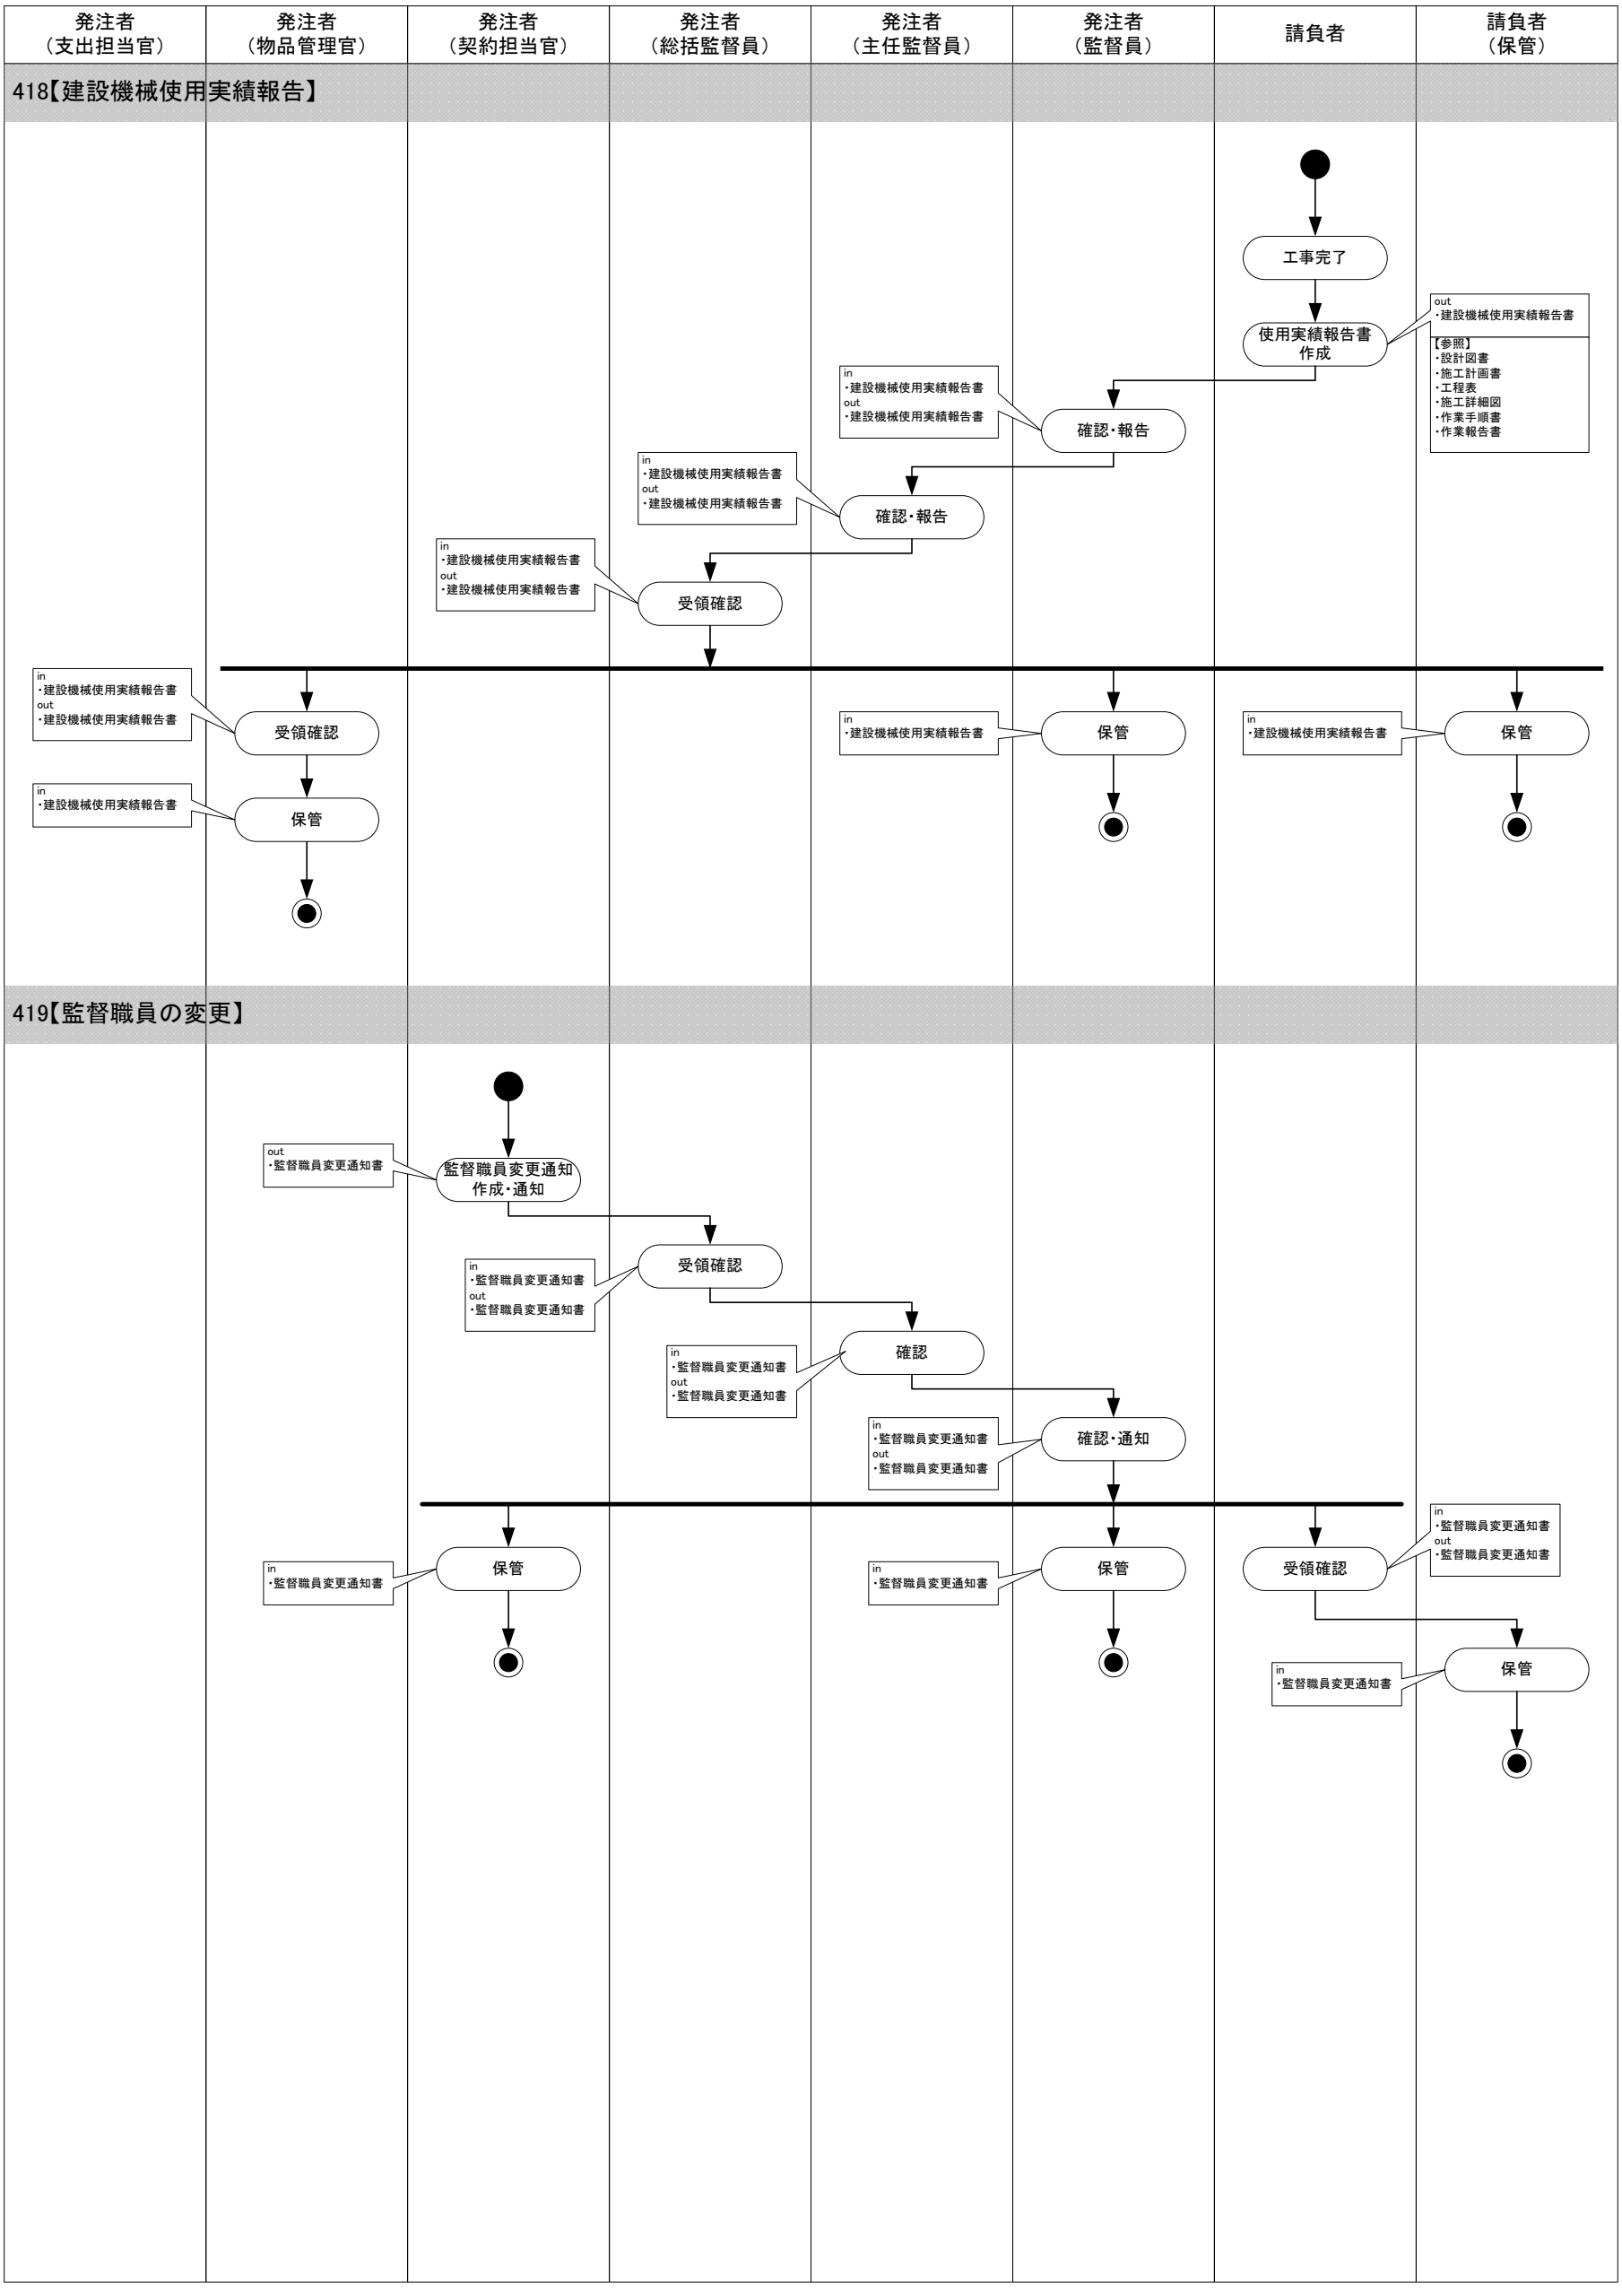

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

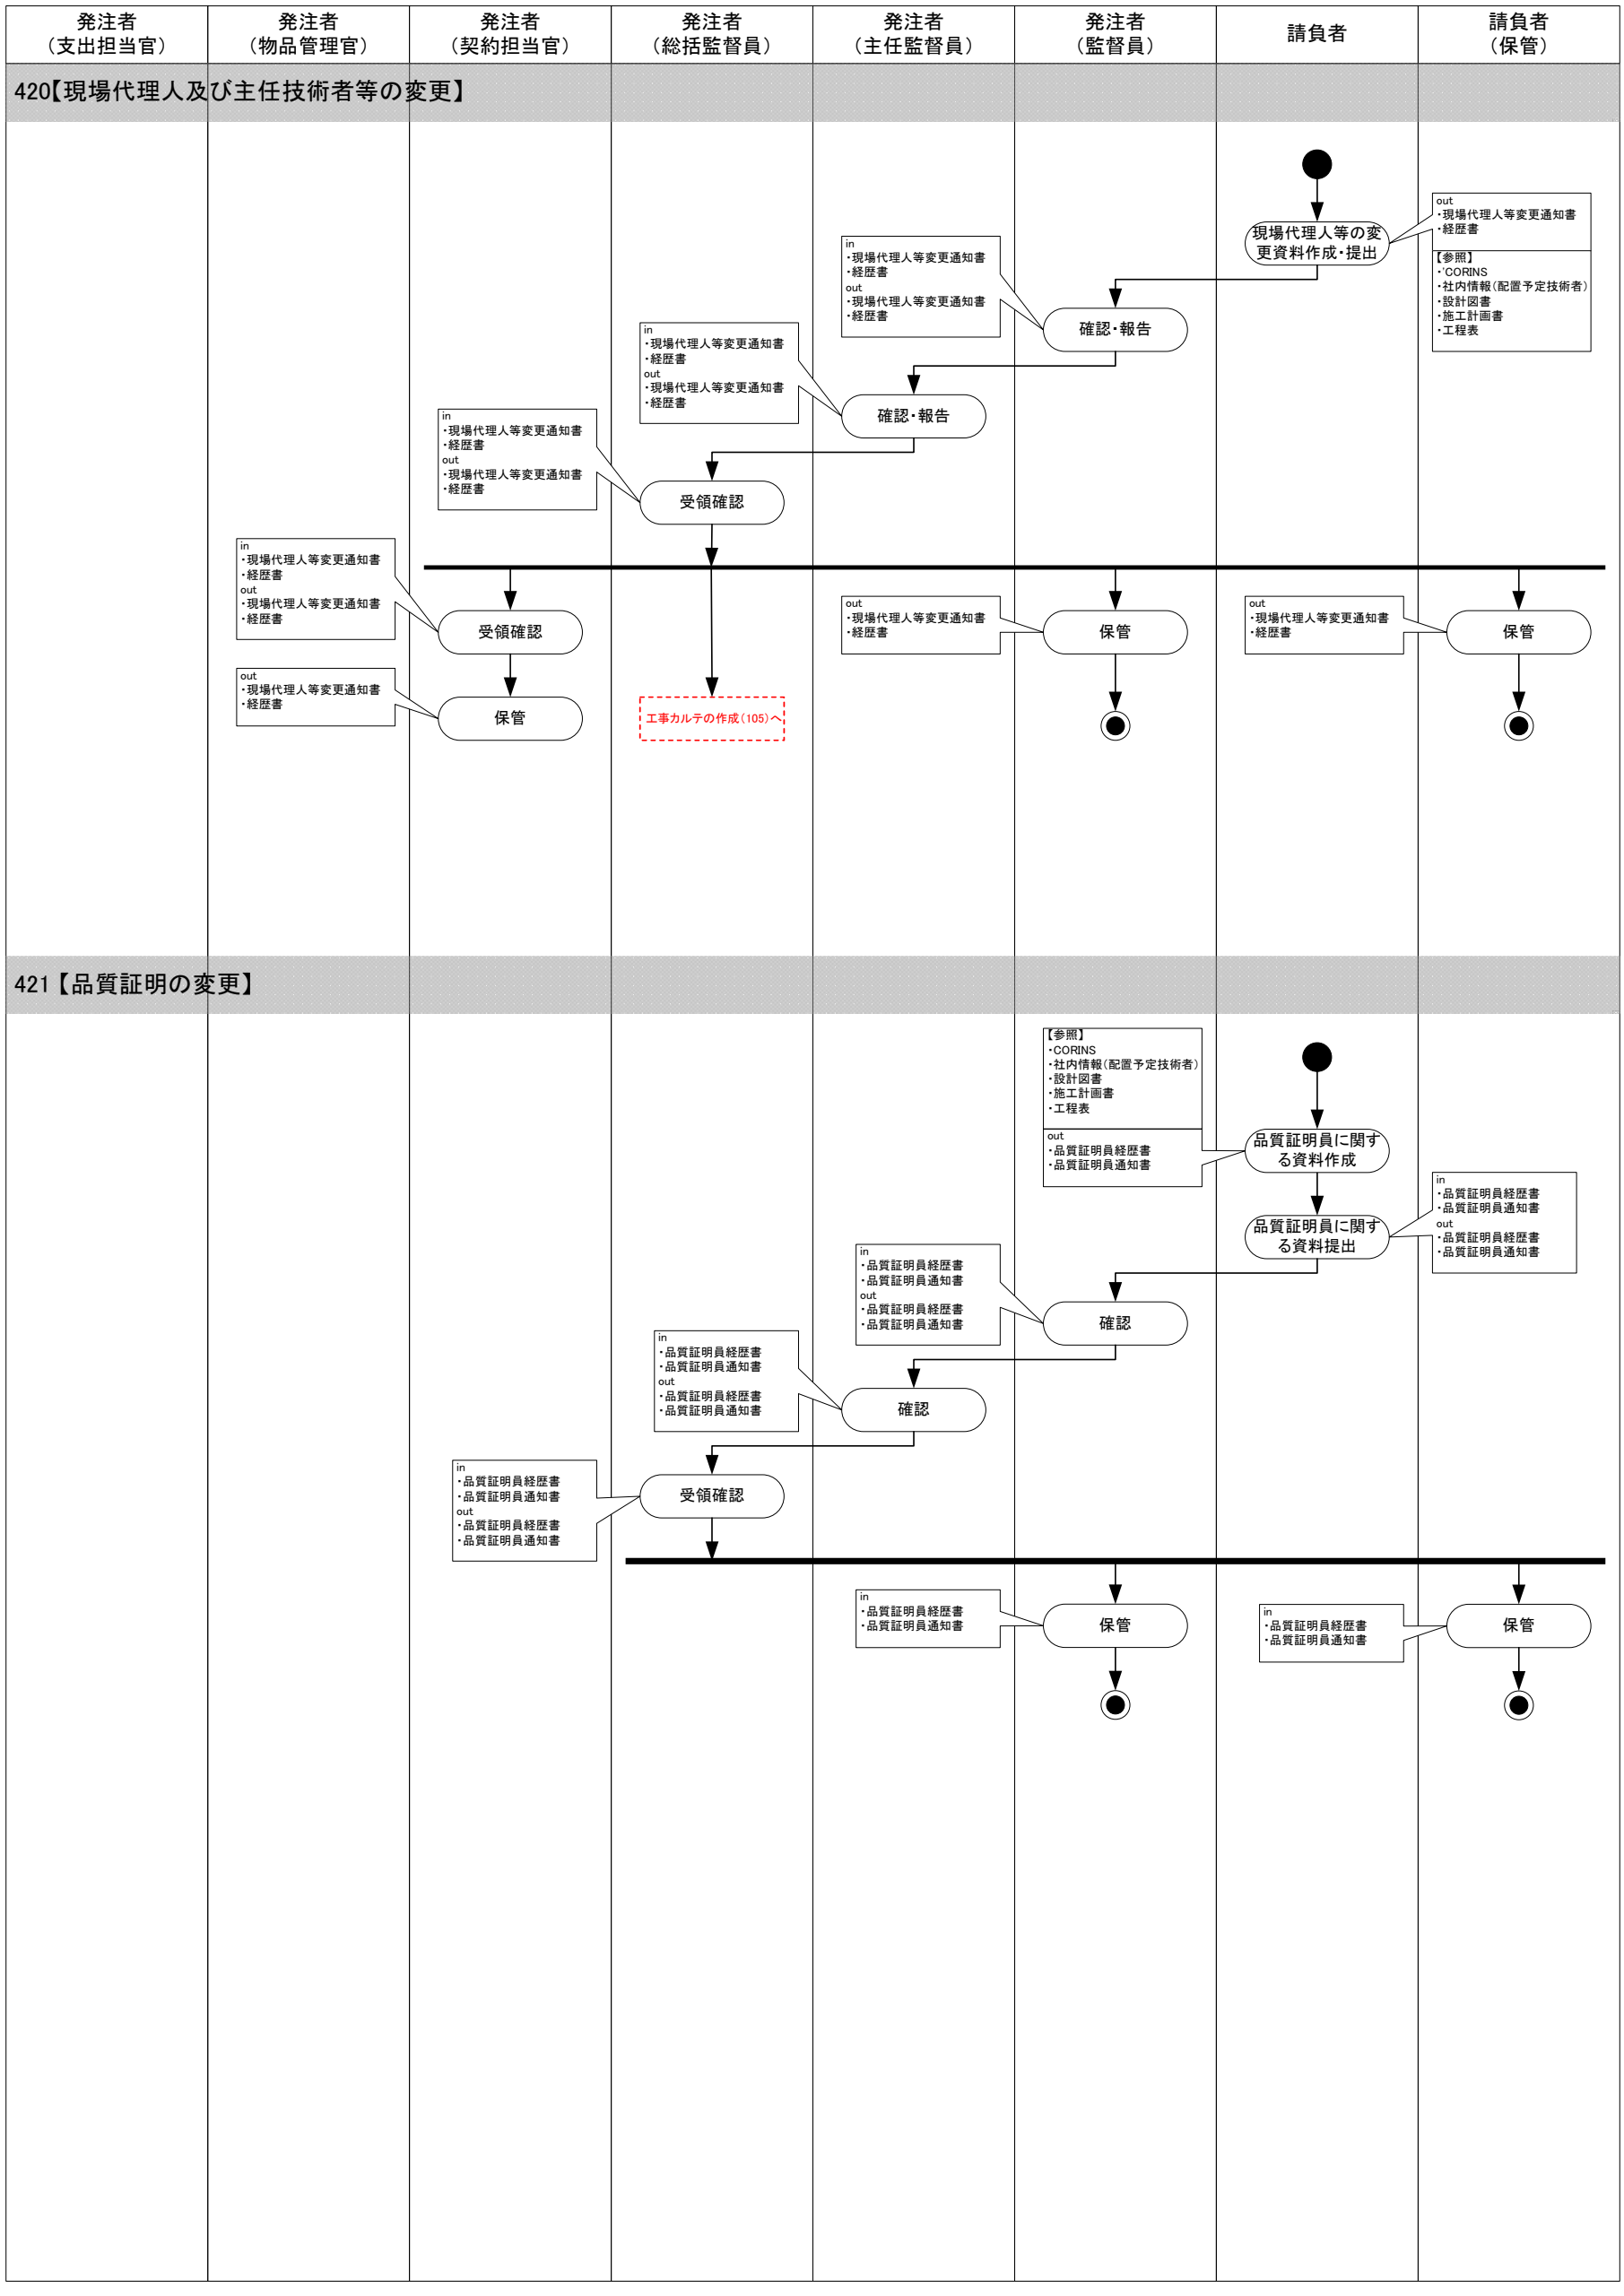

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

発注者 （支出担当官）	発注者 （物品管理官）	発注者 （契約担当官）	発注者 （総括監督員）	発注者 （主任監督員）	発注者 （監督員）	請負者	請負者 （保管）
422【工事カルテ変更登録】							

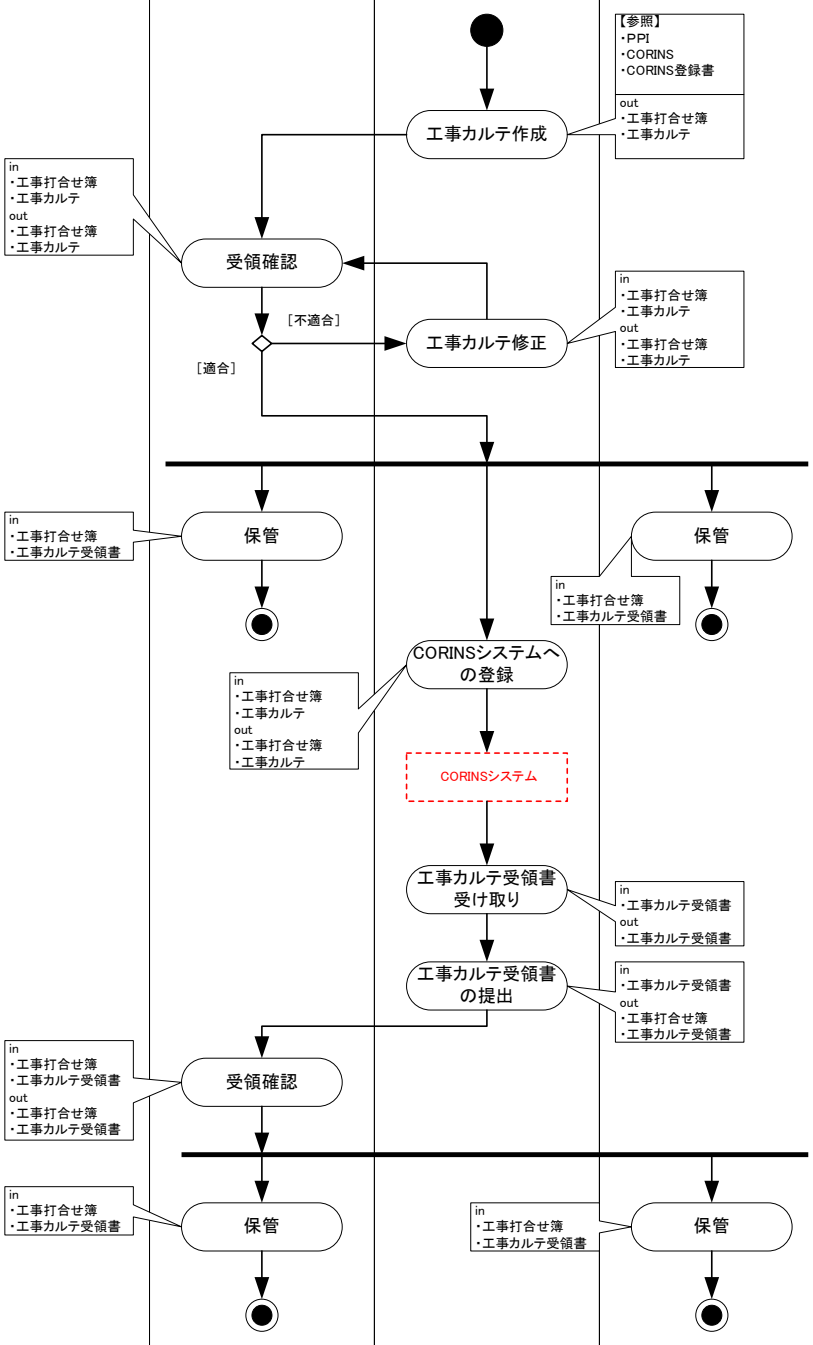

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

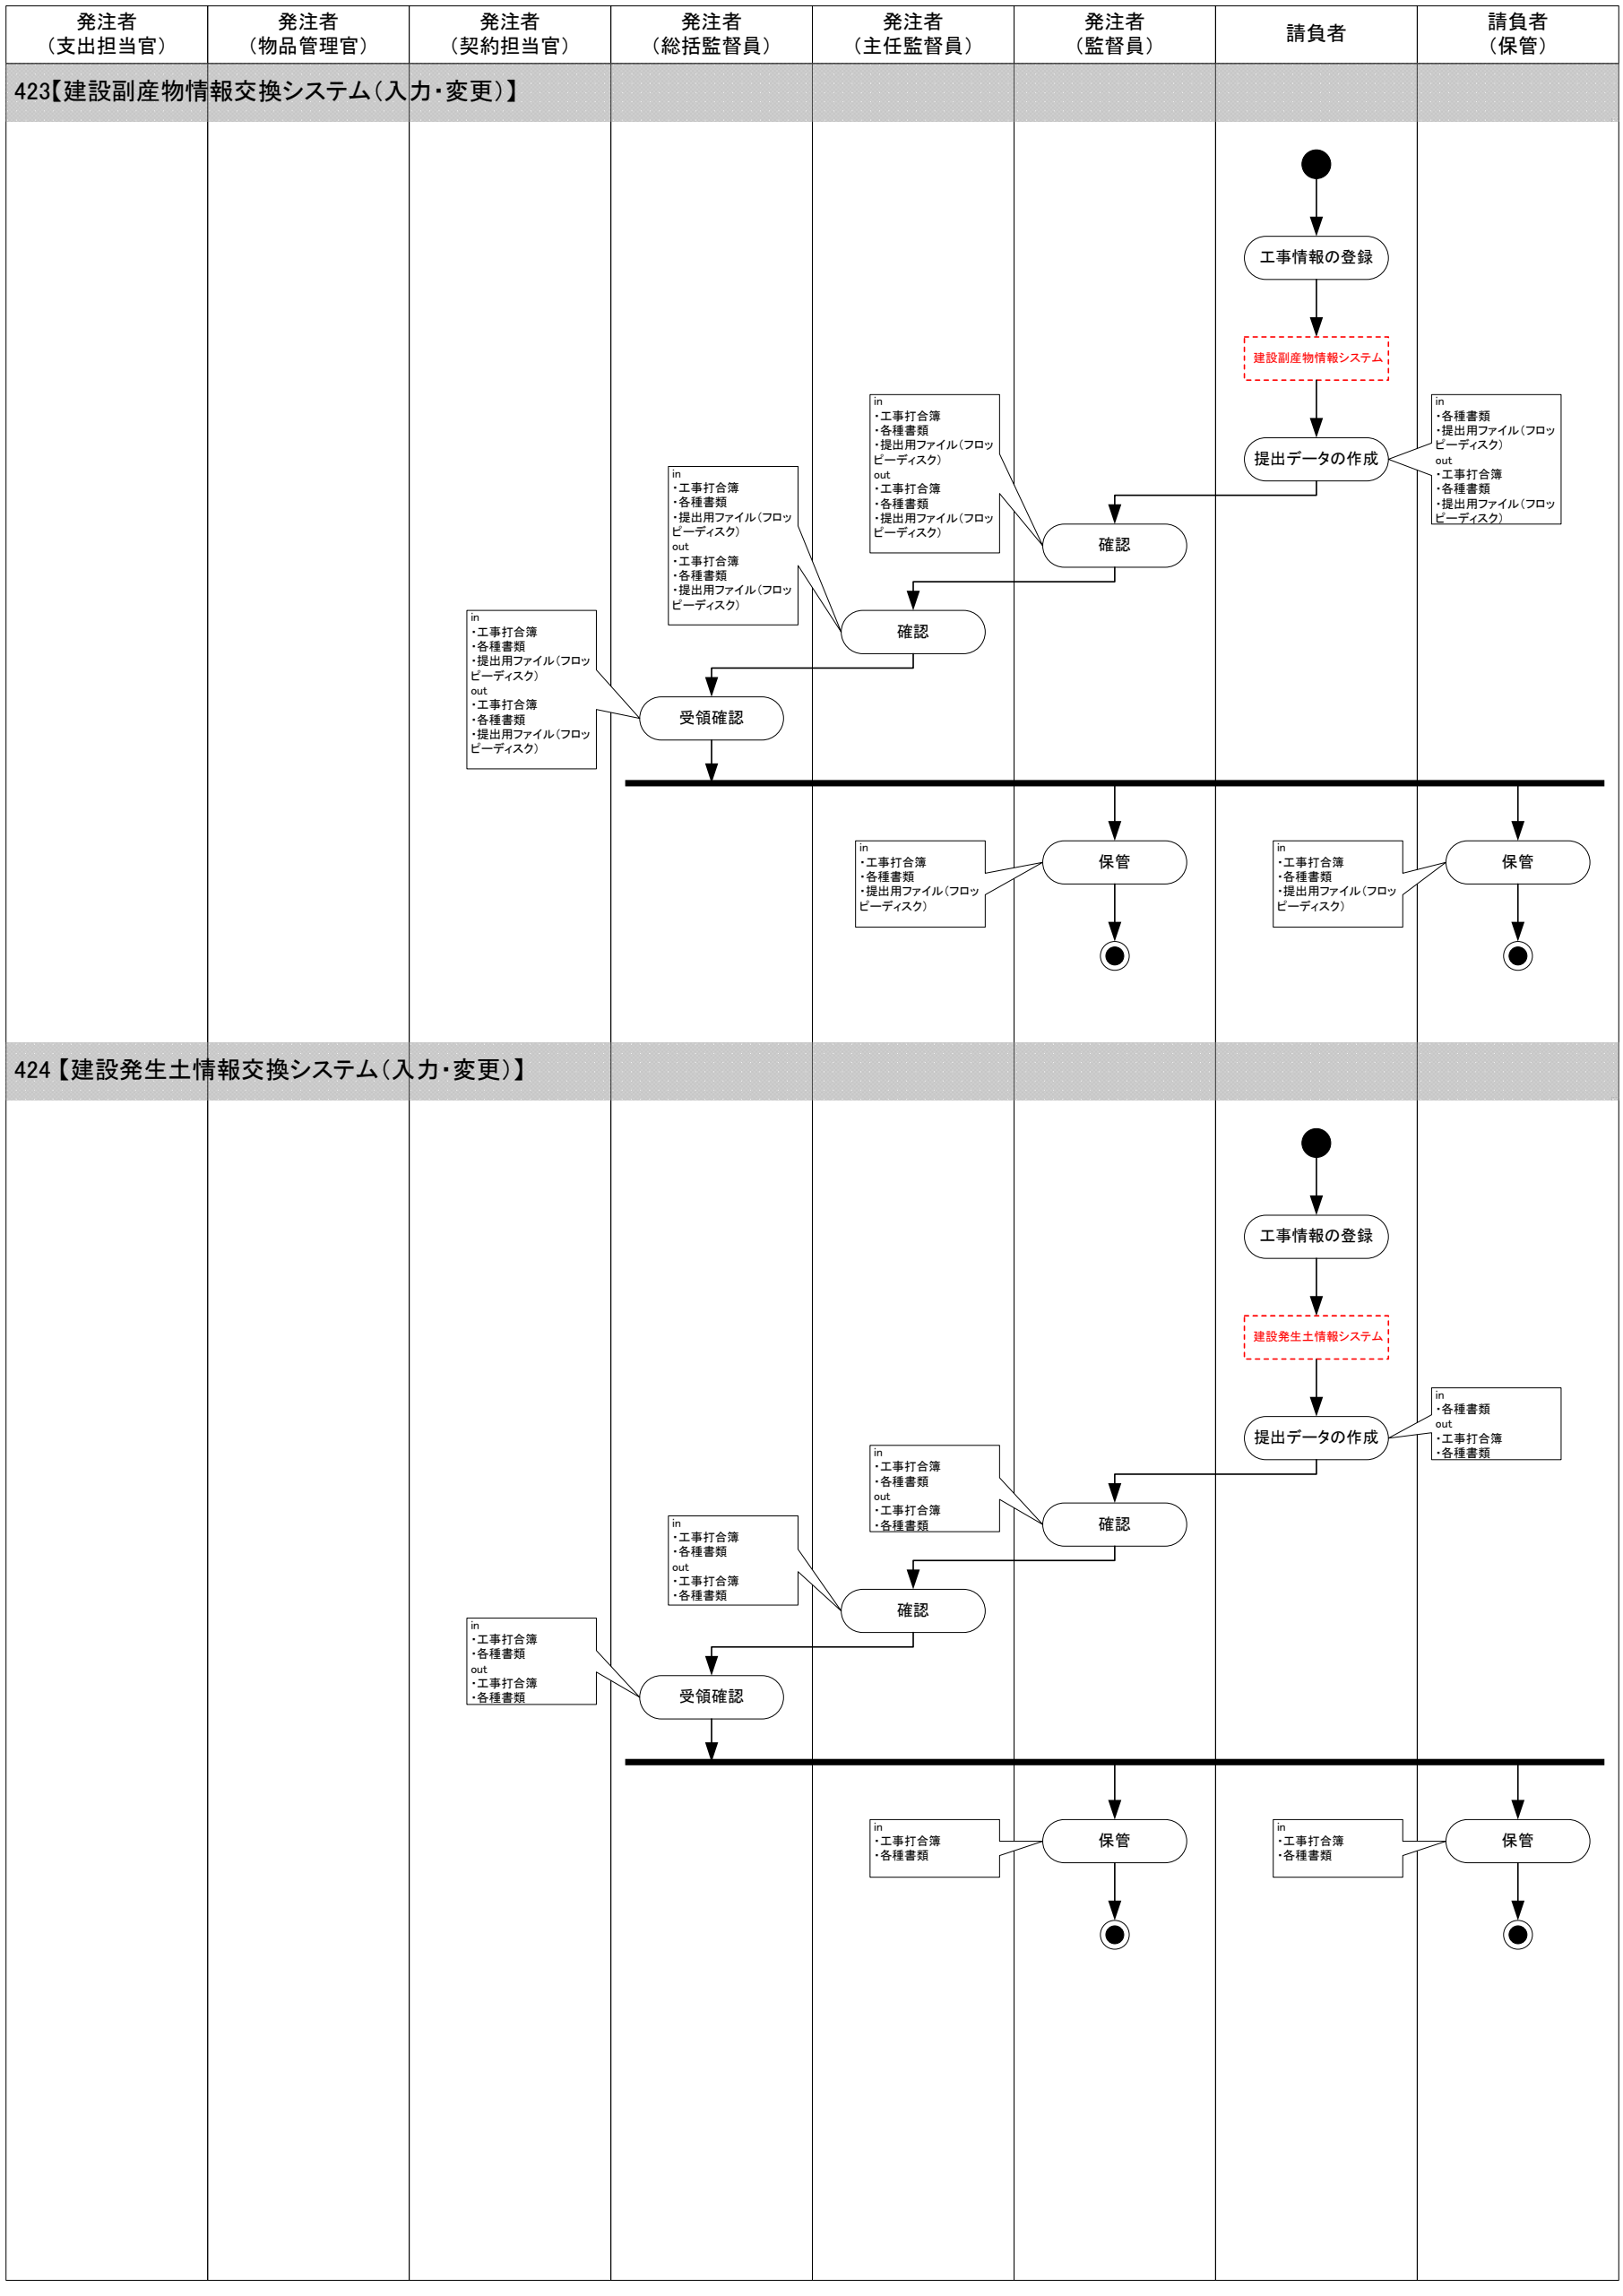

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

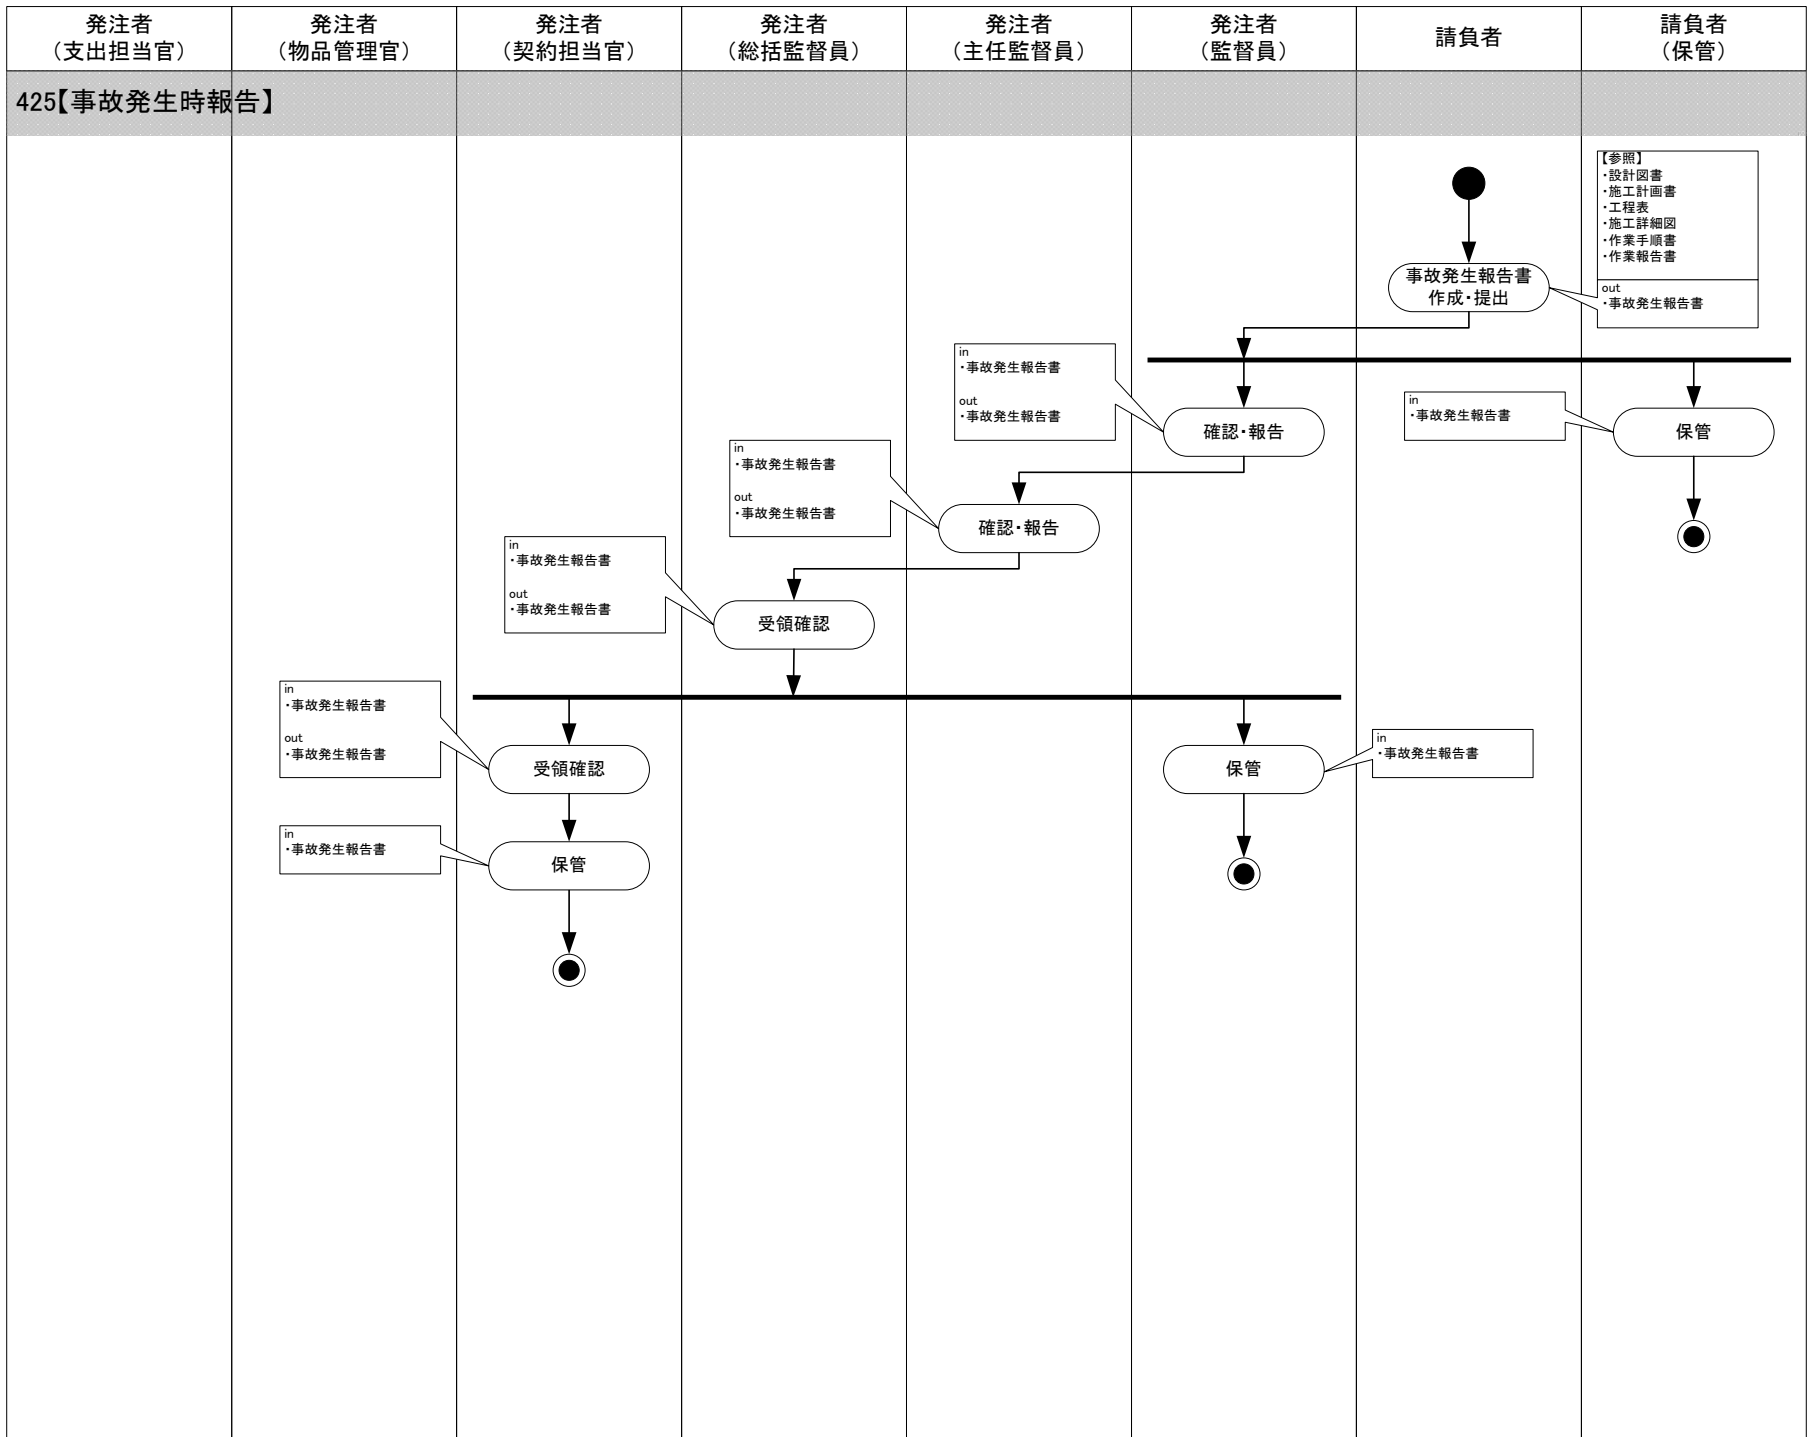

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

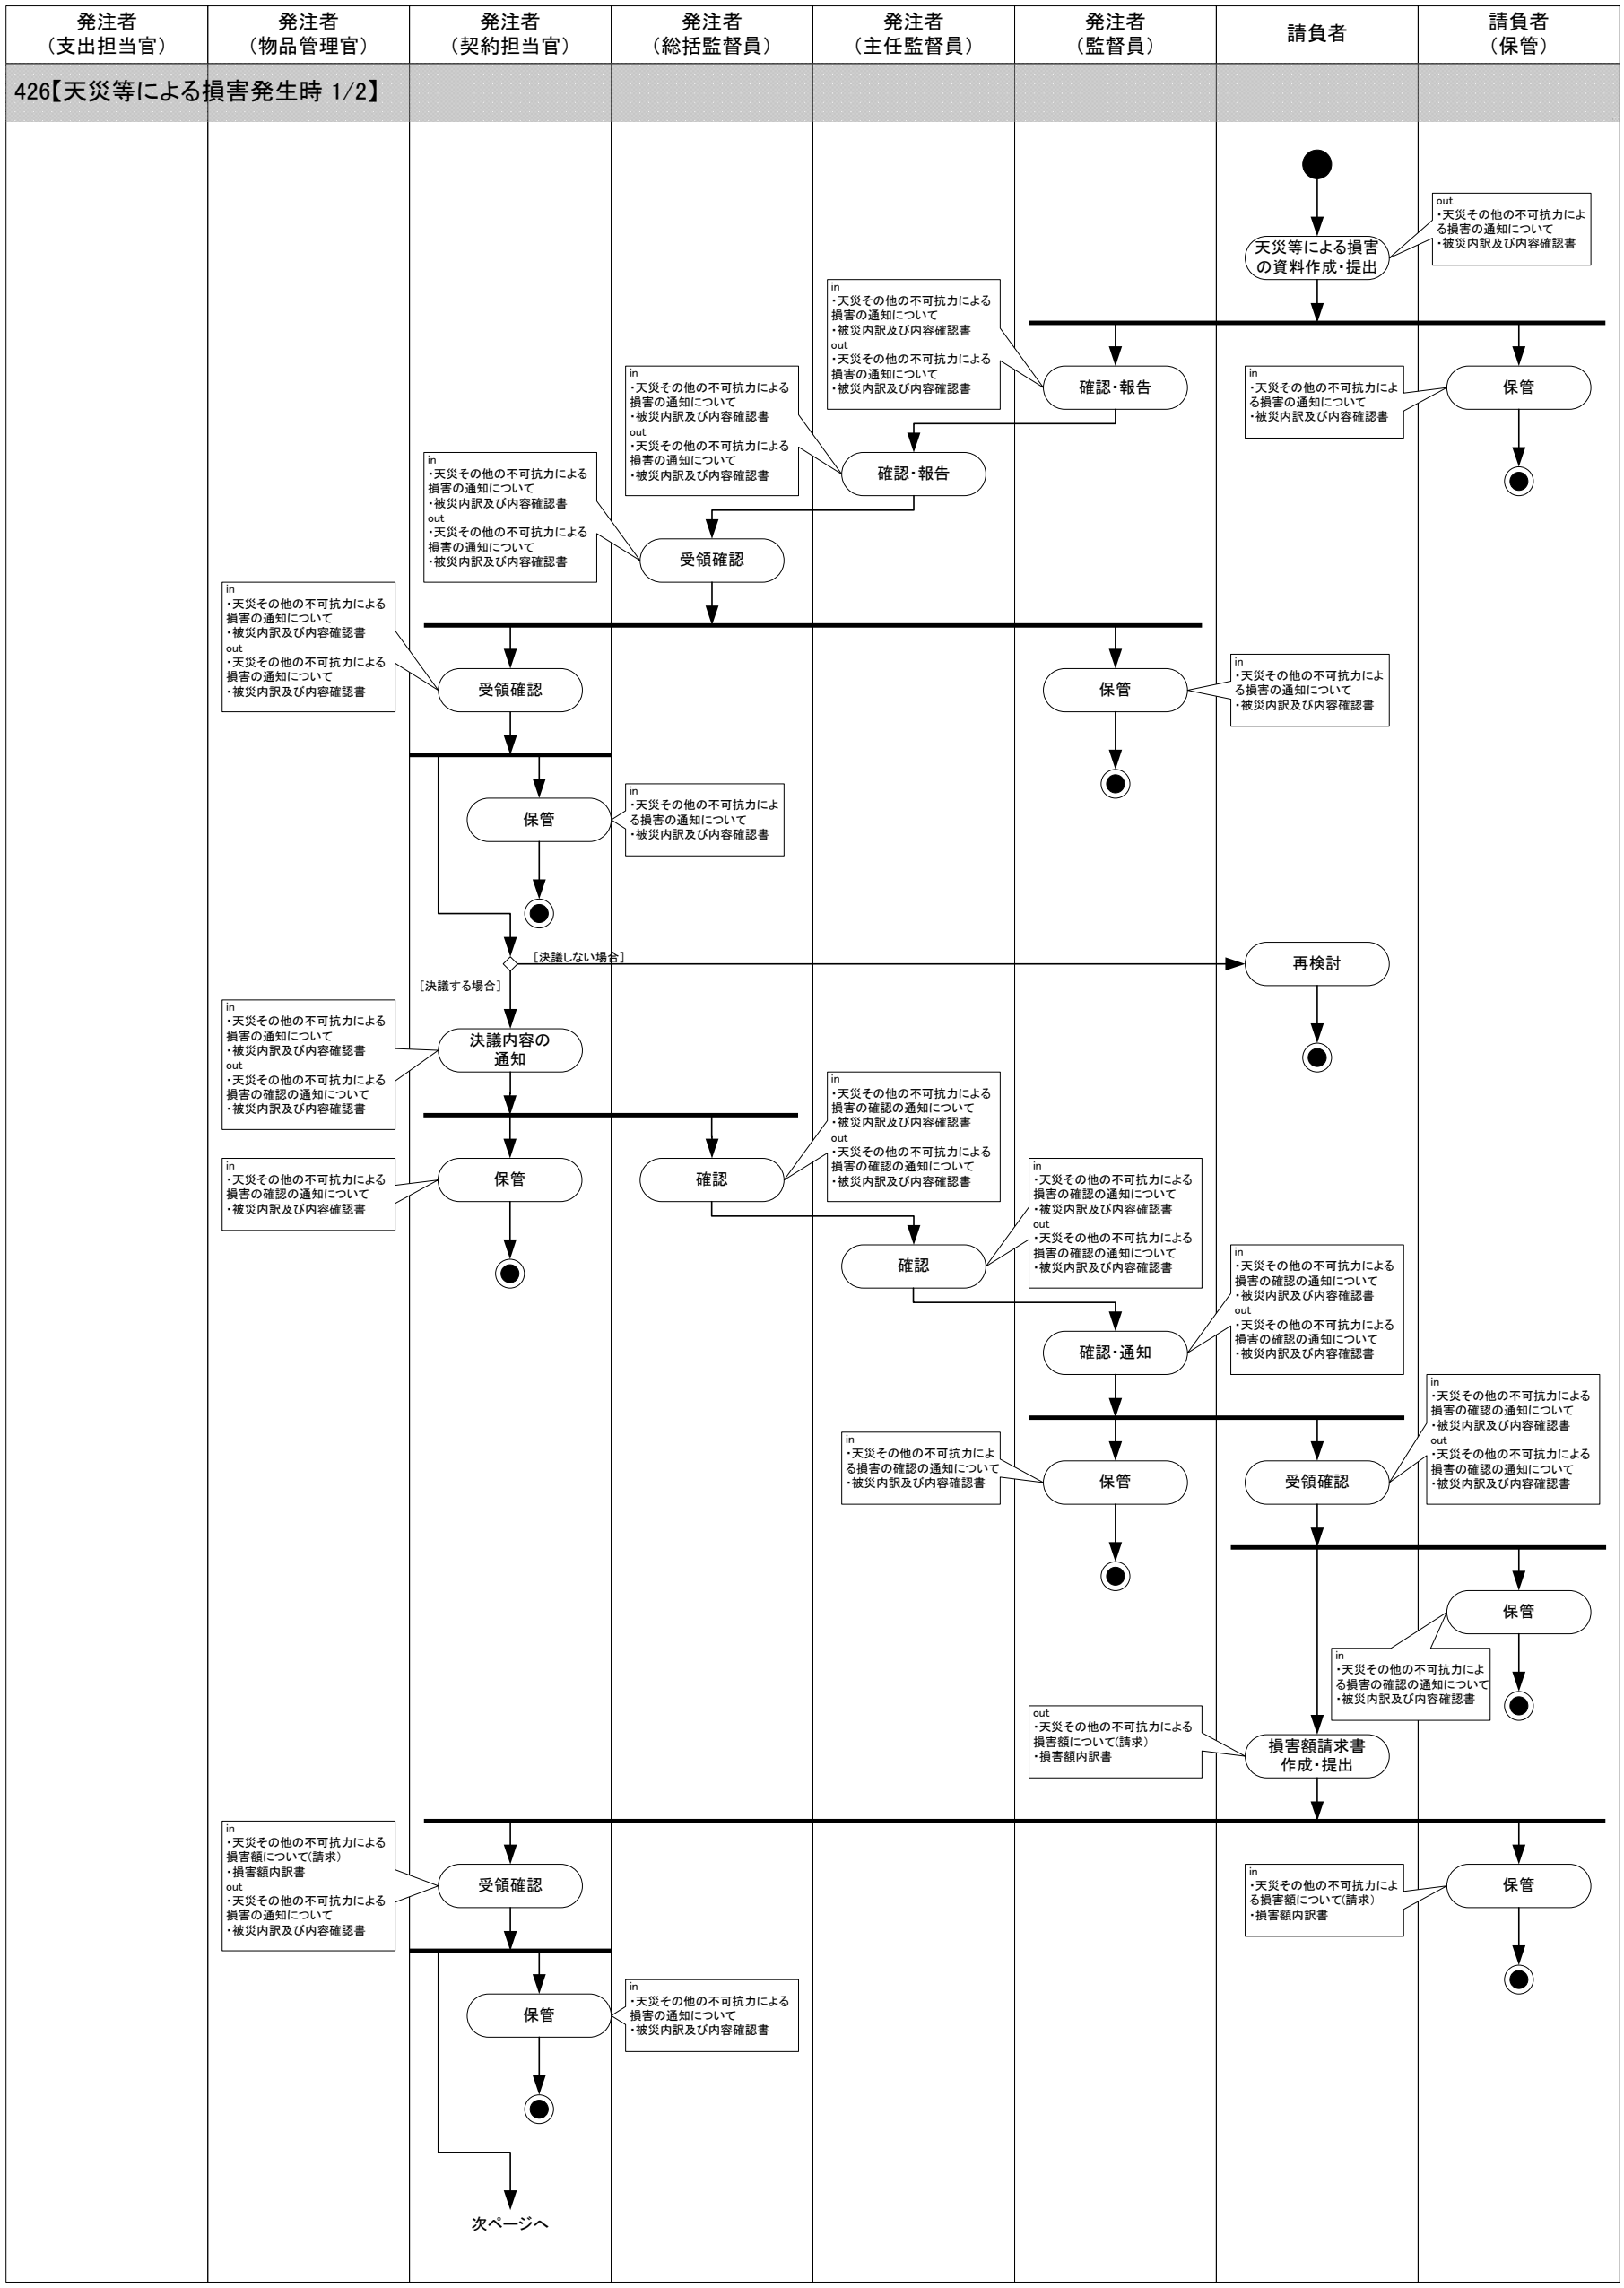

④工事施工、施工管理【工事契約　30日（最遅）～、及び箇所・工種別施工管理】

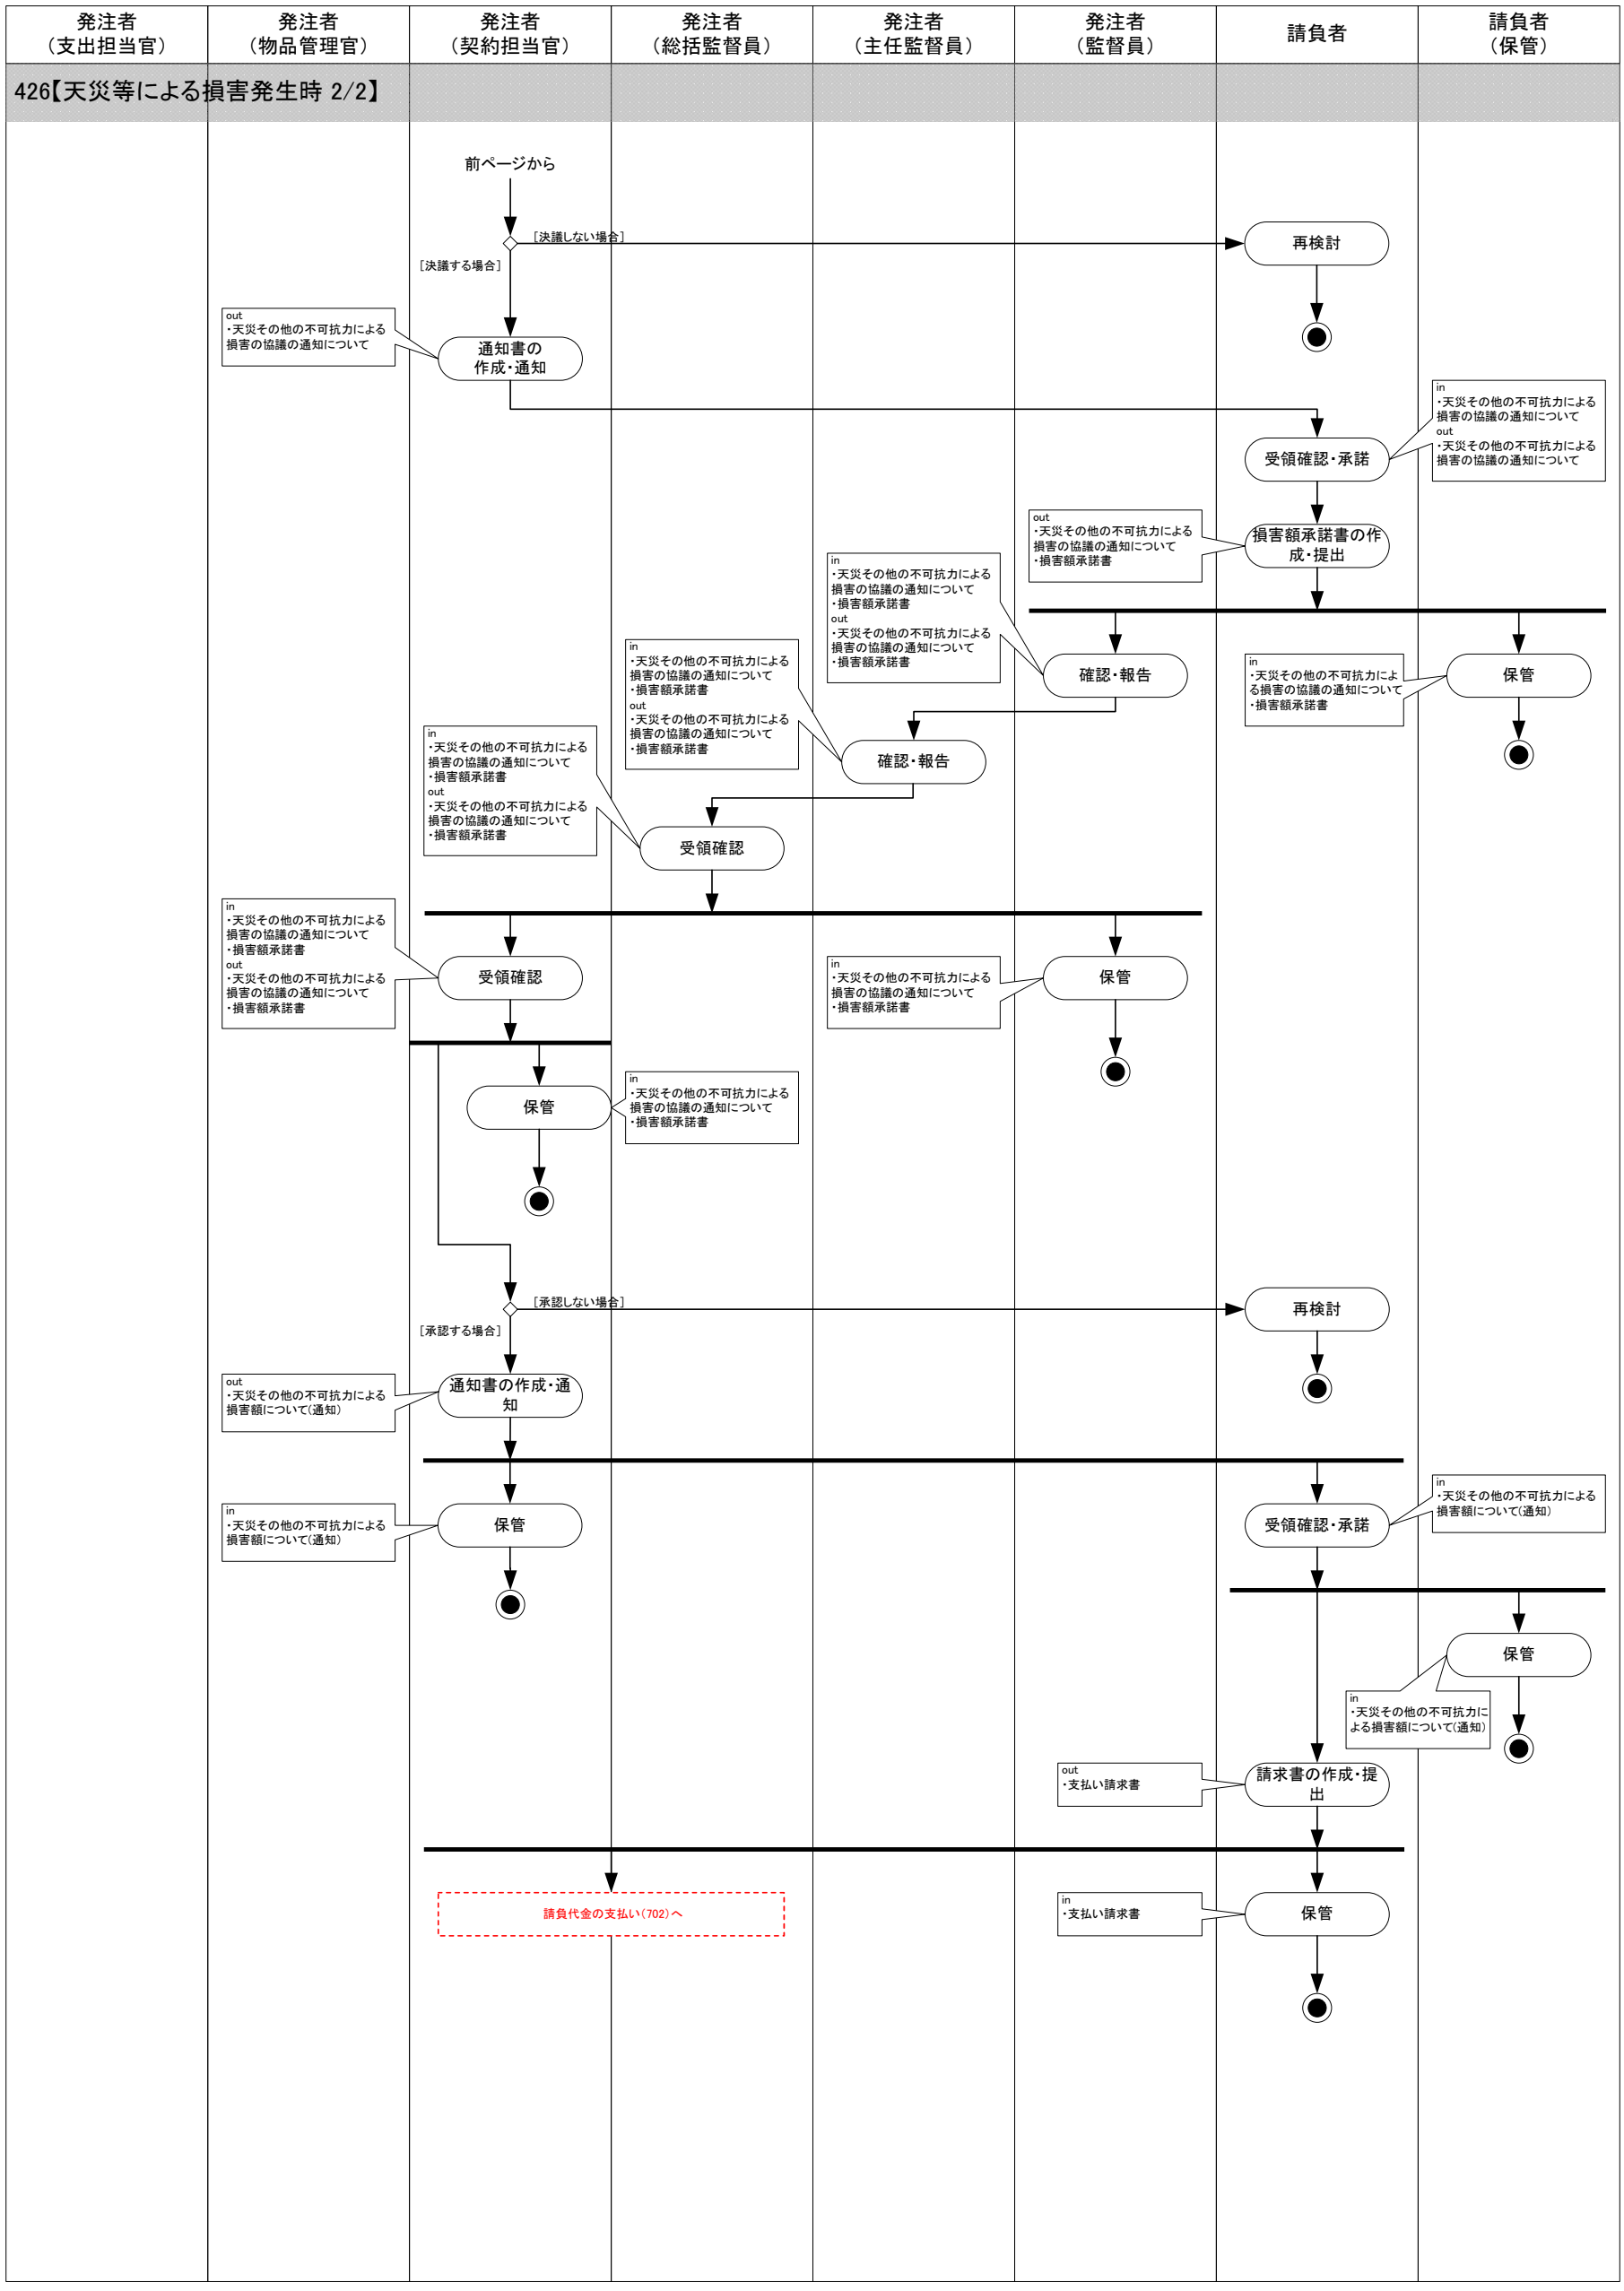

⑤精算

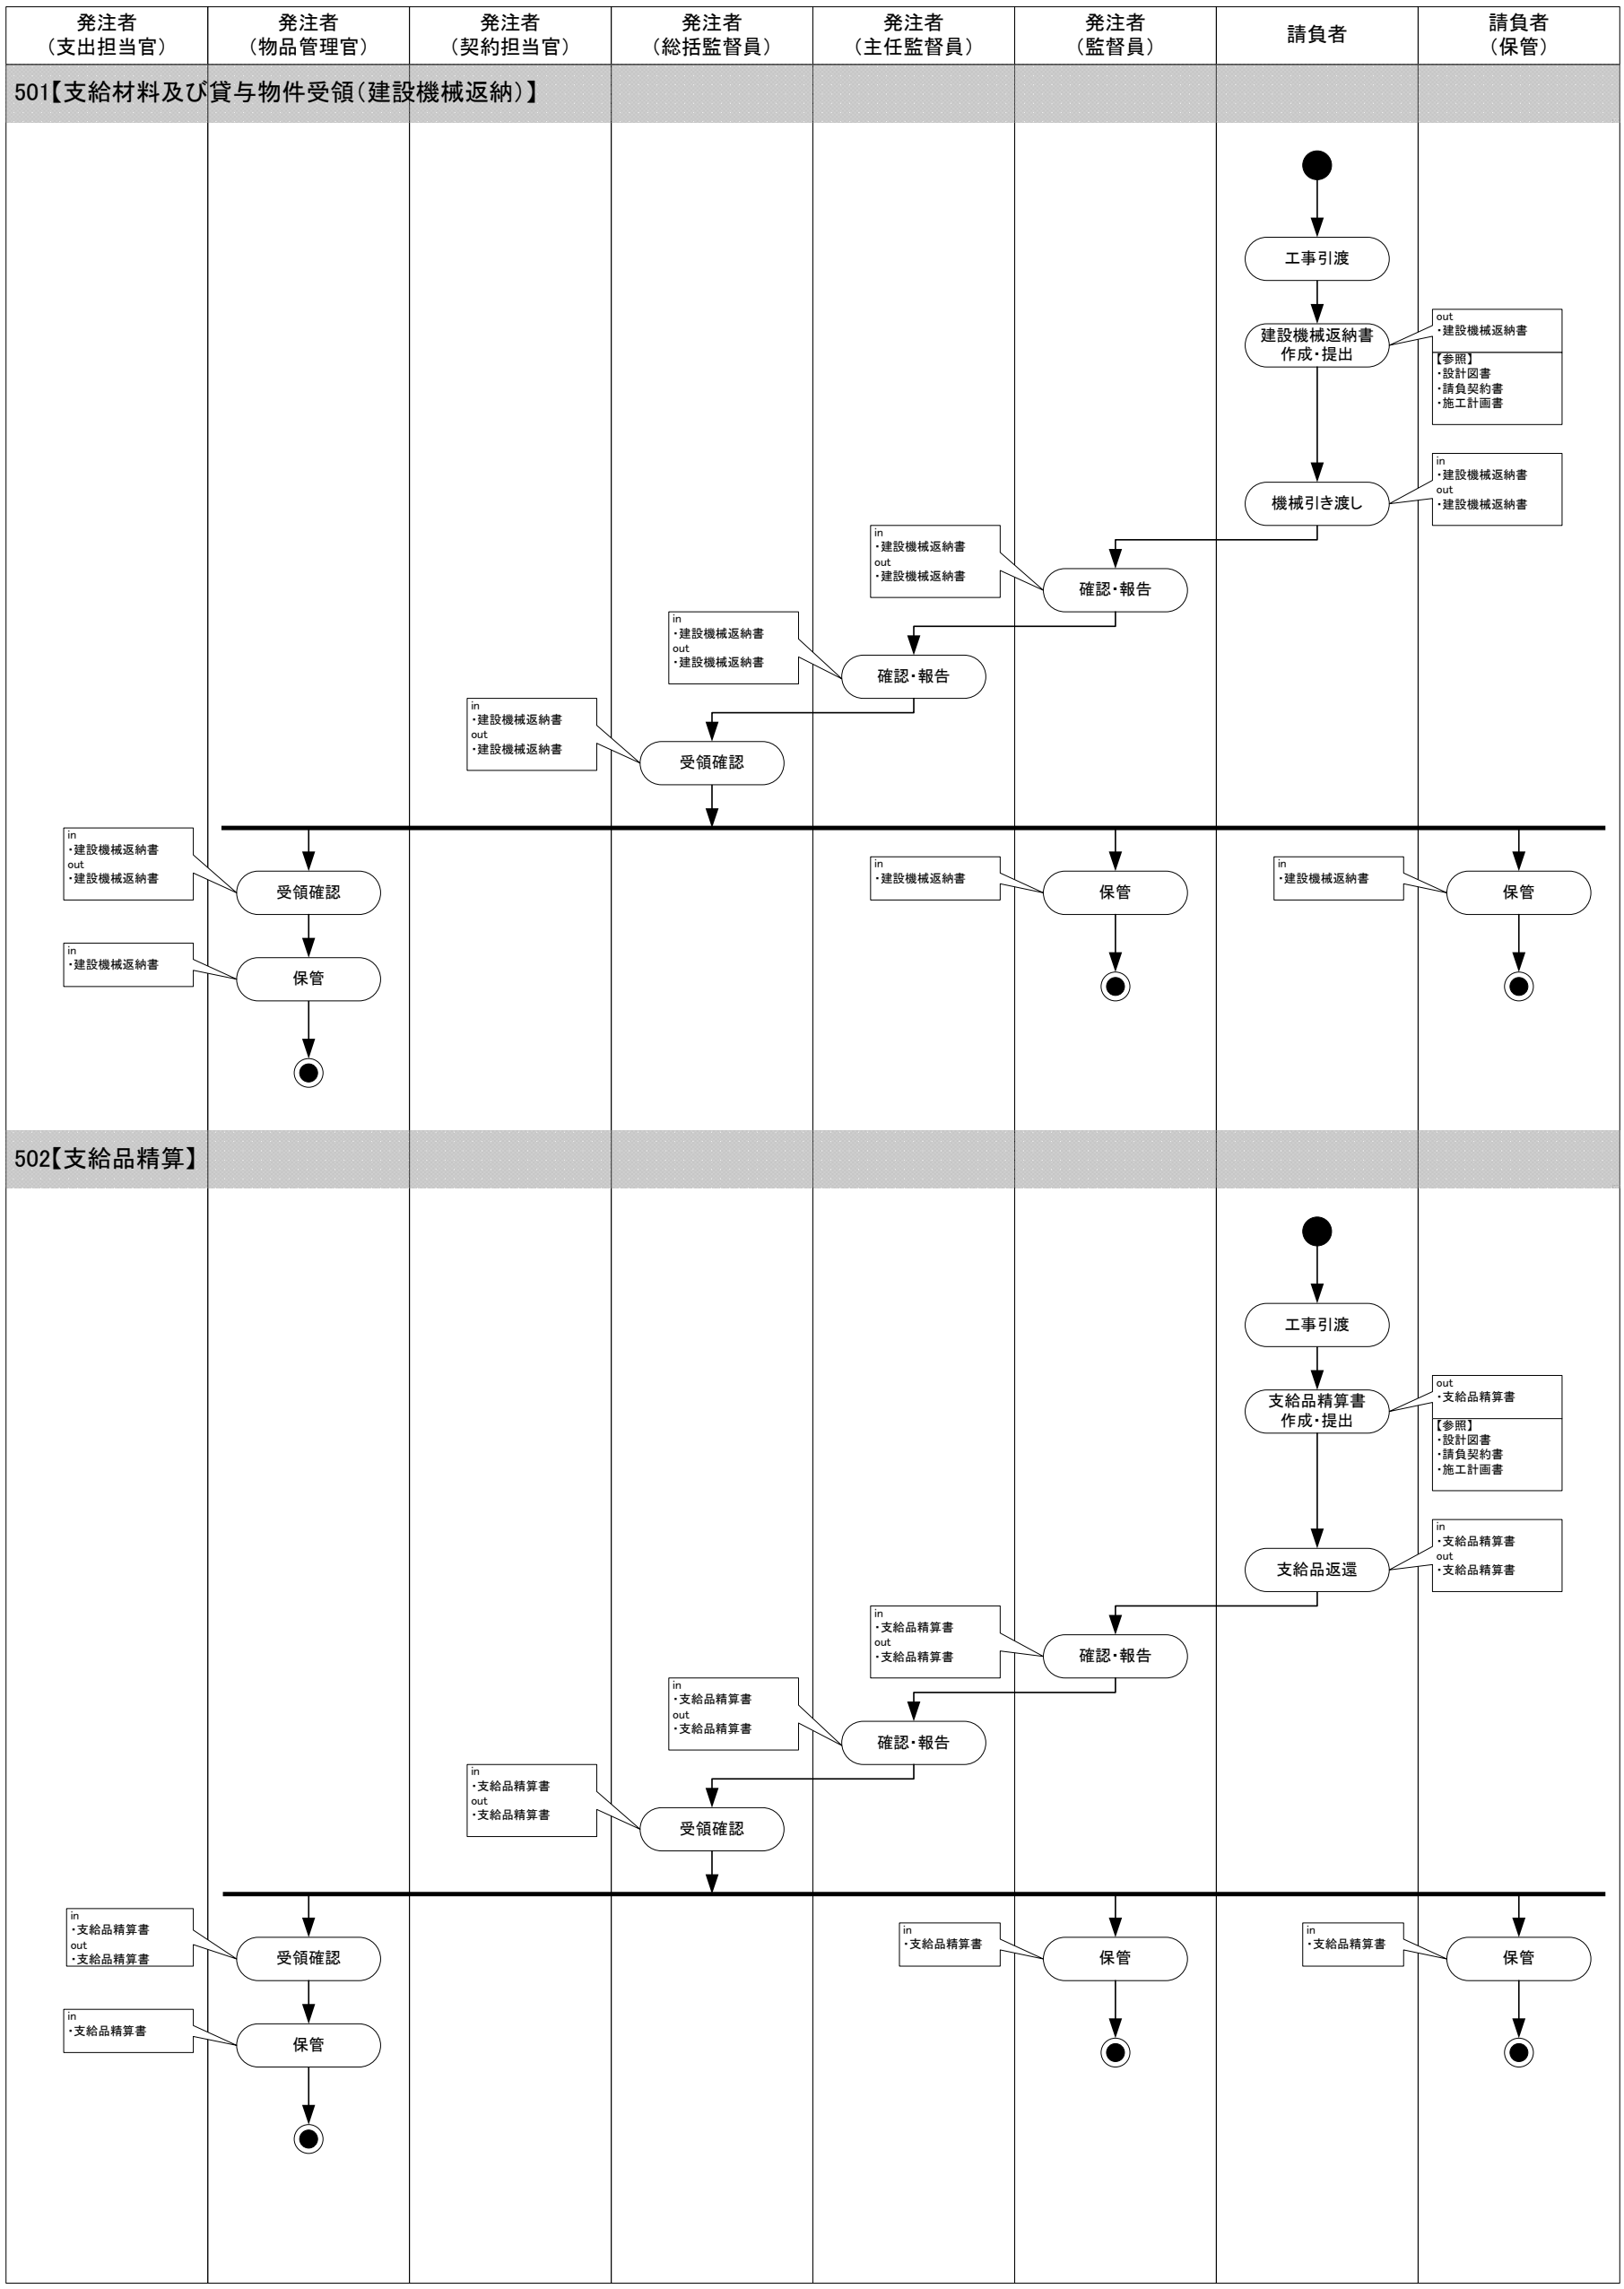
発注者（支出担当官）
発注者（物品管理官）
発注者（契約担当官）
発注者（総括監督員）
発注者（主任監督員）
発注者（監督員）
請負者
請負者（保管）
501【支給材料及び貸与物件受領（建設機械返納）】
工事引渡
建設機械返納書作成・提出
out ・建設機械返納書
【参照】 ・設計図書 ・請負契約書 ・施工計画書
機械引き渡し
in ・建設機械返納書 out ・建設機械返納書
確認・報告
受領確認
保管
502【支給品精算】
工事引渡
支給品精算書作成・提出
out ・支給品精算書
【参照】 ・設計図書 ・請負契約書 ・施工計画書
支給品返還
in ・支給品精算書 out ・支給品精算書
確認・報告
受領確認
保管

⑤精算

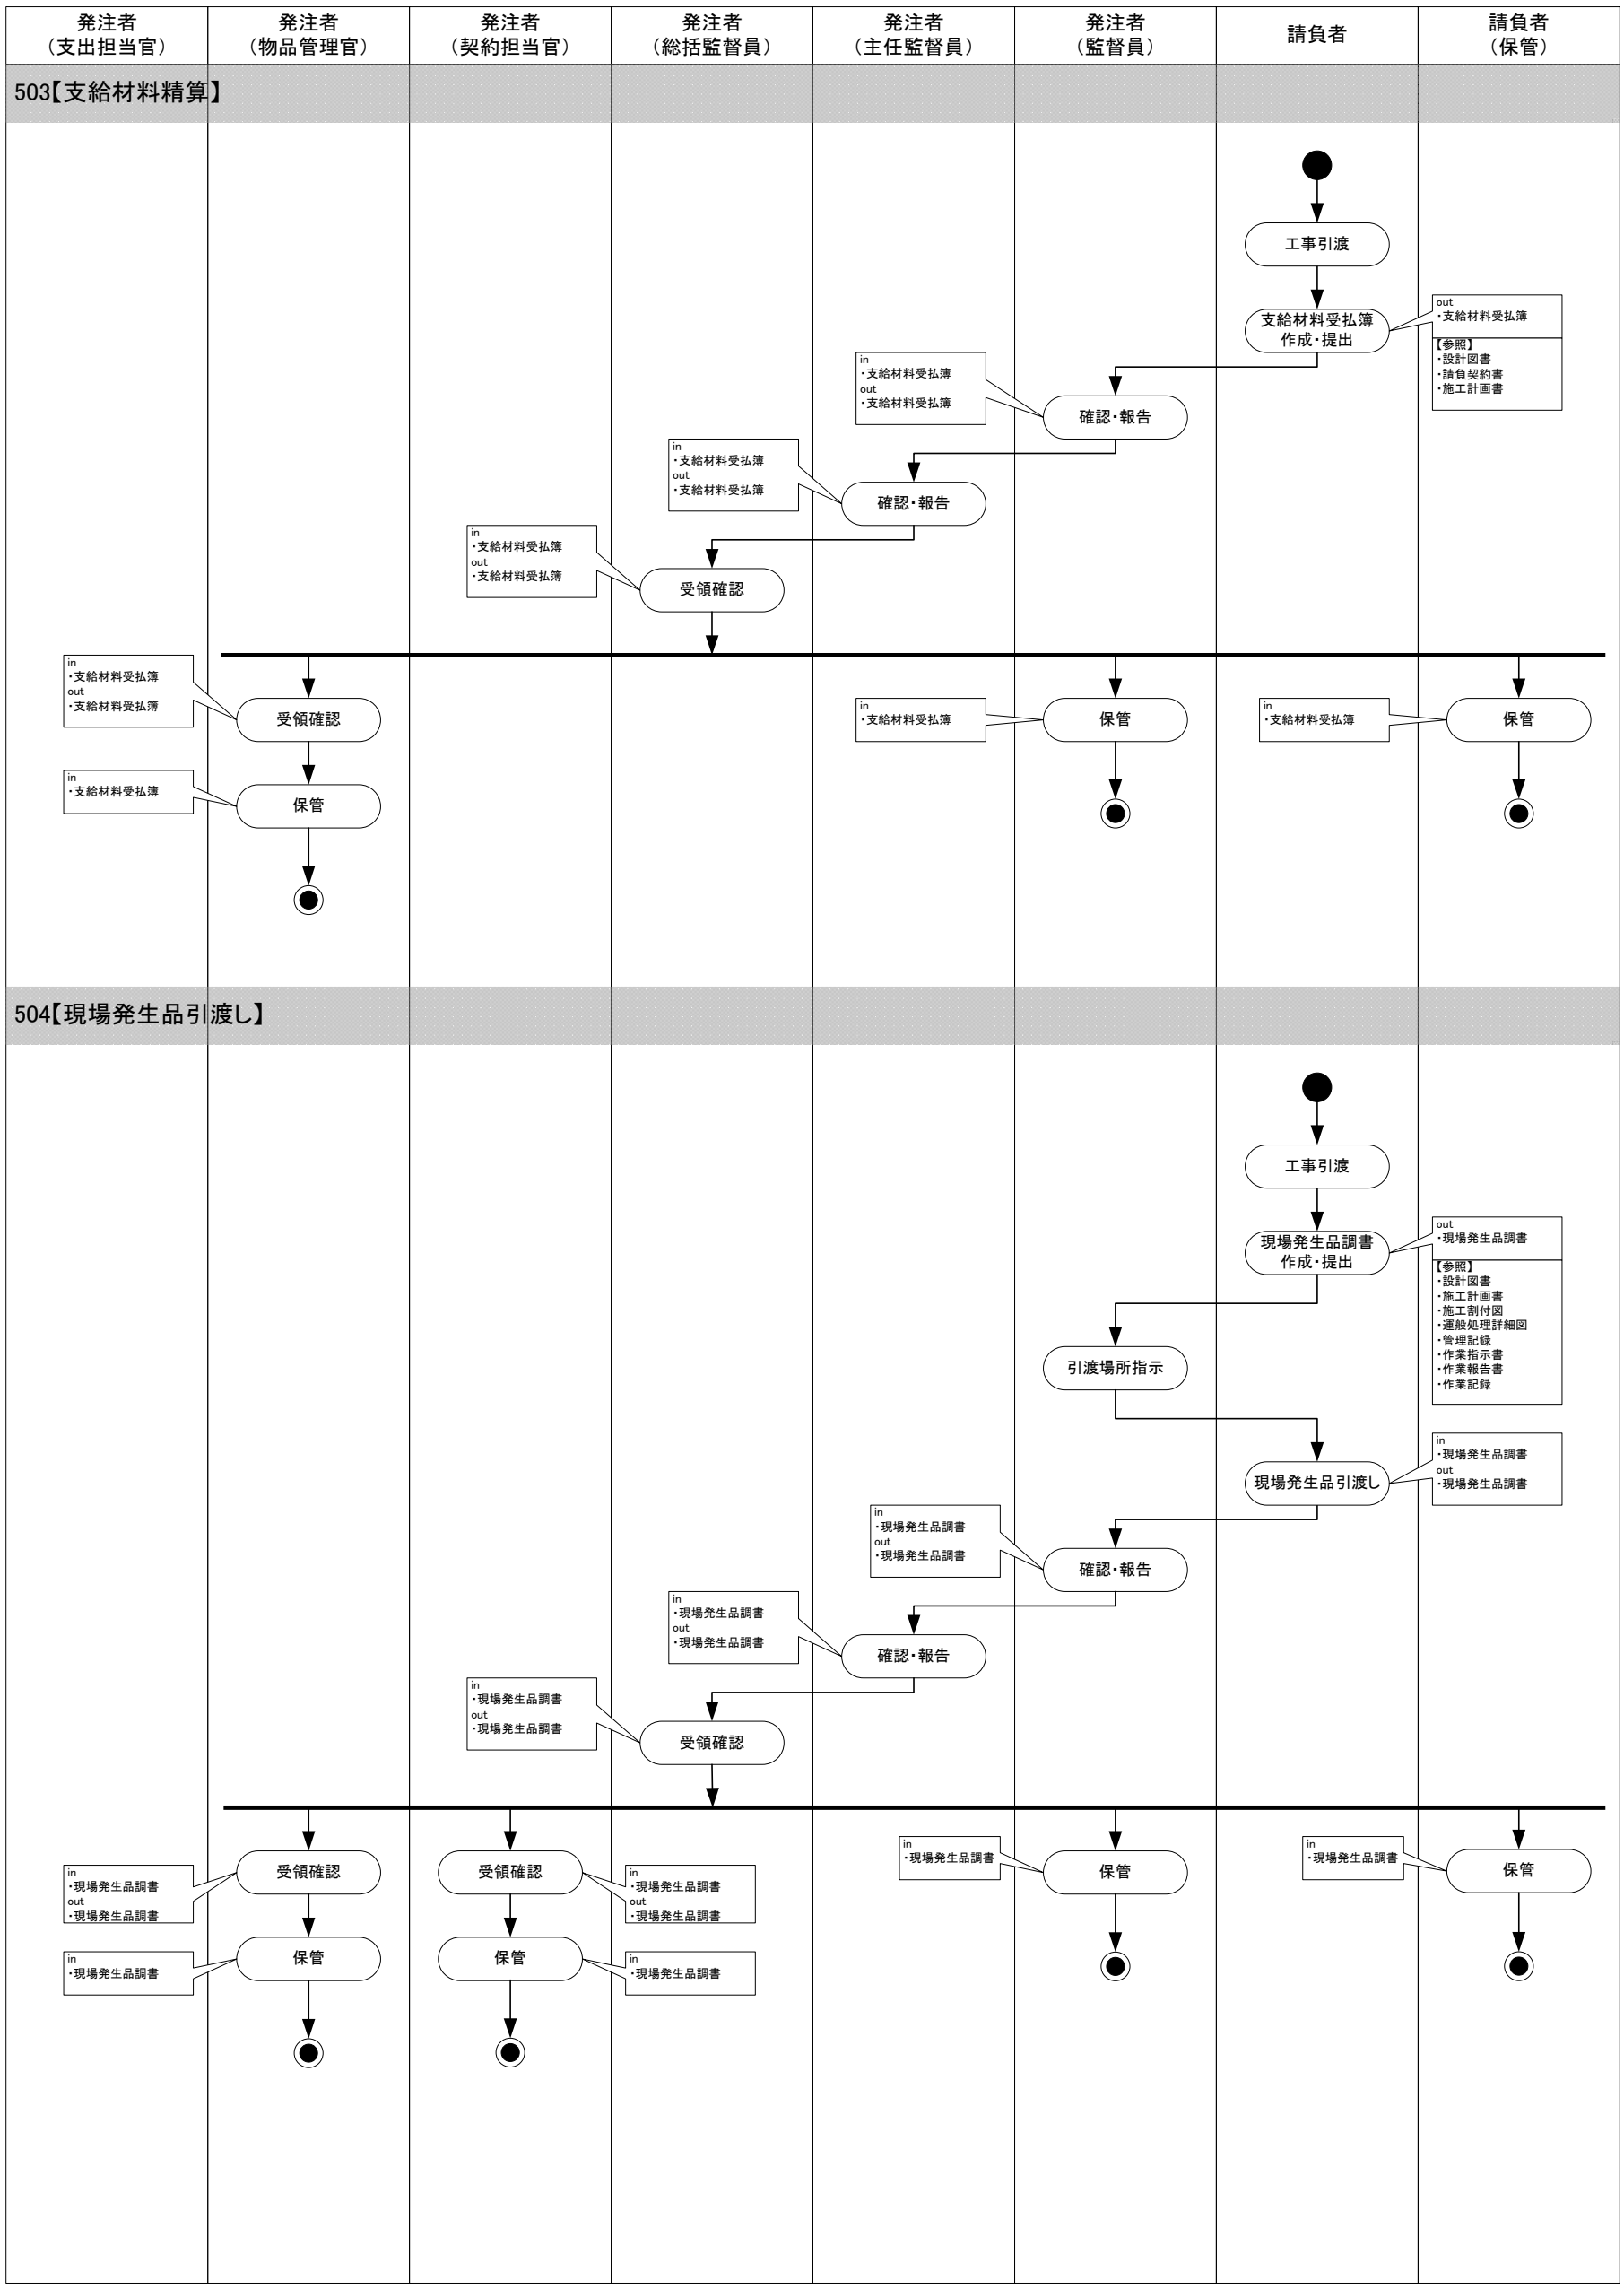
発注者（支出担当官）
発注者（物品管理官）
発注者（契約担当官）
発注者（総括監督員）
発注者（主任監督員）
発注者（監督員）
請負者
請負者（保管）
503【支給材料精算】
工事引渡
支給材料受払簿作成・提出
out ・支給材料受払簿
【参照】 ・設計図書 ・請負契約書 ・施工計画書
in ・支給材料受払簿 out ・支給材料受払簿
確認・報告
受領確認
保管
504【現場発生品引渡し】
現場発生品調書作成・提出
out ・現場発生品調書
【参照】 ・設計図書 ・施工計画書 ・施工割付図 ・運般処理詳細図 ・管理記録 ・作業指示書 ・作業報告書 ・作業記録
引渡場所指示
現場発生品引渡し
in ・現場発生品調書 out ・現場発生品調書
in ・現場発生品調書

⑥竣工・検査

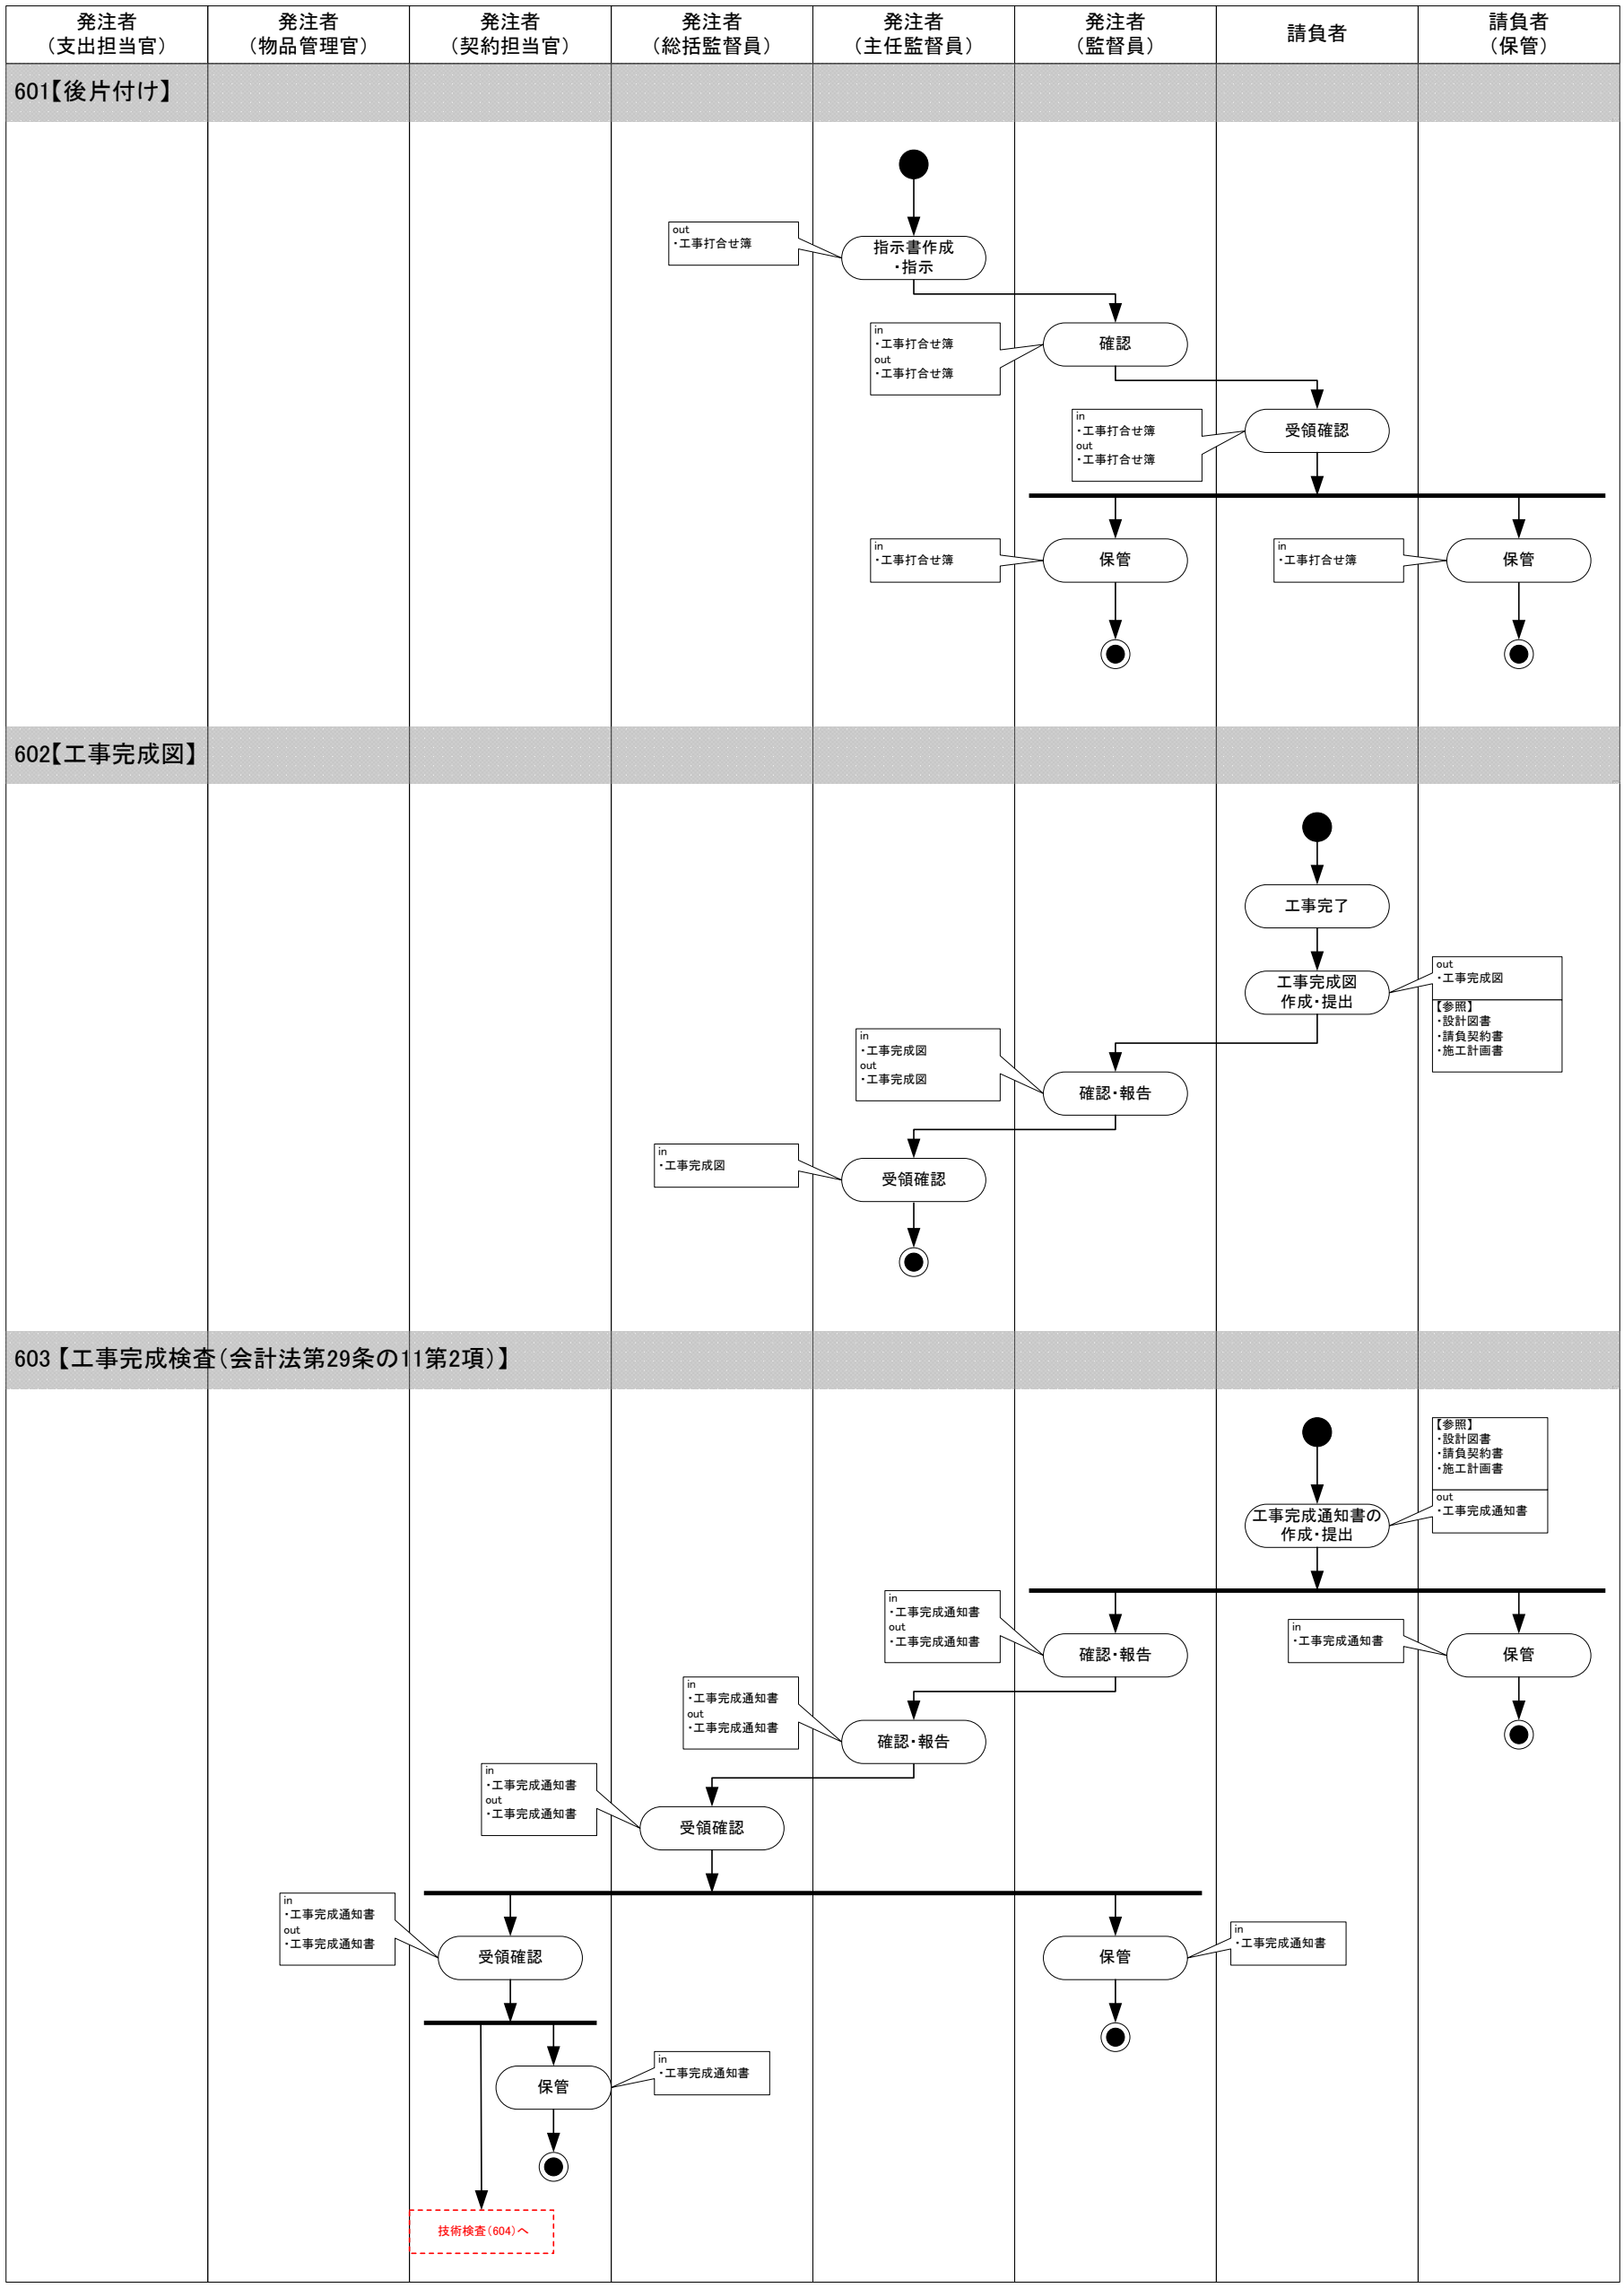
発注者（支出担当官）
発注者（物品管理官）
発注者（契約担当官）
発注者（総括監督員）
発注者（主任監督員）
発注者（監督員）
請負者
請負者（保管）
601【後片付け】
out
・工事打合せ簿
指示書作成
・指示
in
・工事打合せ簿
out
・工事打合せ簿
確認
in
・工事打合せ簿
out
・工事打合せ簿
受領確認
in
・工事打合せ簿
保管
in
・工事打合せ簿
保管
602【工事完成図】
工事完了
工事完成図
作成・提出
out
・工事完成図
【参照】
・設計図書
・請負契約書
・施工計画書
in
・工事完成図
out
・工事完成図
確認・報告
in
・工事完成図
受領確認
603【工事完成検査（会計法第29条の11第2項）】
【参照】
・設計図書
・請負契約書
・施工計画書
工事完成通知書の
作成・提出
out
・工事完成通知書
in
・工事完成通知書
out
・工事完成通知書
確認・報告
in
・工事完成通知書
保管
in
・工事完成通知書
out
・工事完成通知書
確認・報告
in
・工事完成通知書
out
・工事完成通知書
受領確認
in
・工事完成通知書
out
・工事完成通知書
受領確認
in
・工事完成通知書
保管
保管
in
・工事完成通知書
技術検査（604）へ

⑥竣工・検査

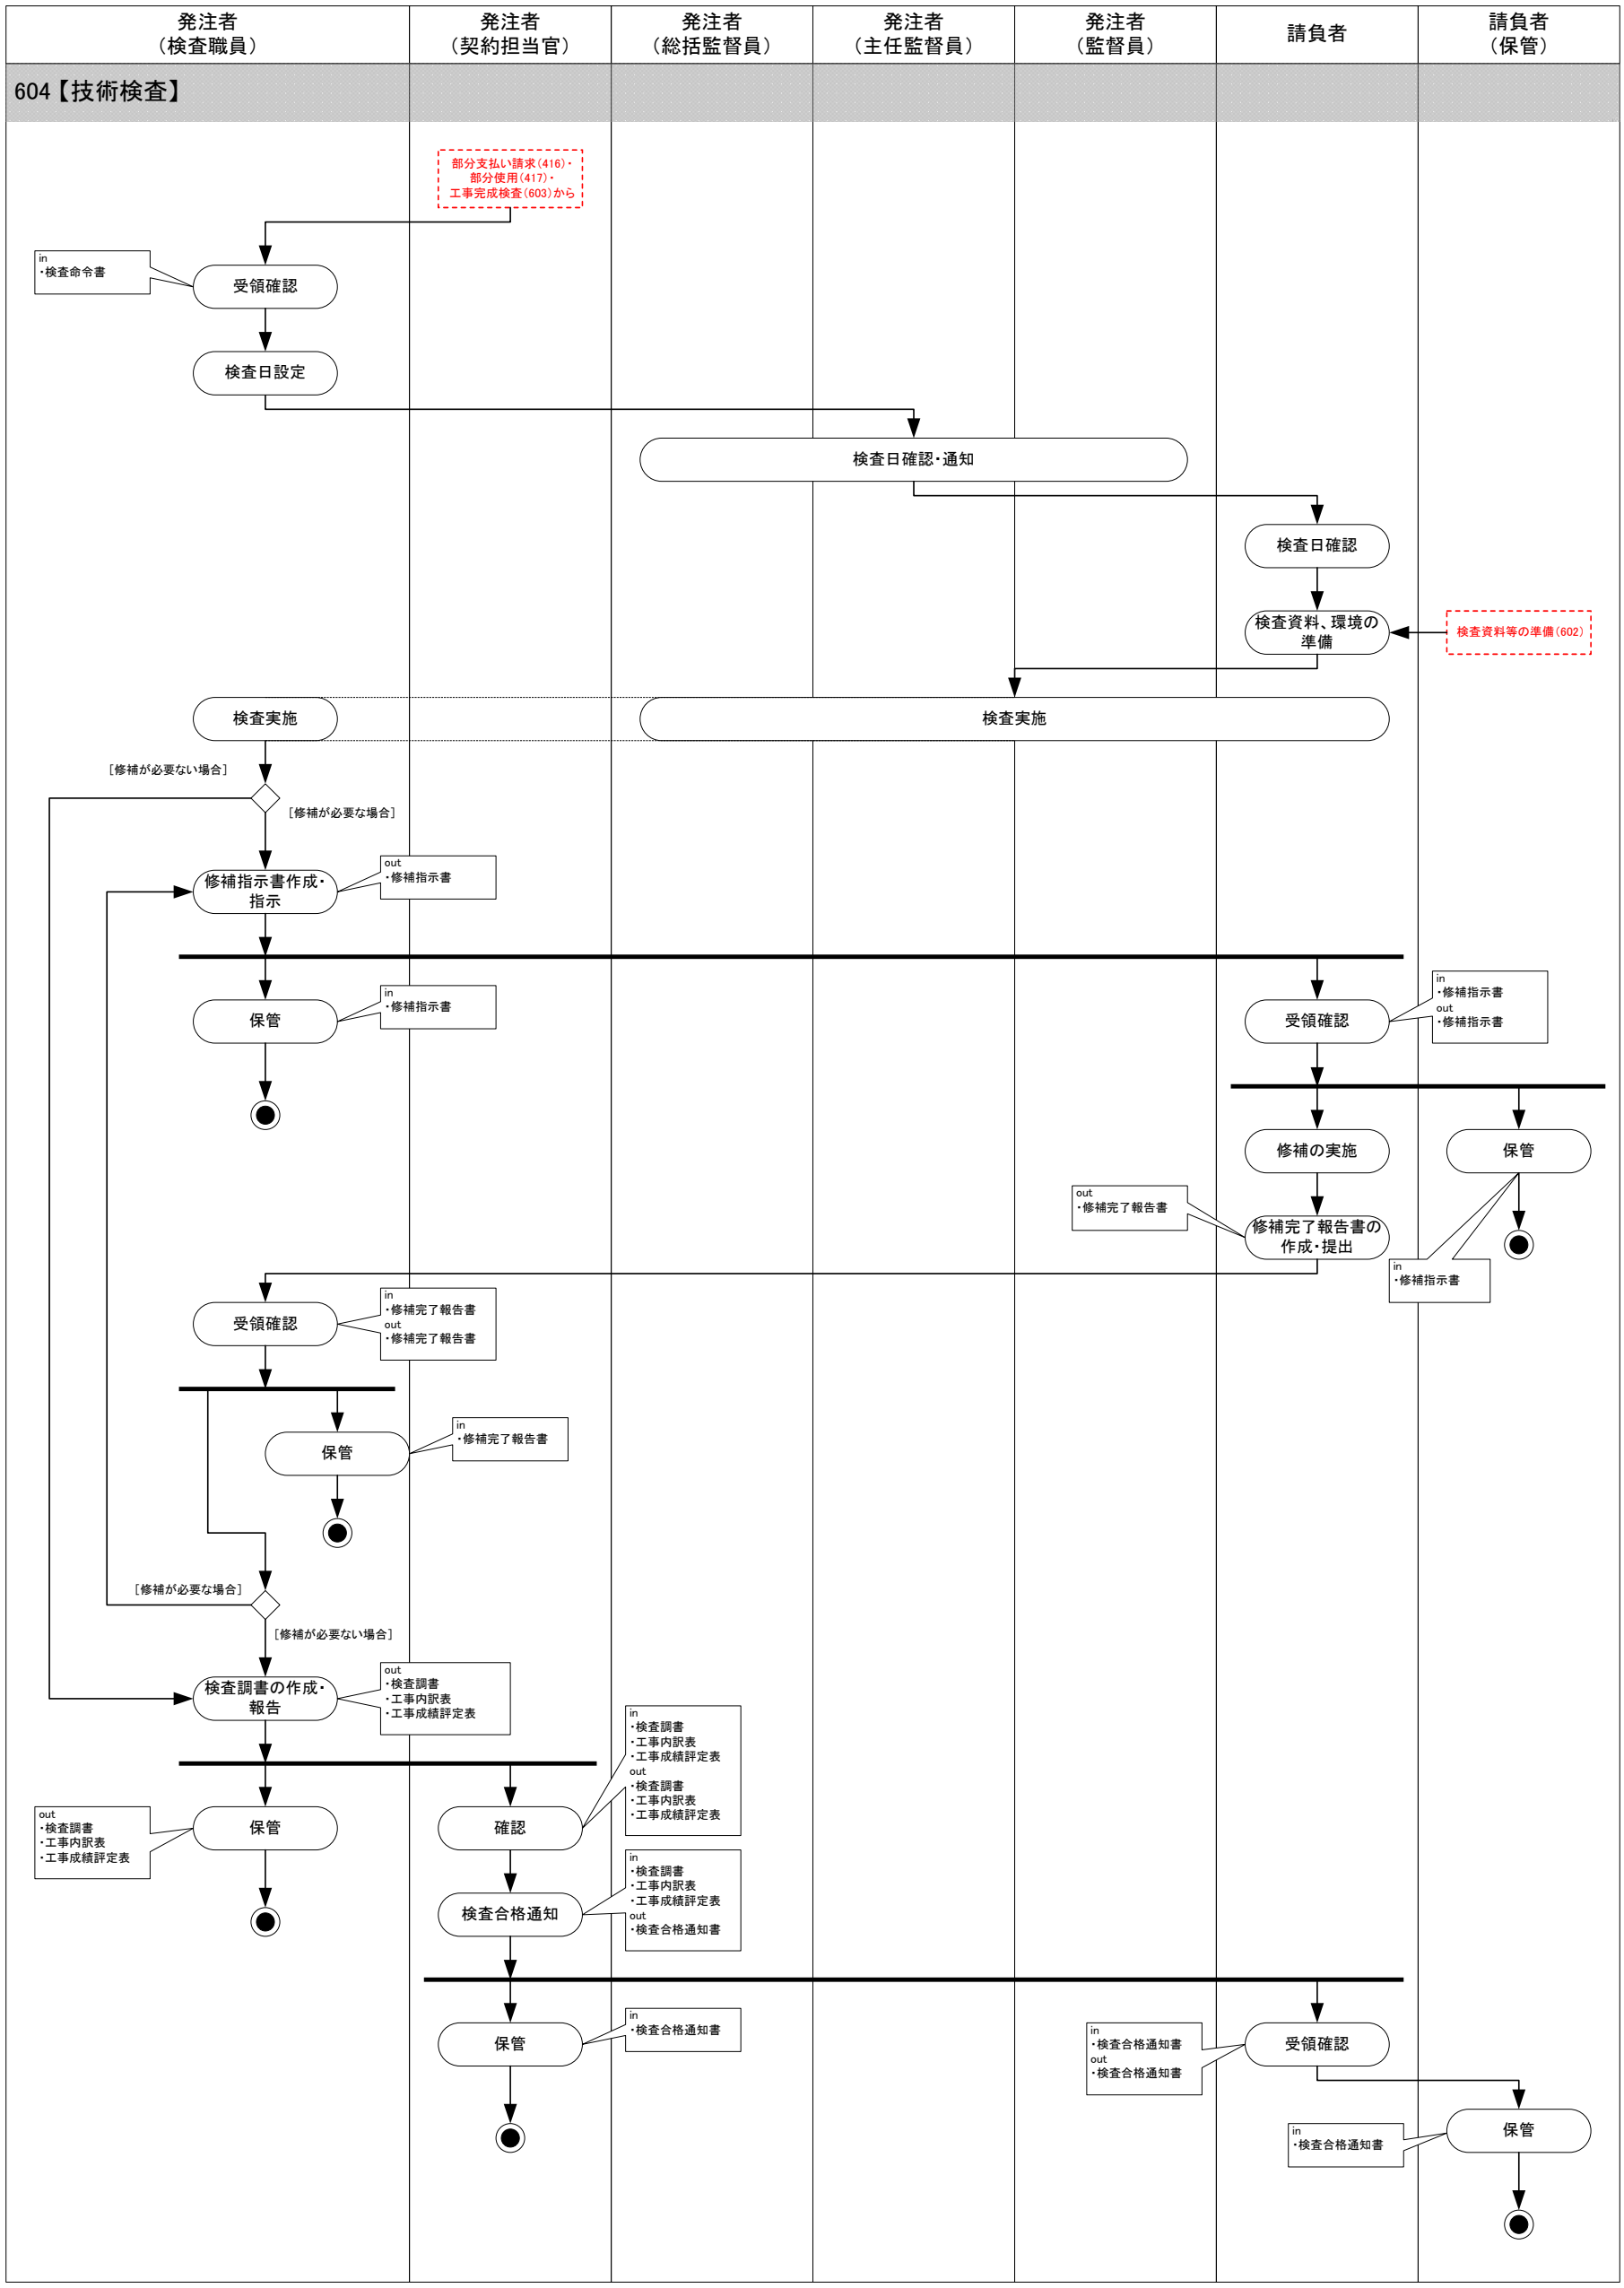
発注者（検査職員）
発注者（契約担当官）
発注者（総括監督員）
発注者（主任監督員）
発注者（監督員）
請負者
請負者（保管）
604【技術検査】
部分支払い請求(416)・部分使用(417)・工事完成検査(603)から
in ・検査命令書
受領確認
検査日設定
検査日確認・通知
検査日確認
検査資料、環境の準備
検査資料等の準備(602)
検査実施
検査実施
［修補が必要ない場合］
［修補が必要な場合］
修補指示書作成・指示
out ・修補指示書
保管
in ・修補指示書
受領確認
in ・修補指示書 out ・修補指示書
修補の実施
保管
out ・修補完了報告書
修補完了報告書の作成・提出
in ・修補指示書
受領確認
in ・修補完了報告書 out ・修補完了報告書
保管
in ・修補完了報告書
［修補が必要な場合］
［修補が必要ない場合］
検査調書の作成・報告
out ・検査調書 ・工事内訳表 ・工事成績評定表
保管
out ・検査調書 ・工事内訳表 ・工事成績評定表
確認
in ・検査調書 ・工事内訳表 ・工事成績評定表 out ・検査調書 ・工事内訳表 ・工事成績評定表
検査合格通知
in ・検査調書 ・工事内訳表 ・工事成績評定表 out ・検査合格通知書
保管
in ・検査合格通知書
in ・検査合格通知書 out ・検査合格通知書
受領確認
in ・検査合格通知書
保管

⑥竣工・検査

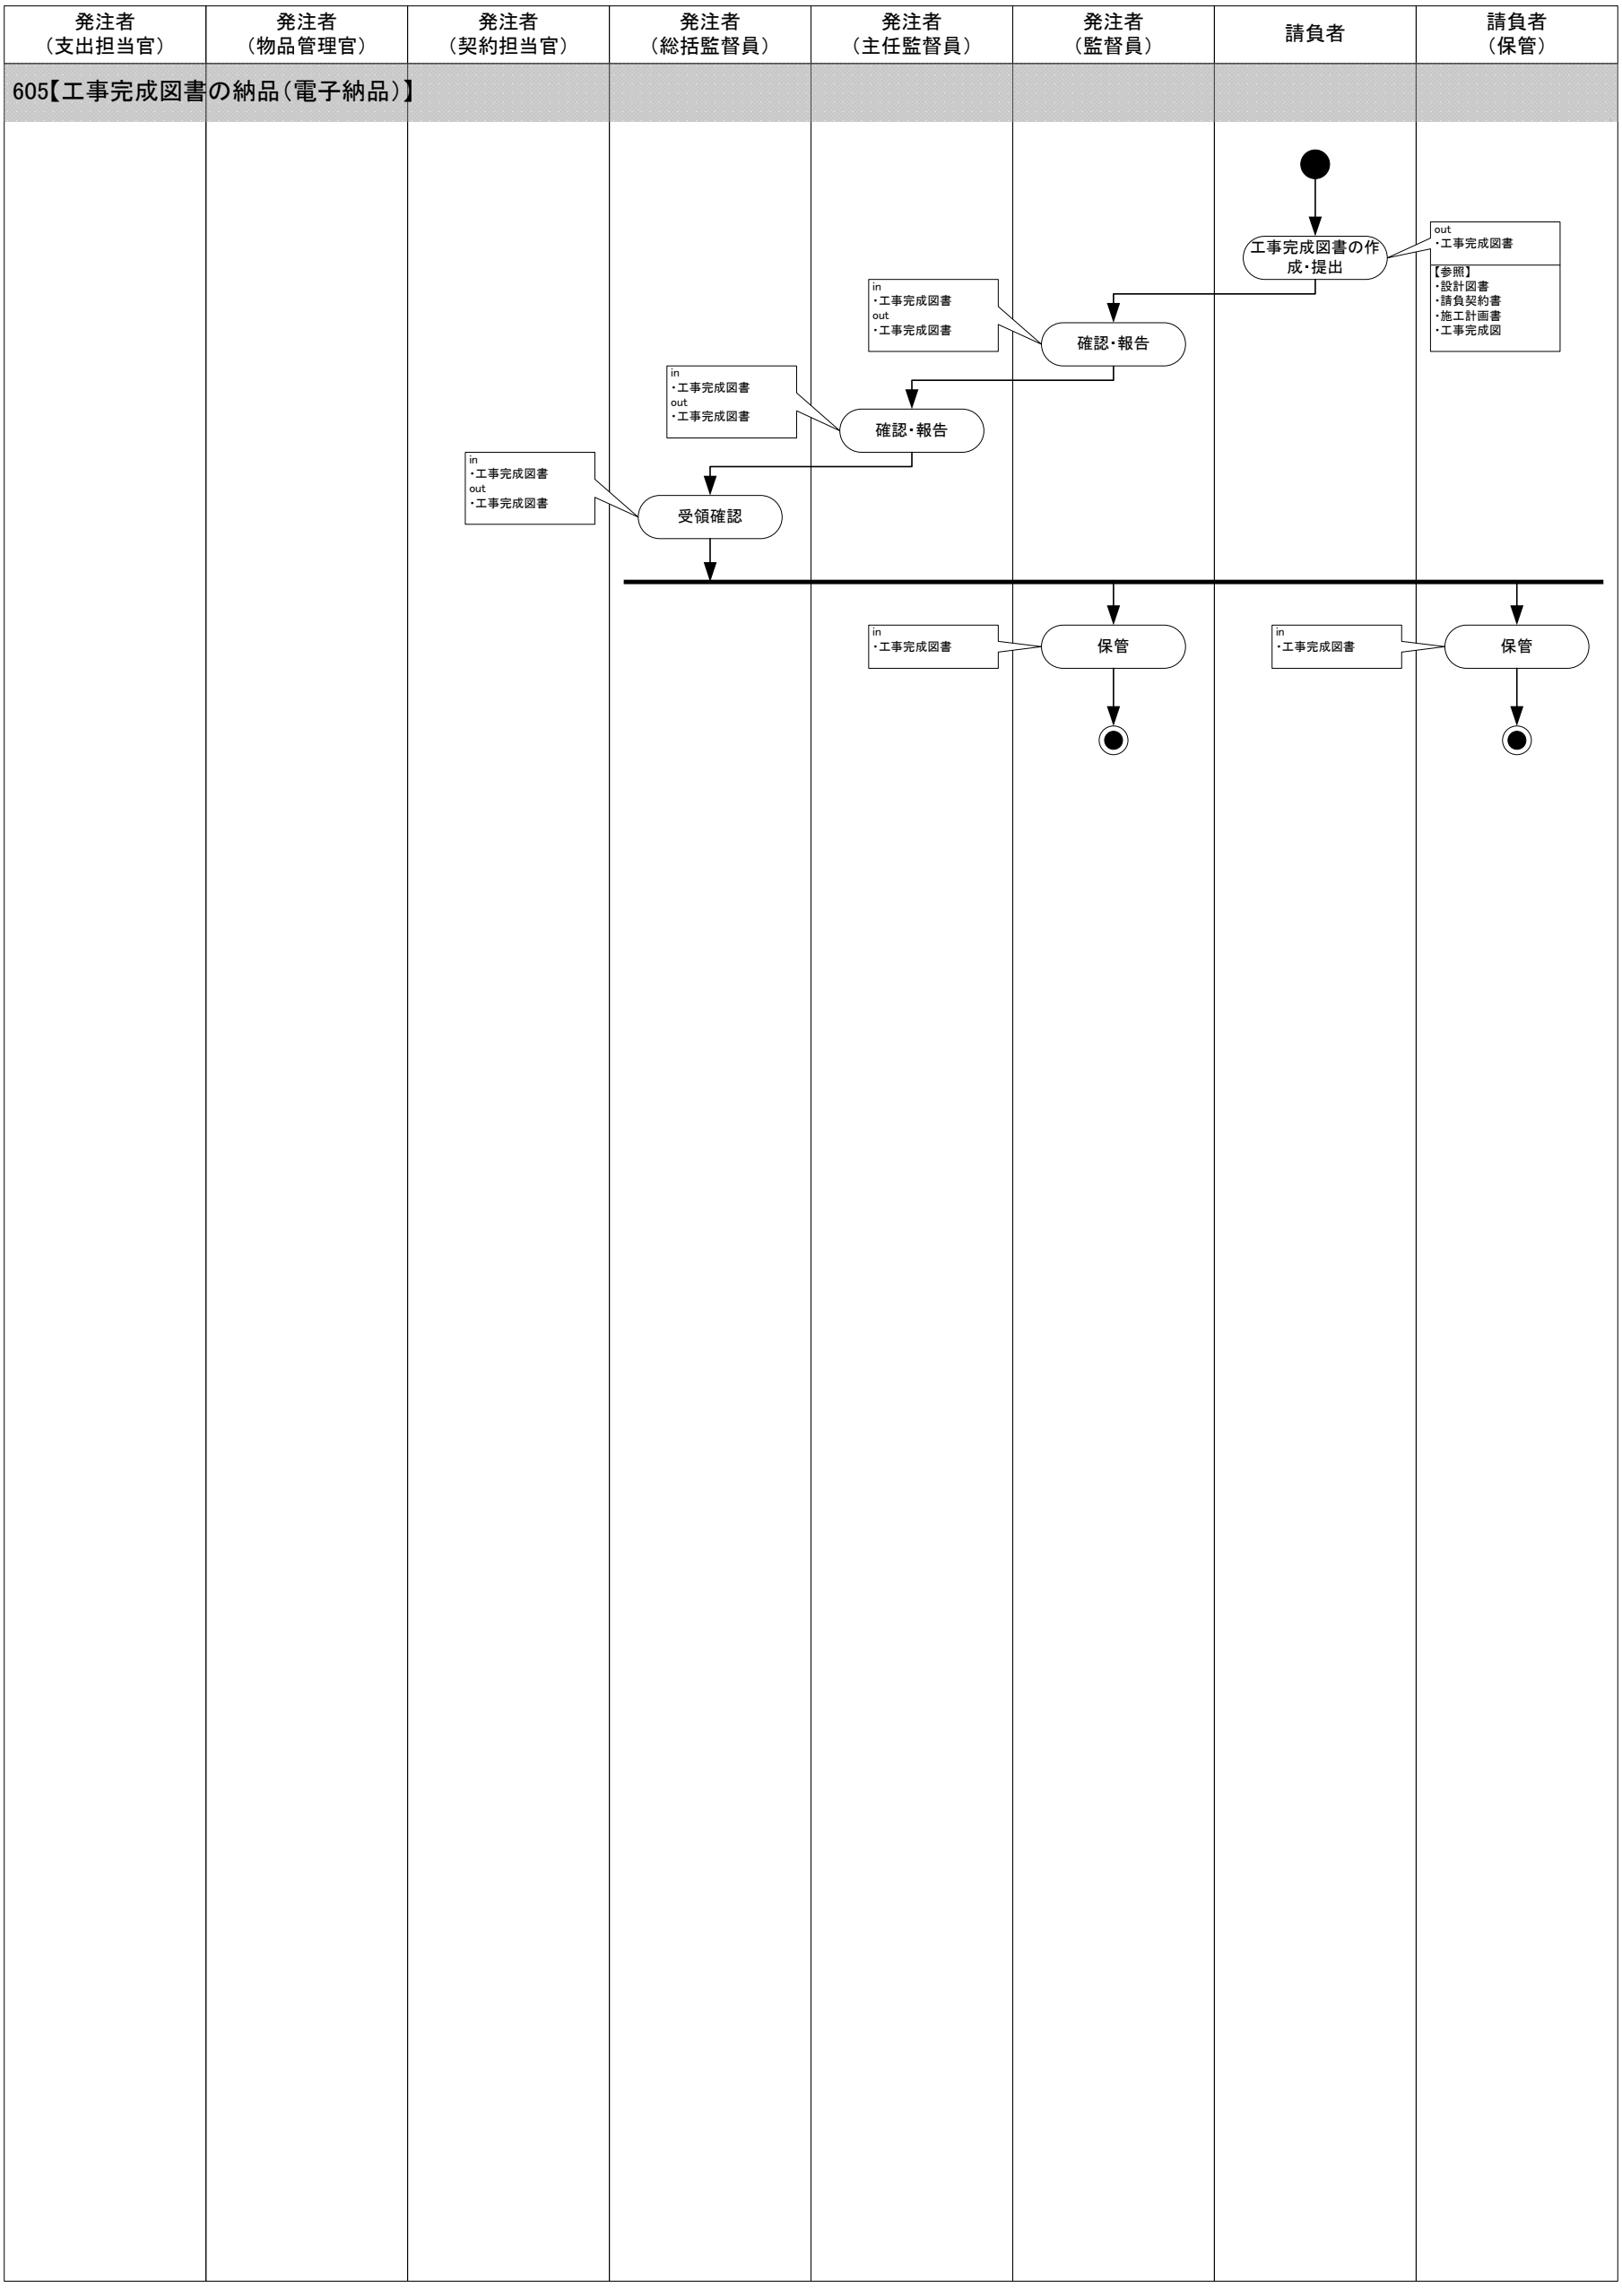
発注者
（支出担当官）
発注者
（物品管理官）
発注者
（契約担当官）
発注者
（総括監督員）
発注者
（主任監督員）
発注者
（監督員）
請負者
請負者
（保管）
605【工事完成図書の納品（電子納品）】
工事完成図書の作成・提出
out
・工事完成図書
【参照】
・設計図書
・請負契約書
・施工計画書
・工事完成図
in
・工事完成図書
out
・工事完成図書
確認・報告
in
・工事完成図書
out
・工事完成図書
確認・報告
in
・工事完成図書
out
・工事完成図書
受領確認
in
・工事完成図書
保管
in
・工事完成図書
保管

⑥竣工・検査

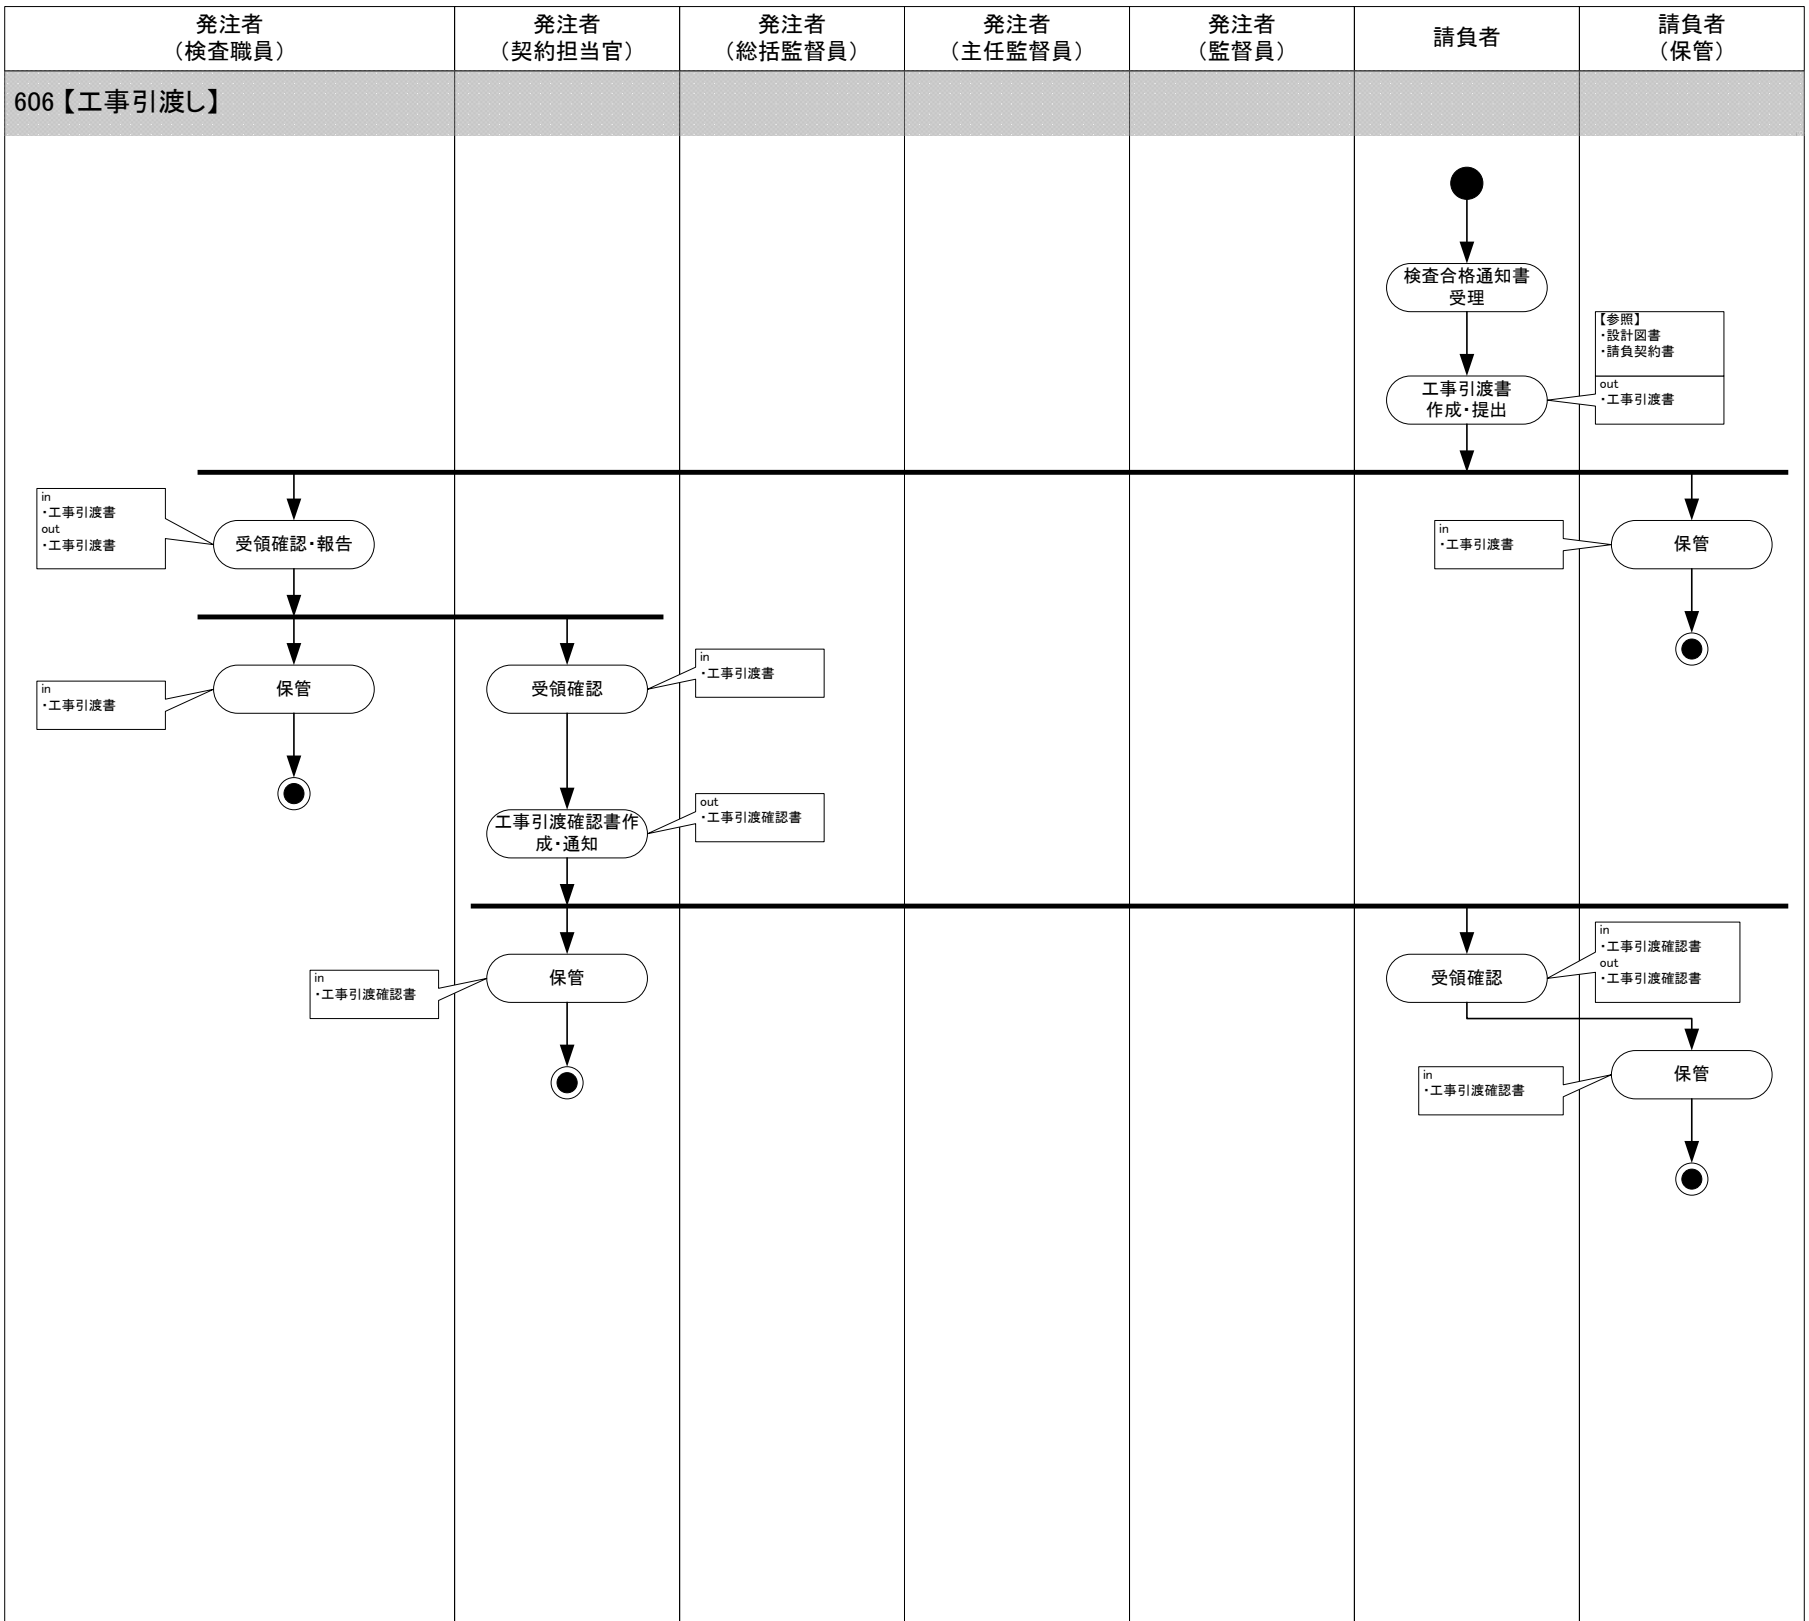
発注者
（検査職員）
発注者
（契約担当官）
発注者
（総括監督員）
発注者
（主任監督員）
発注者
（監督員）
請負者
請負者
（保管）
606【工事引渡し】
検査合格通知書
受理
工事引渡書
作成・提出
【参照】
・設計図書
・請負契約書
out
・工事引渡書
in
・工事引渡書
out
・工事引渡書
受領確認・報告
in
・工事引渡書
保管
in
・工事引渡書
保管
受領確認
in
・工事引渡書
工事引渡確認書作
成・通知
out
・工事引渡確認書
in
・工事引渡確認書
保管
in
・工事引渡確認書
受領確認
in
・工事引渡確認書
out
・工事引渡確認書
in
・工事引渡確認書
保管

⑦支払

発注者 （支出担当官）	発注者 （物品管理官）	発注者 （契約担当官）	発注者 （総括監督員）	発注者 （主任監督員）	発注者 （監督員）	請負者	請負者 （保管）
701【完成支払い請求】							
					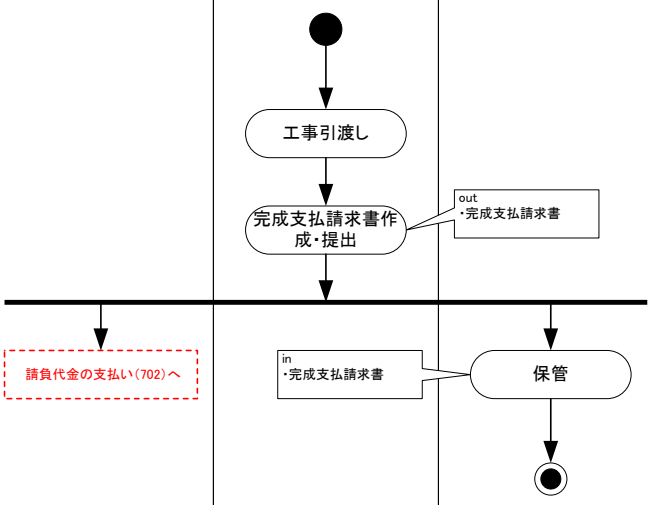		
702【請負代金の支払い】							
		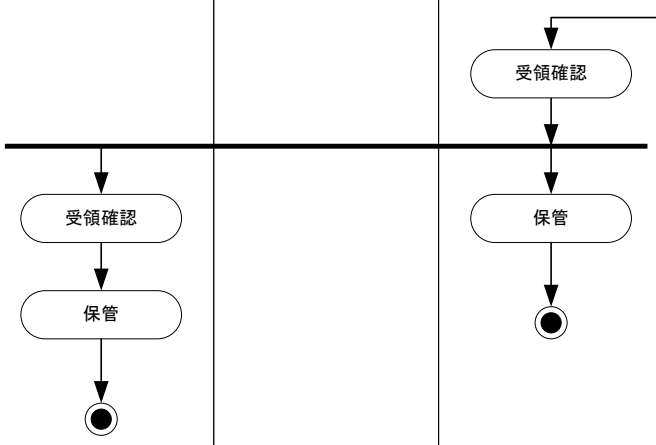					

巻末資料 2-2　受発注者間の行為別の業務プロセス

代表的なワークフロー（土木工事共通仕様書）

発注者 （支出担当官）	発注者 （物品管理官）	発注者 （契約担当官）	発注者 （総括監督員）	発注者 （主任監督員）	発注者 （監督員）	請負者	請負者 （保管）
【指示】							
					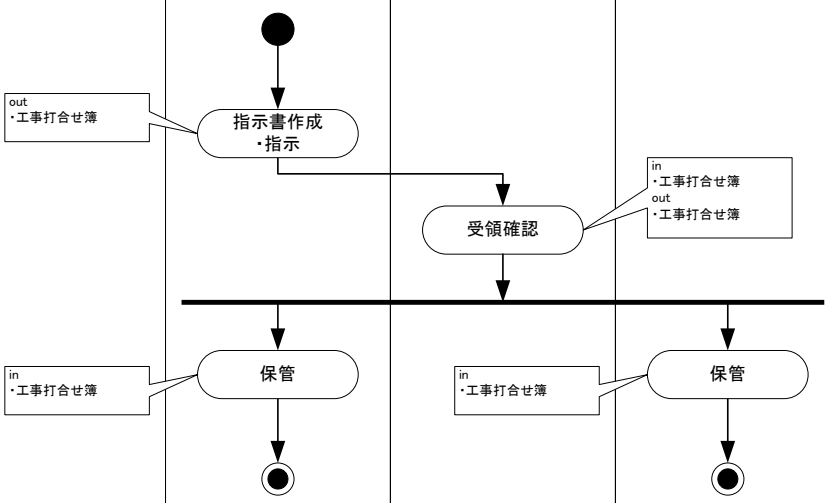		

代表的なワークフロー（土木工事共通仕様書）

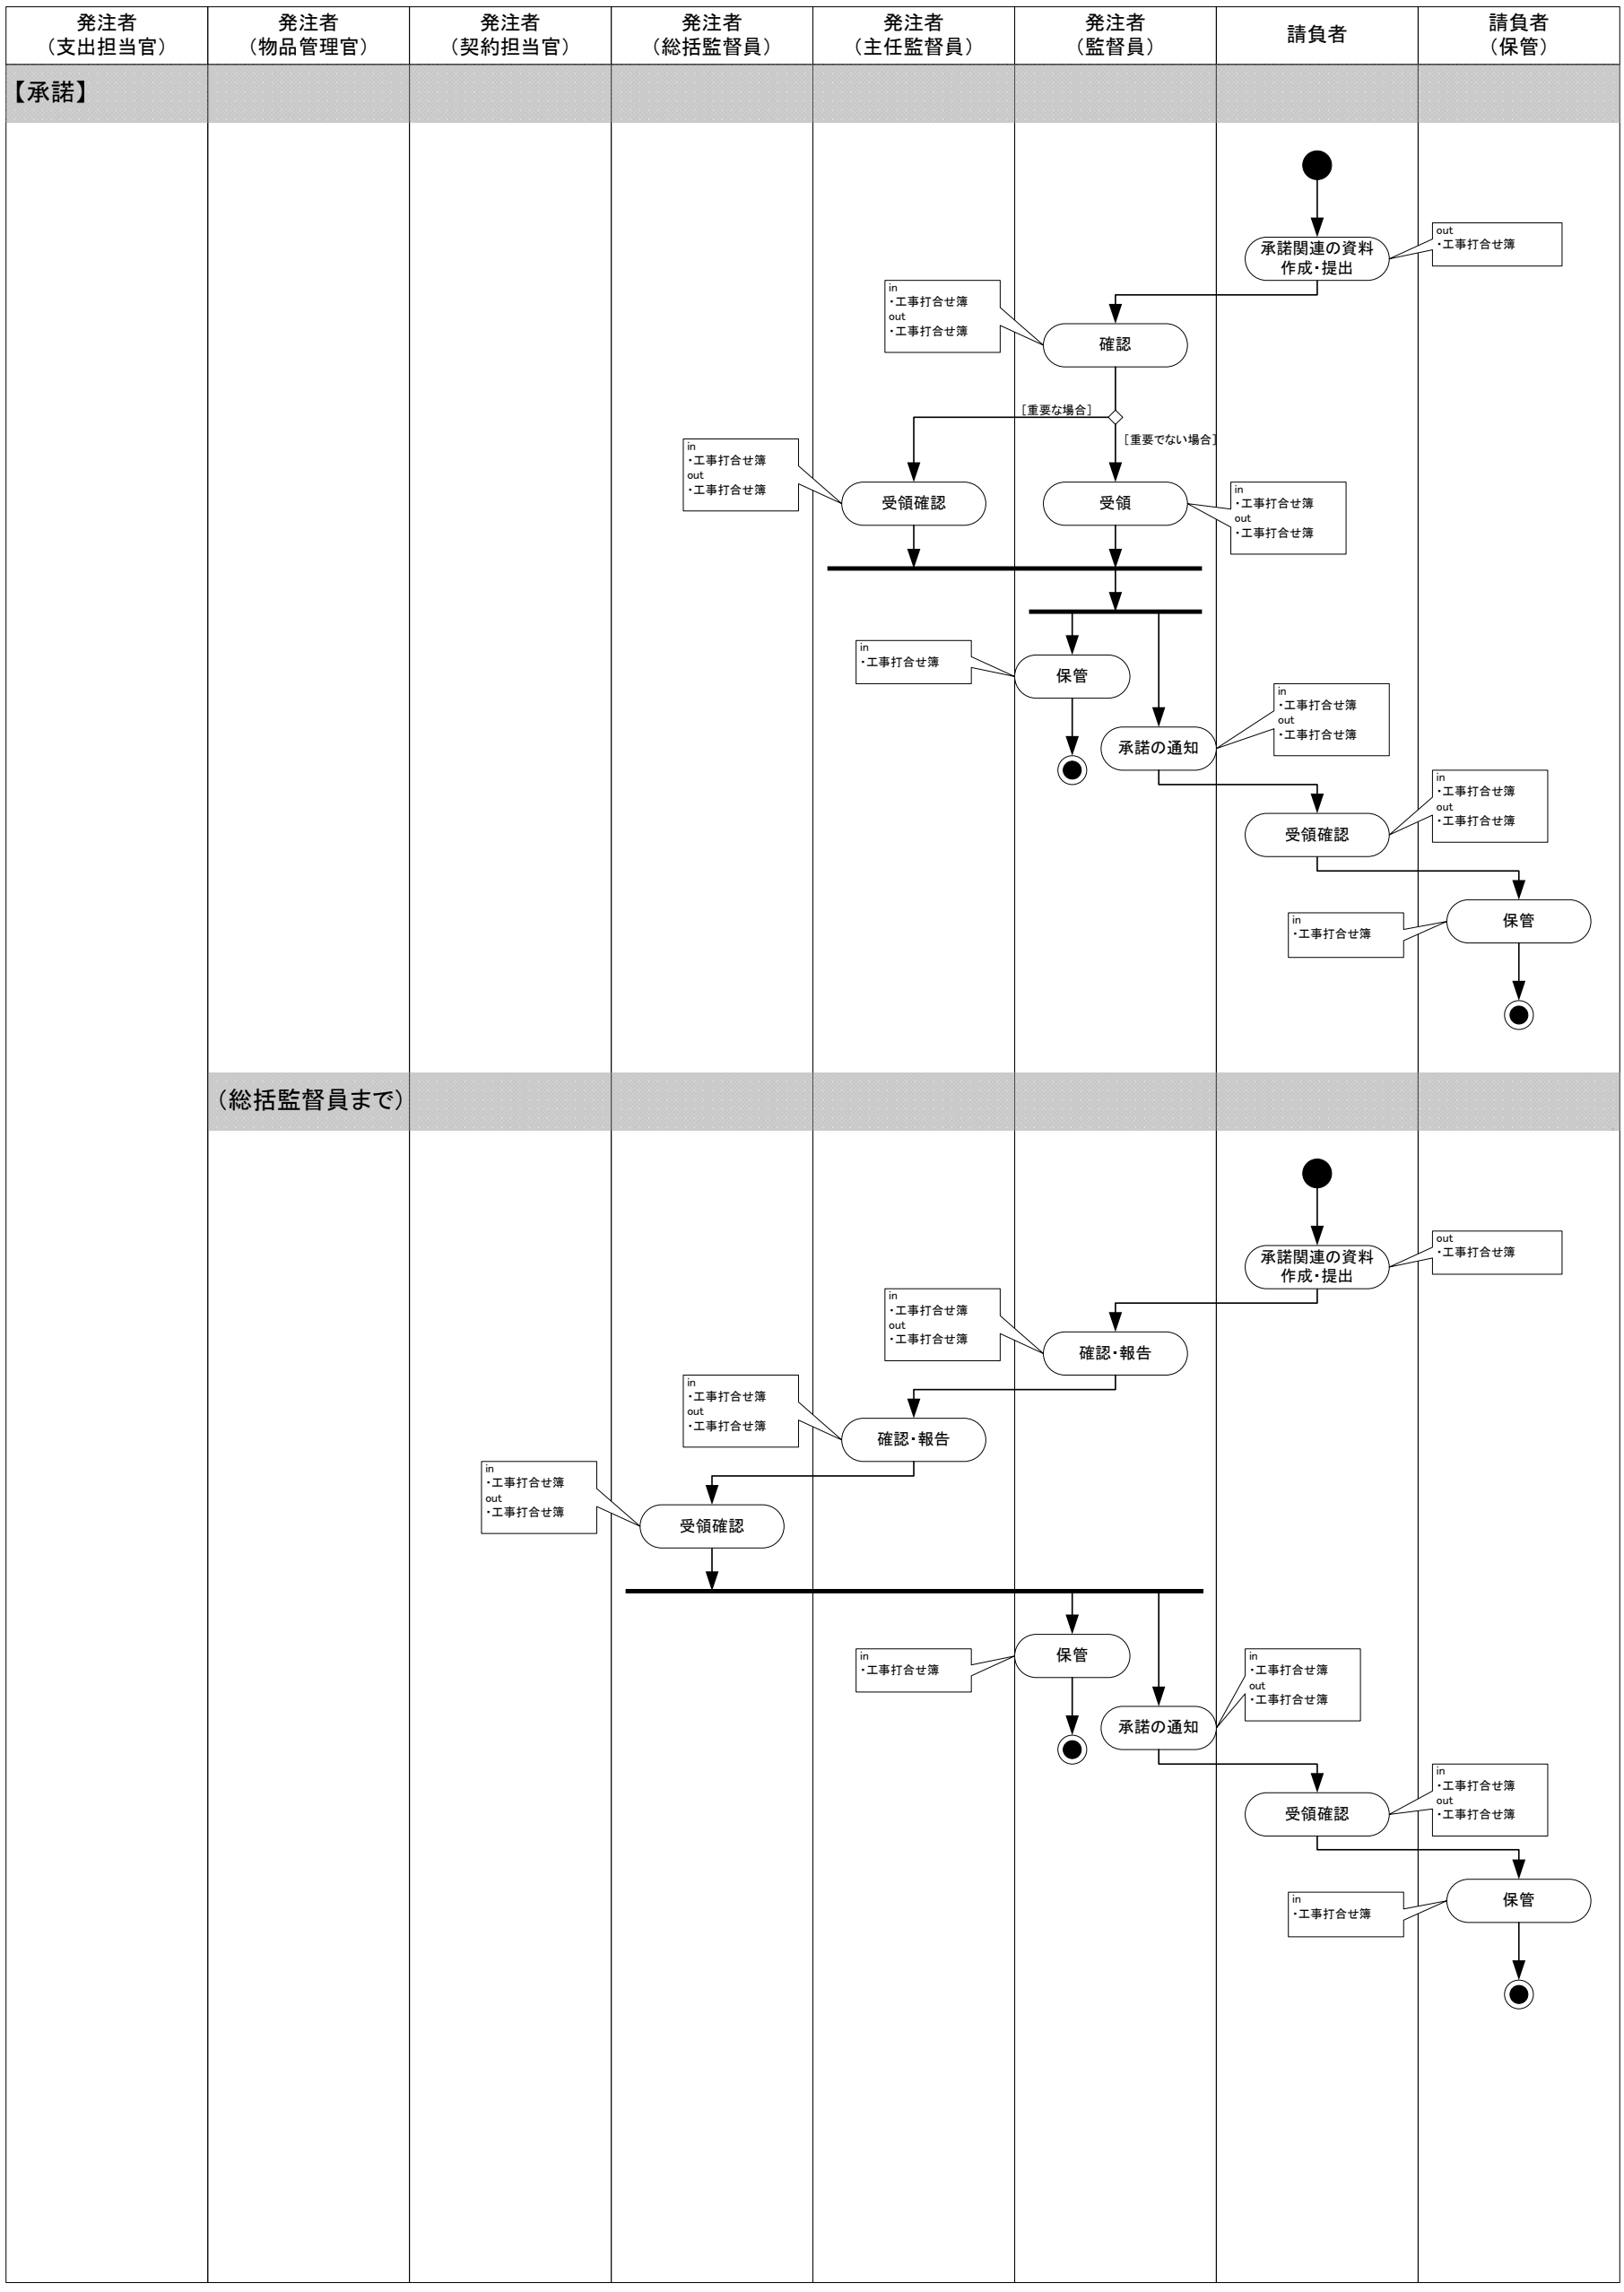

巻末資料2-2-2

代表的なワークフロー（土木工事共通仕様書）

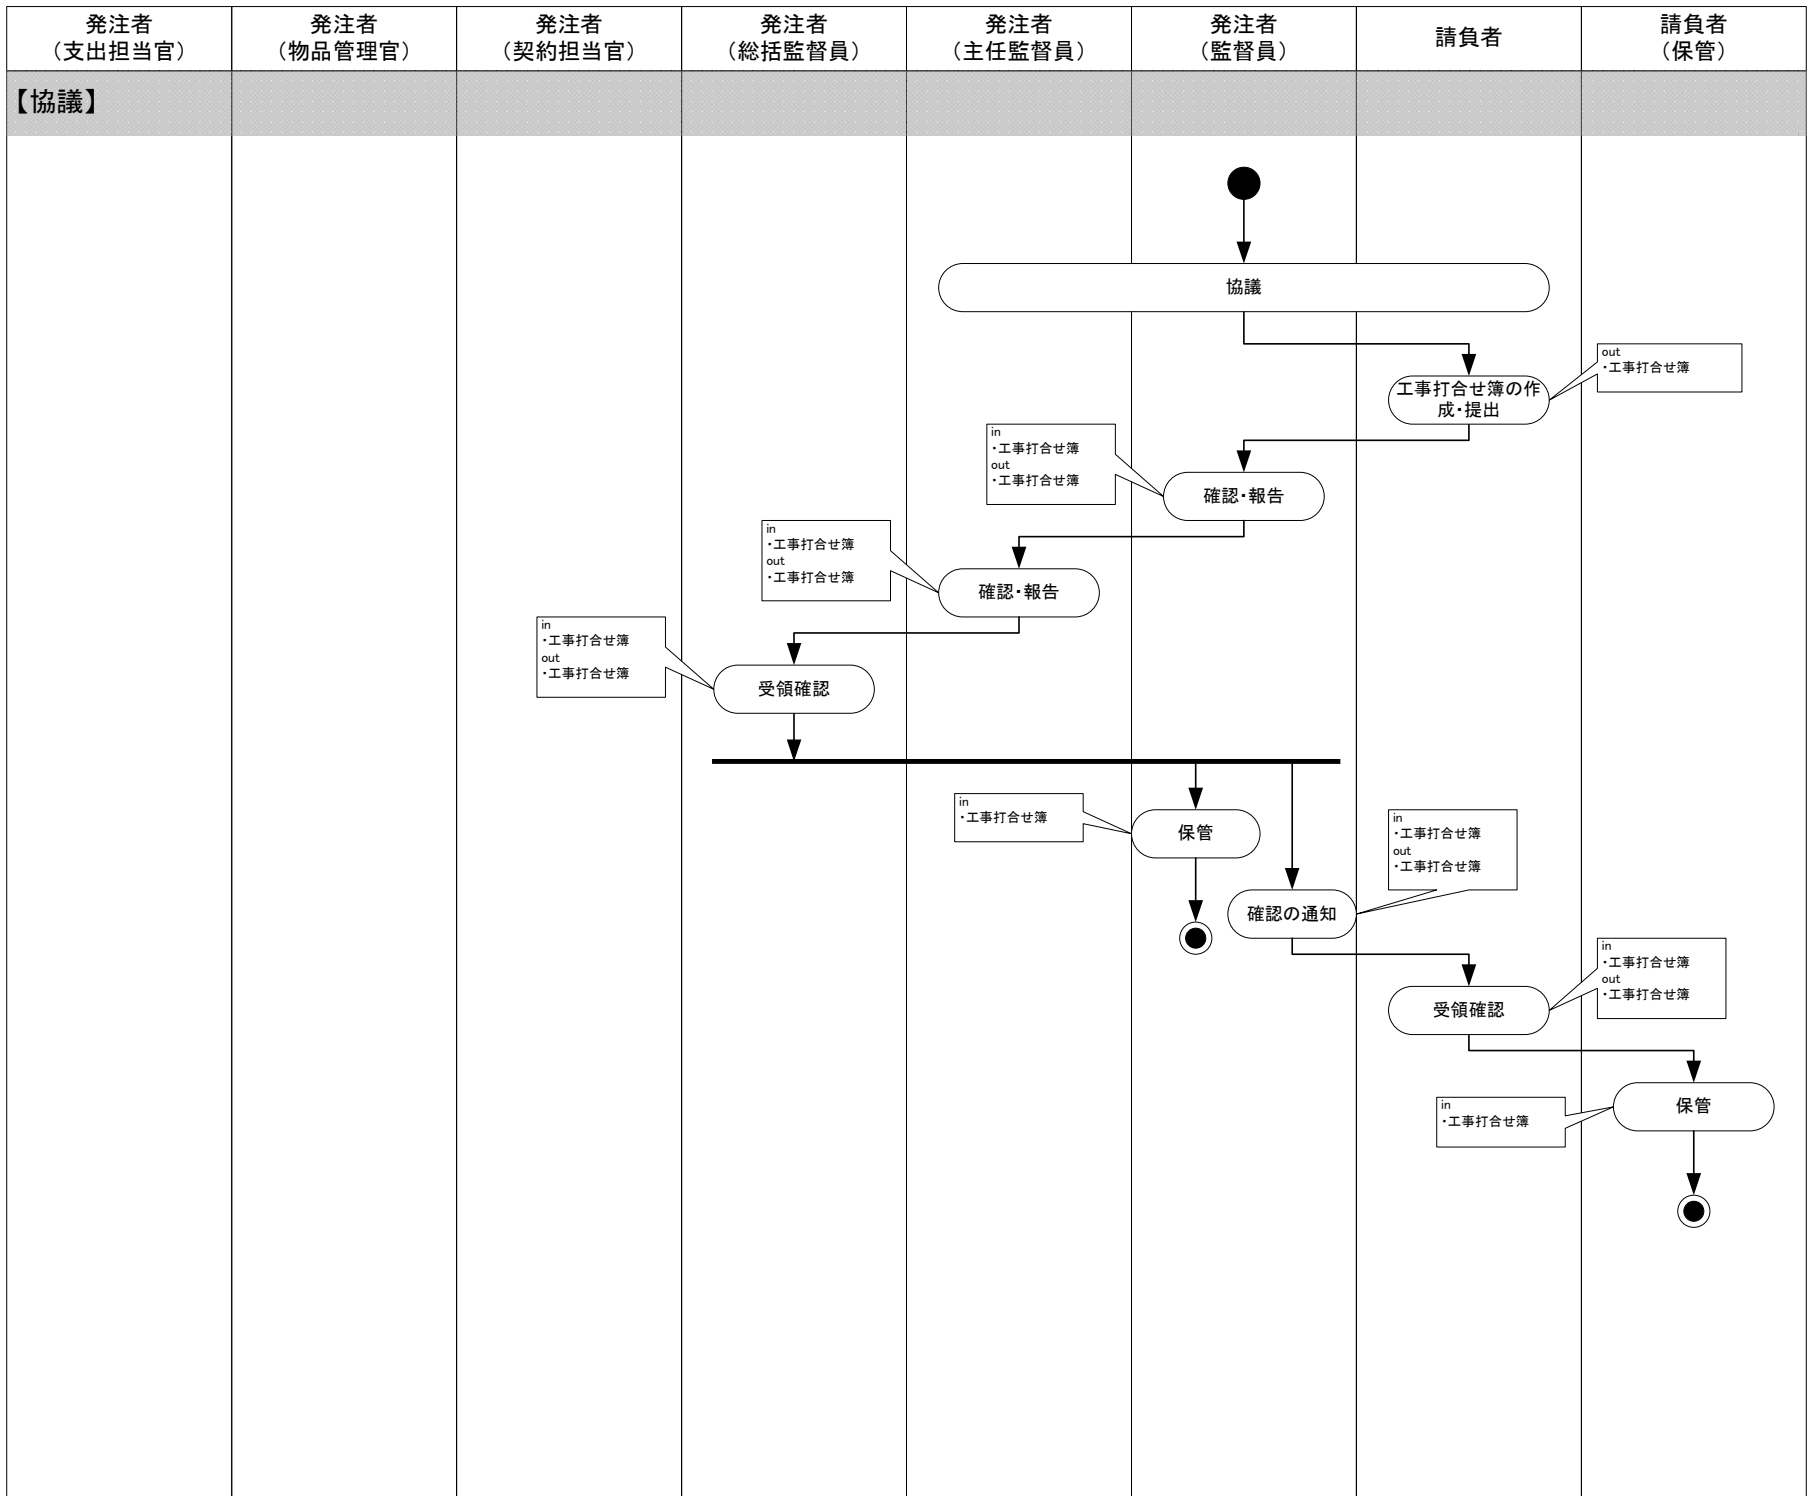

代表的なワークフロー（土木工事共通仕様書）

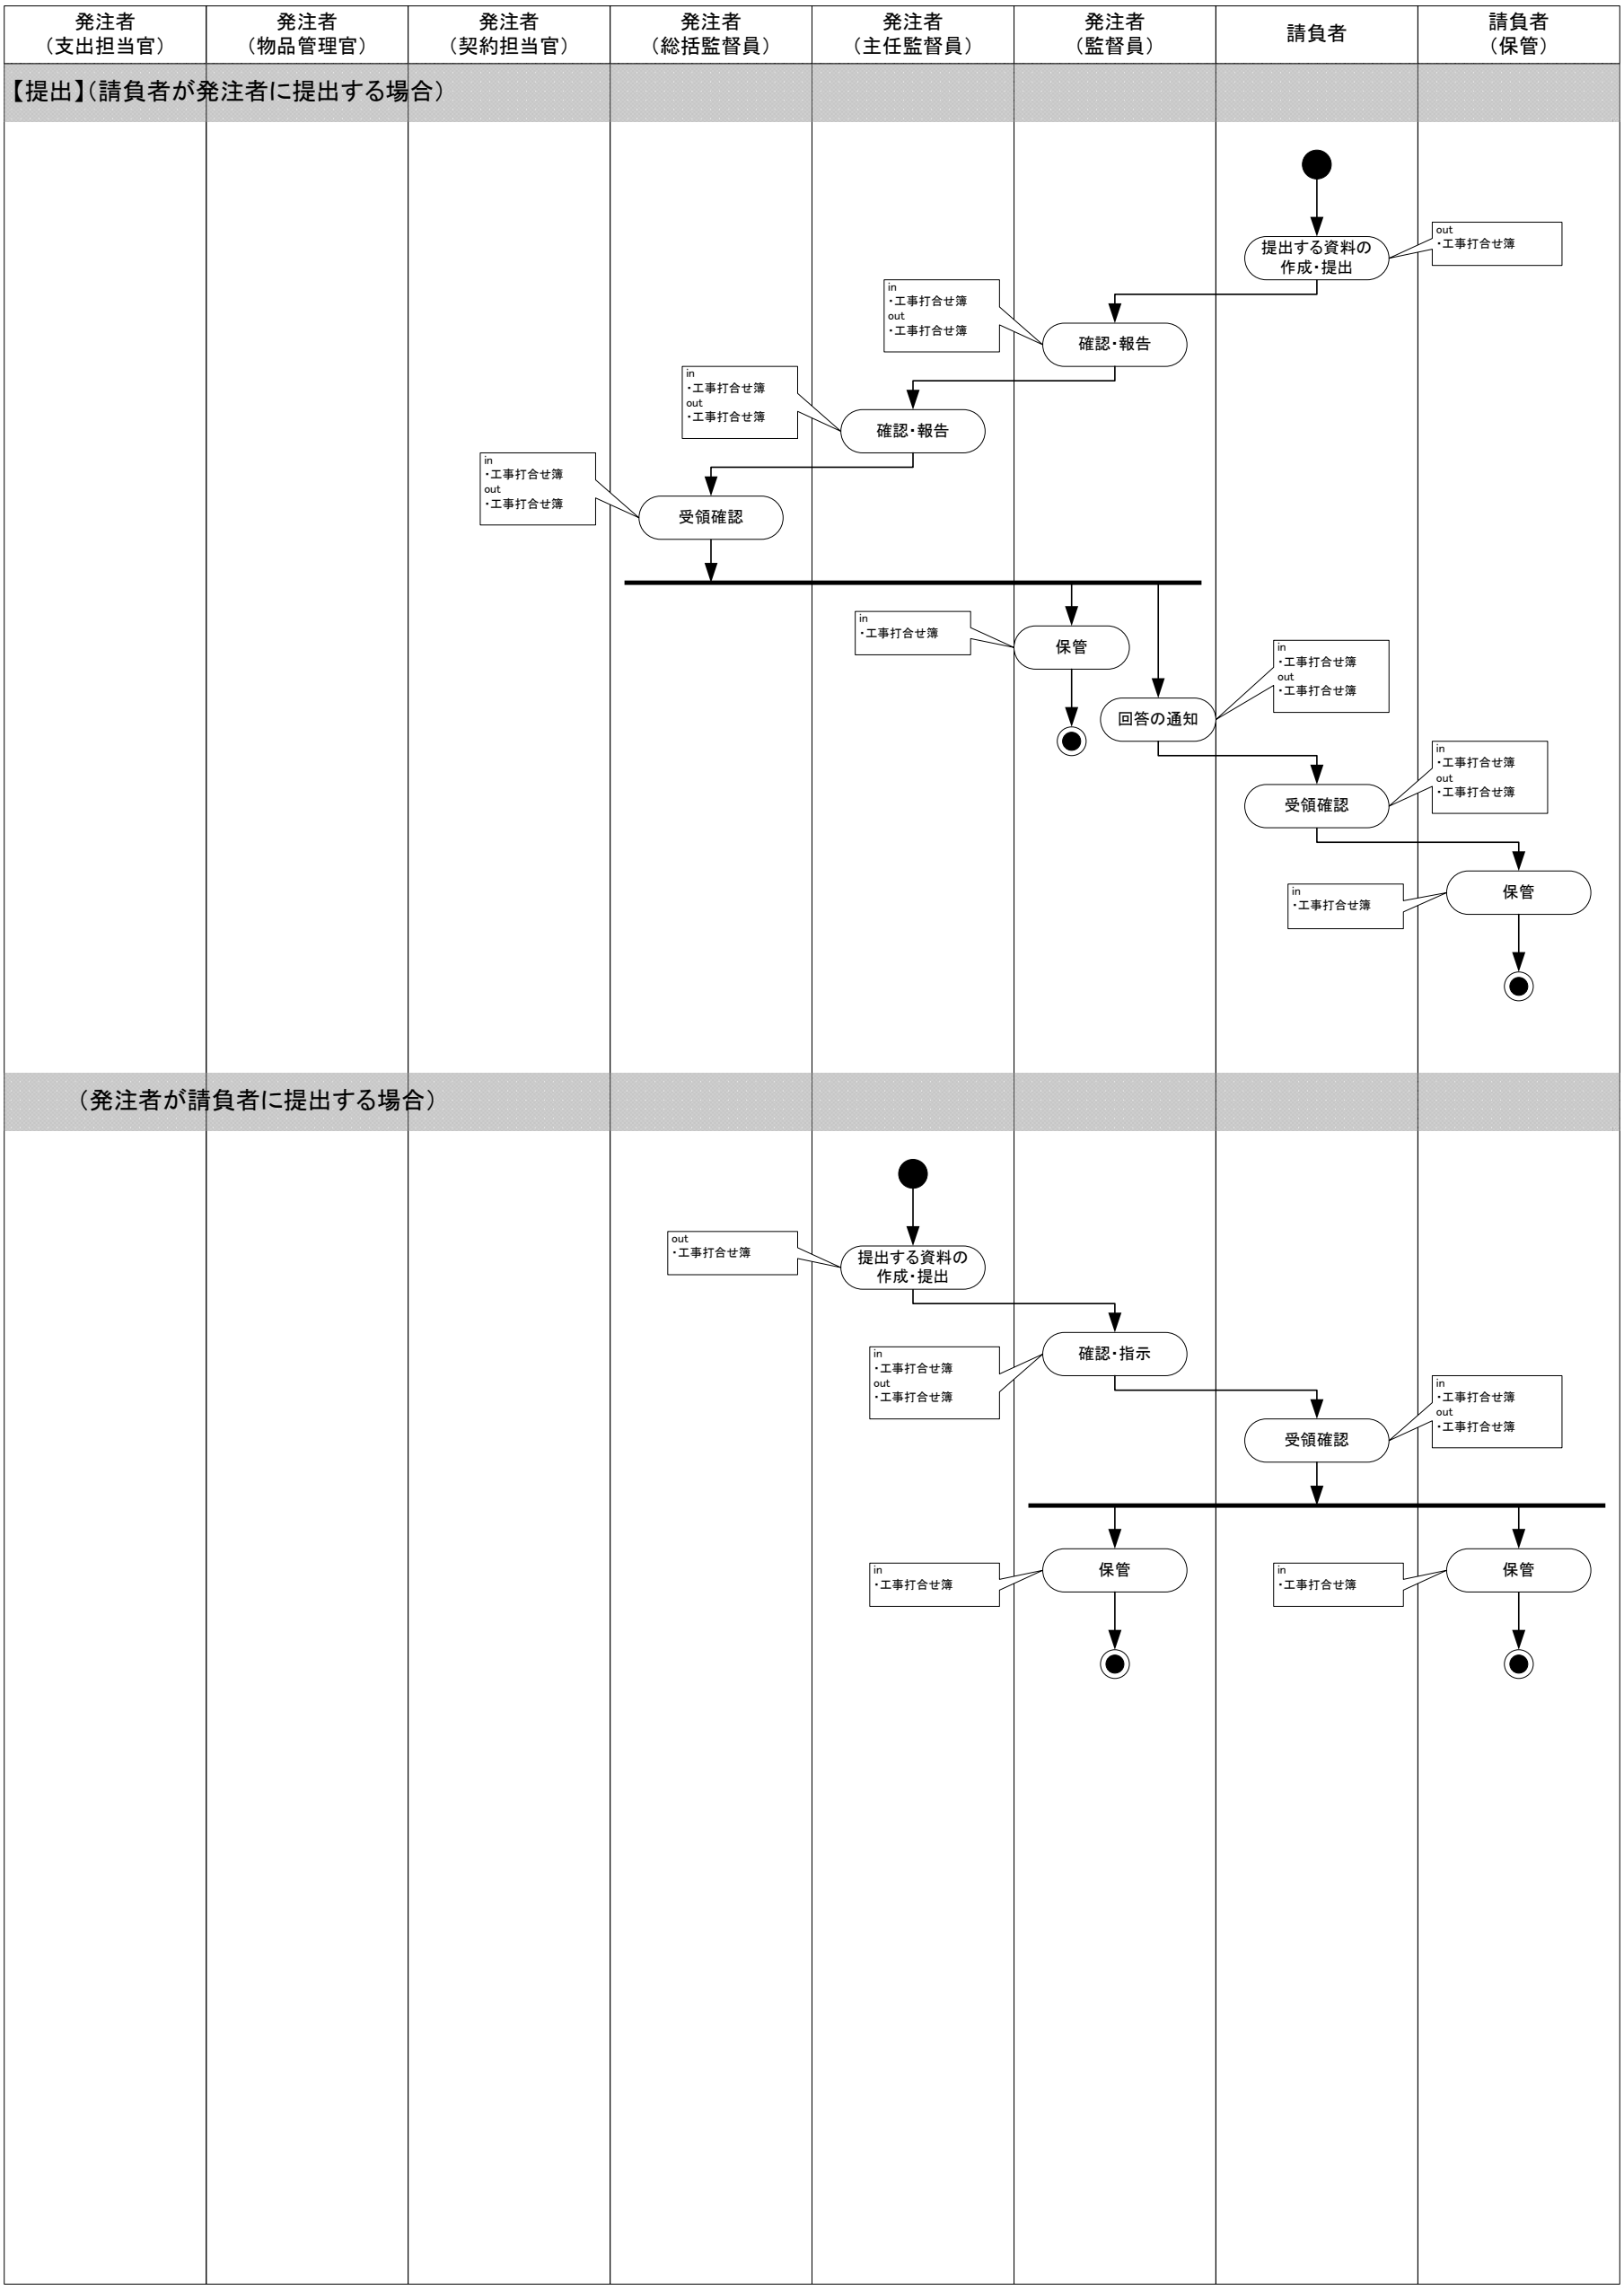

代表的なワークフロー（土木工事共通仕様書）

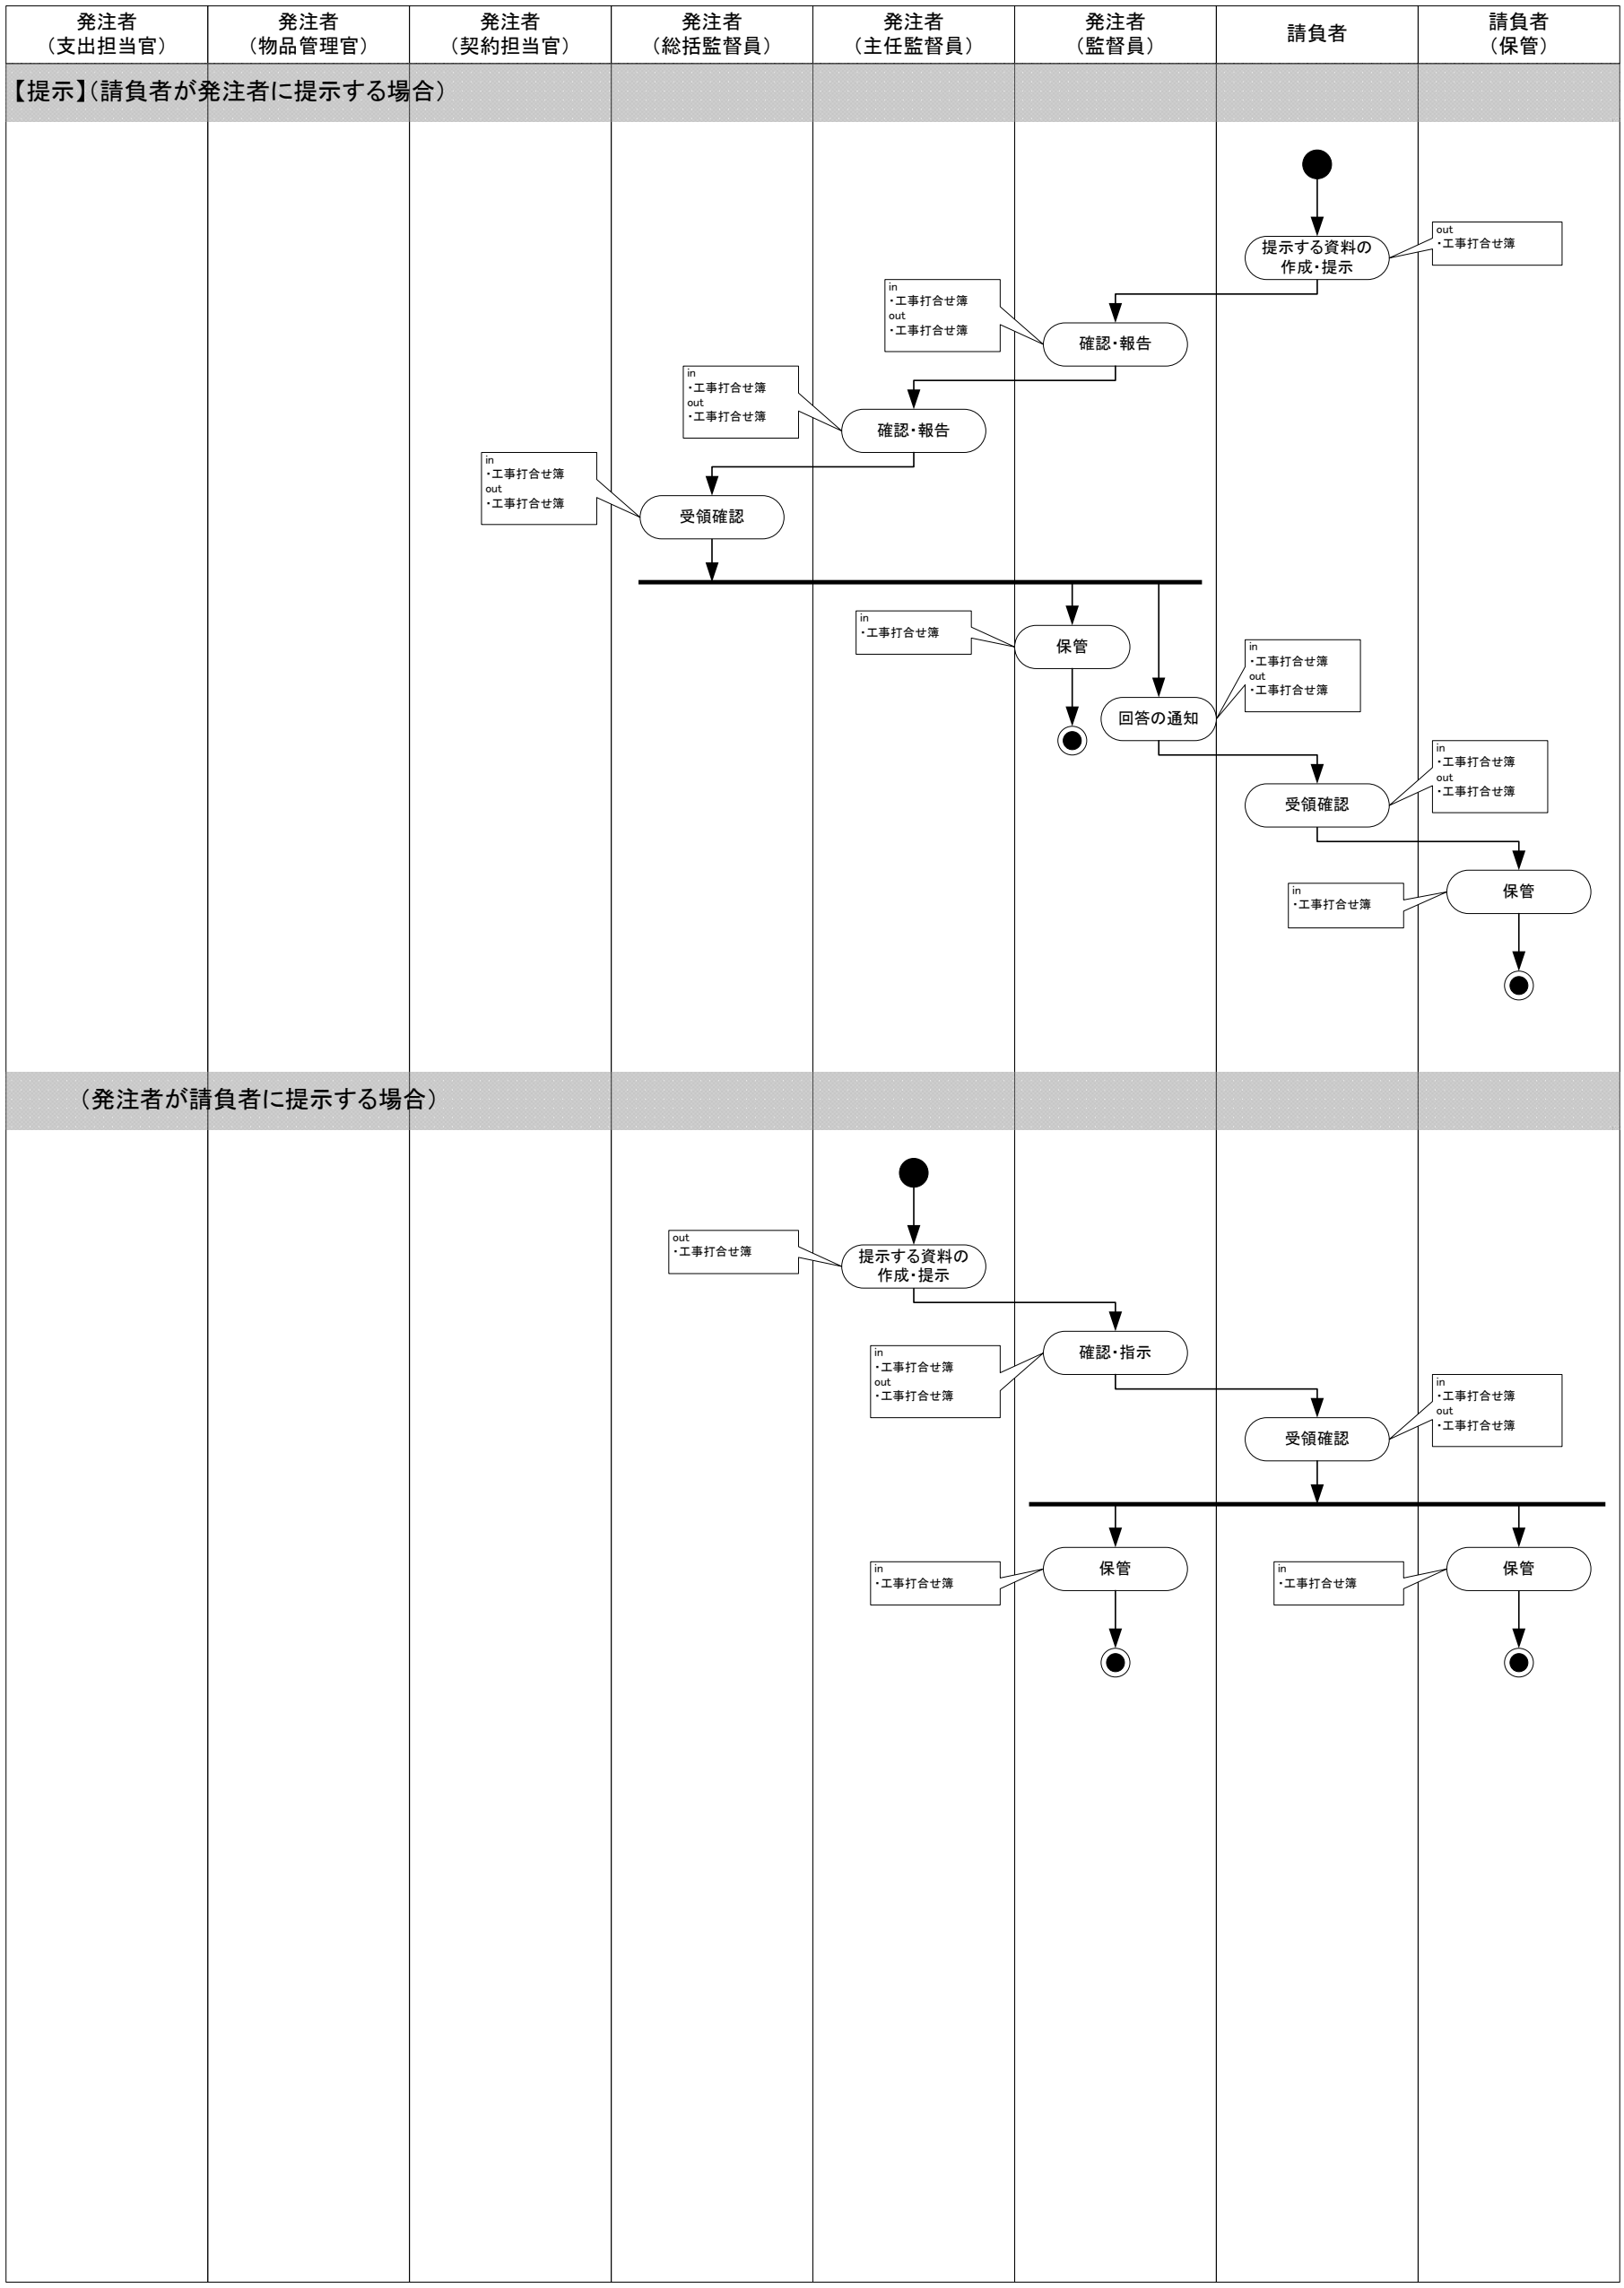

代表的なワークフロー（土木工事共通仕様書）

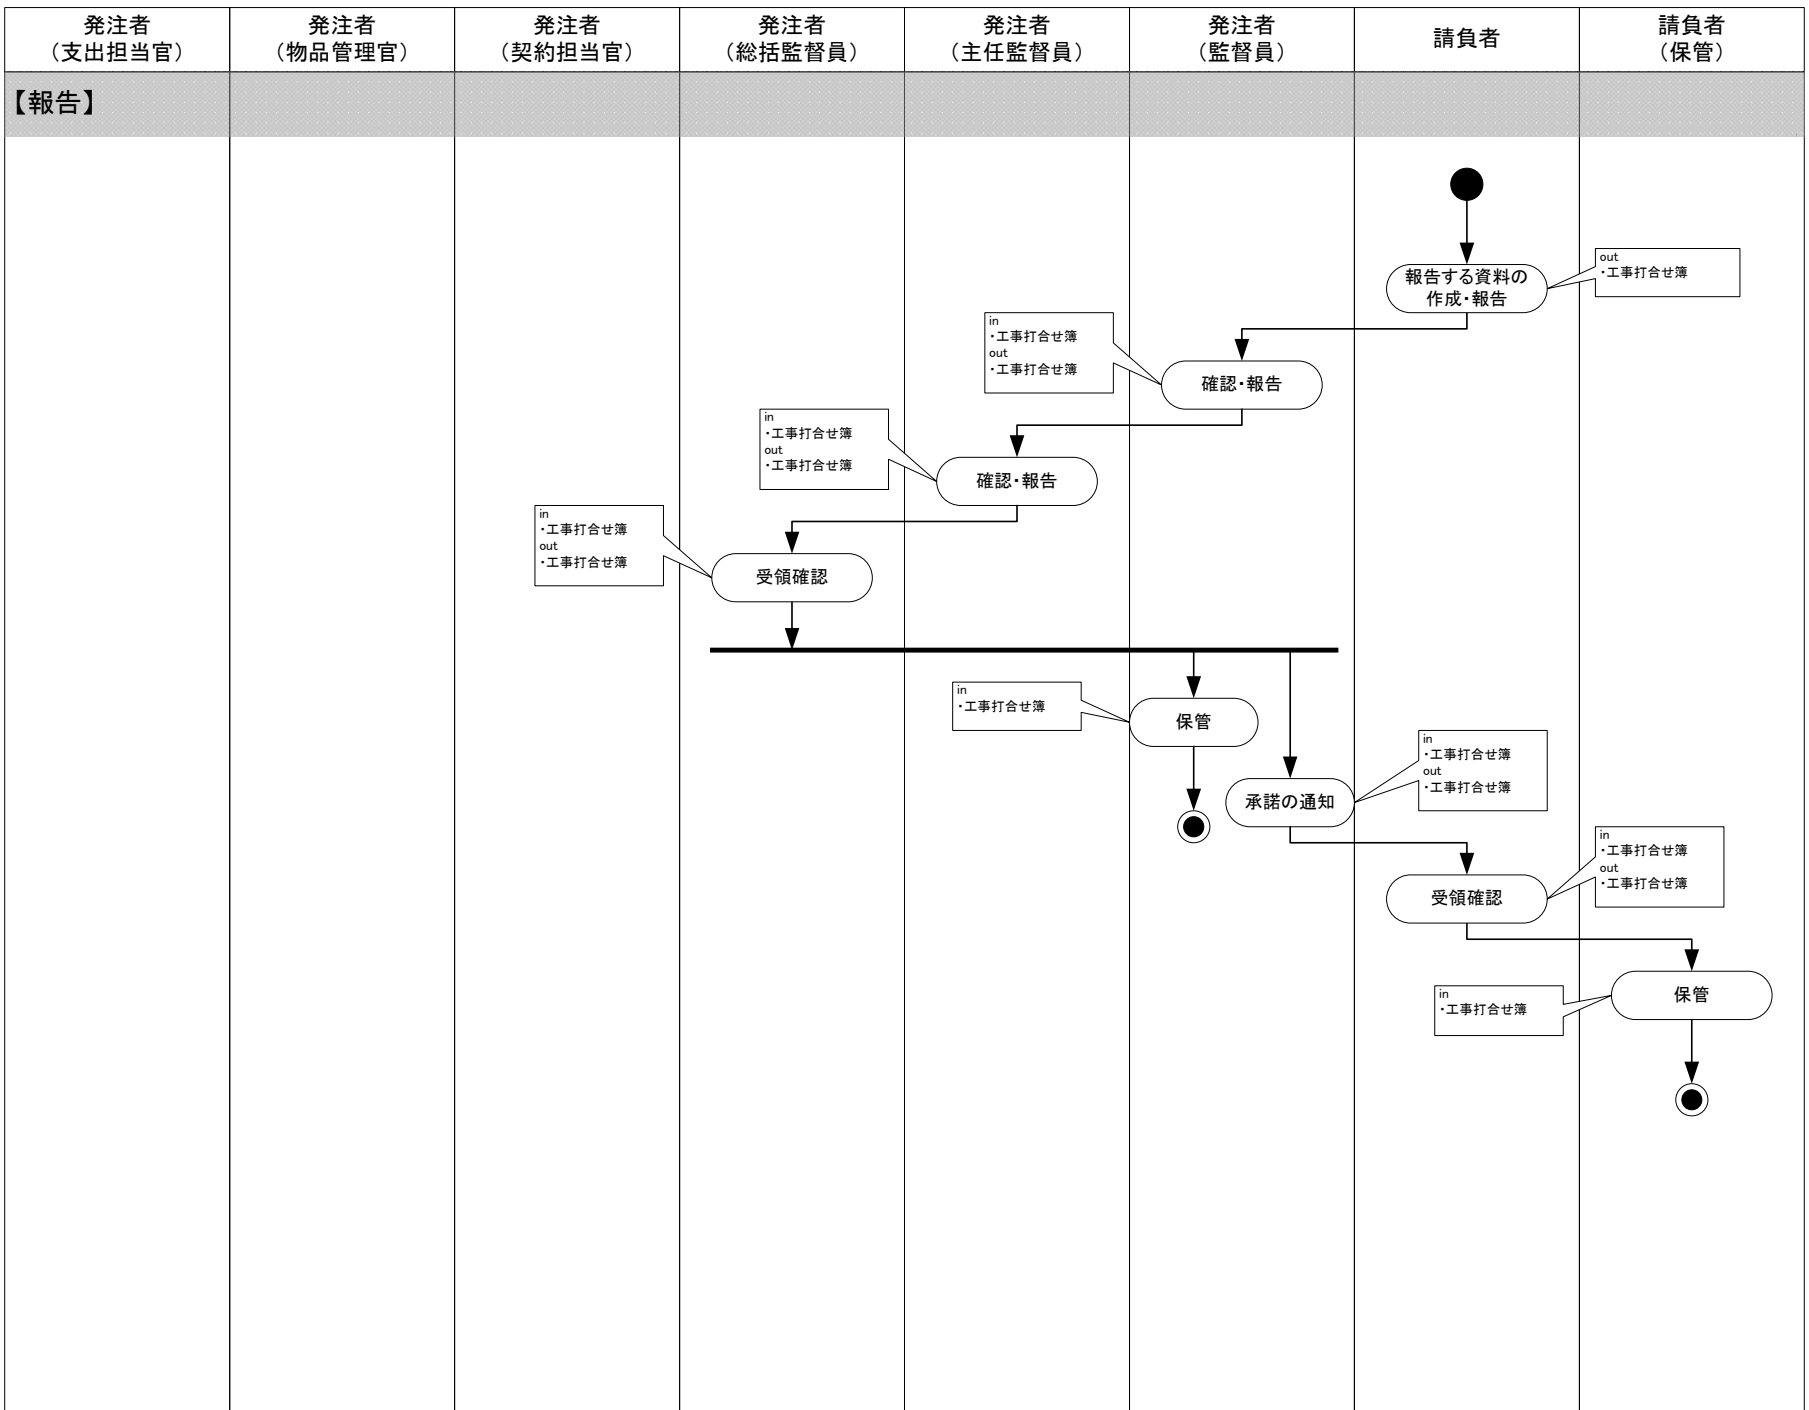

代表的なワークフロー（土木工事共通仕様書）

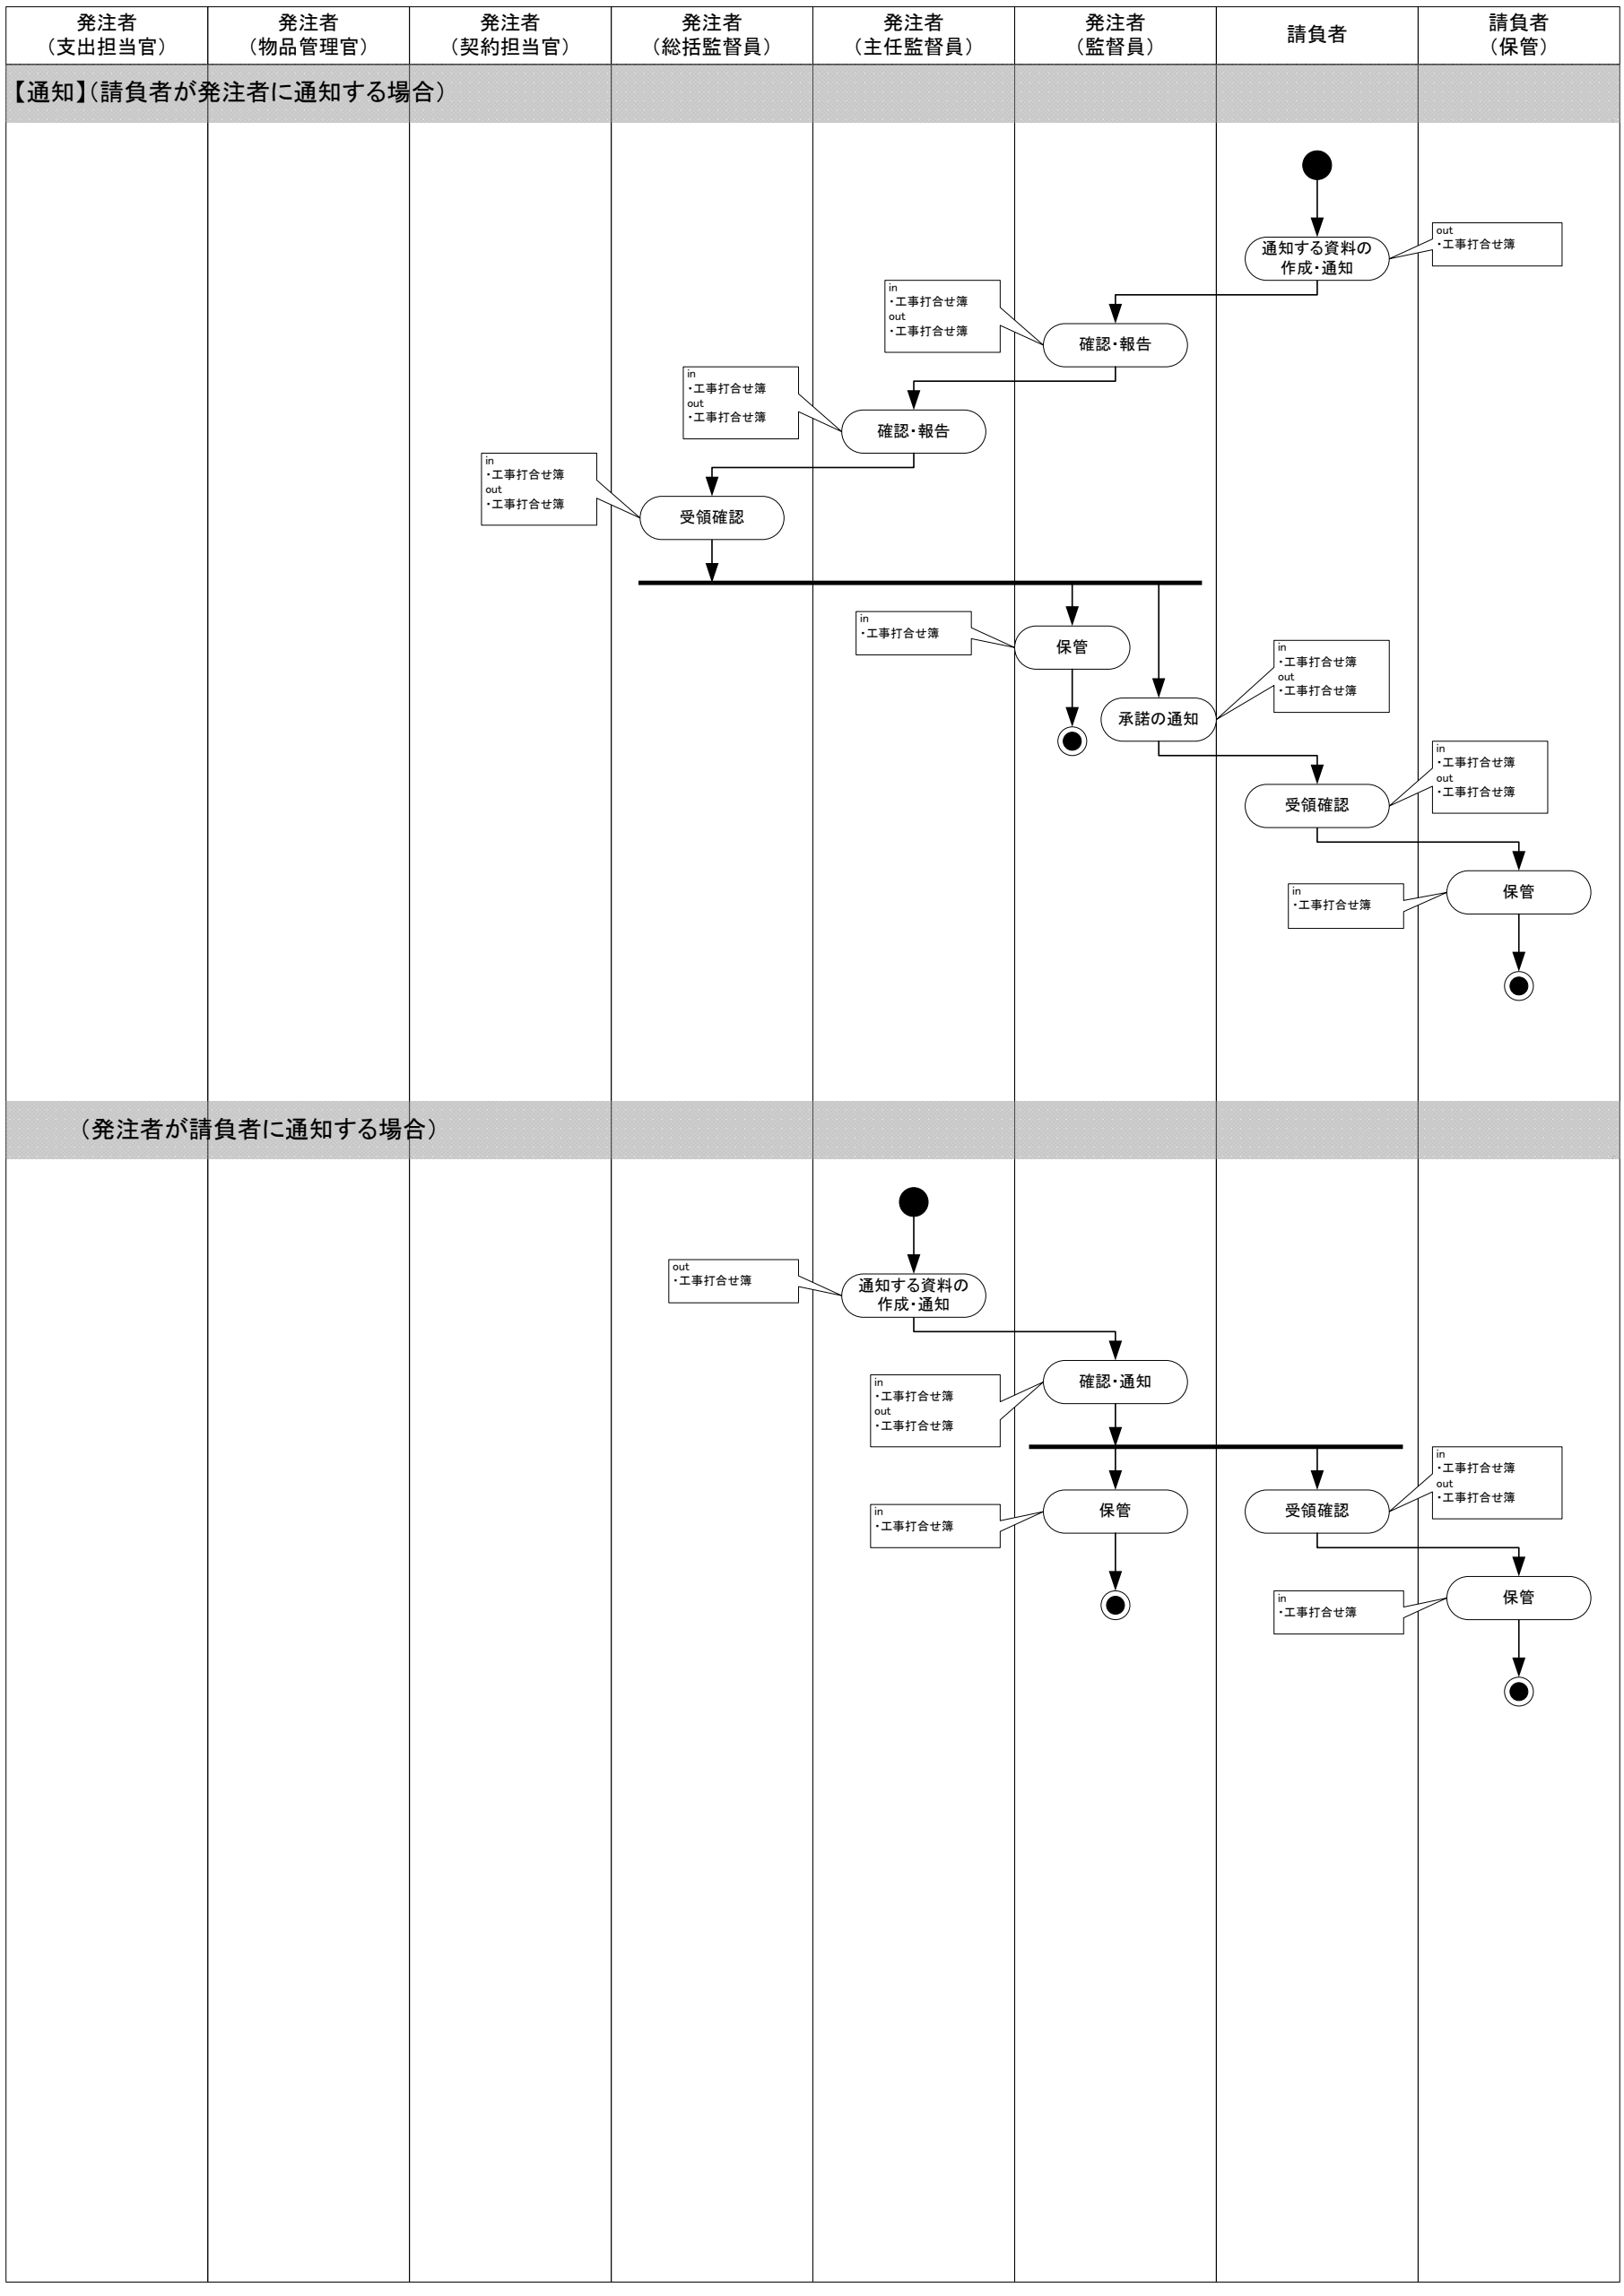

代表的なワークフロー（土木工事共通仕様書）

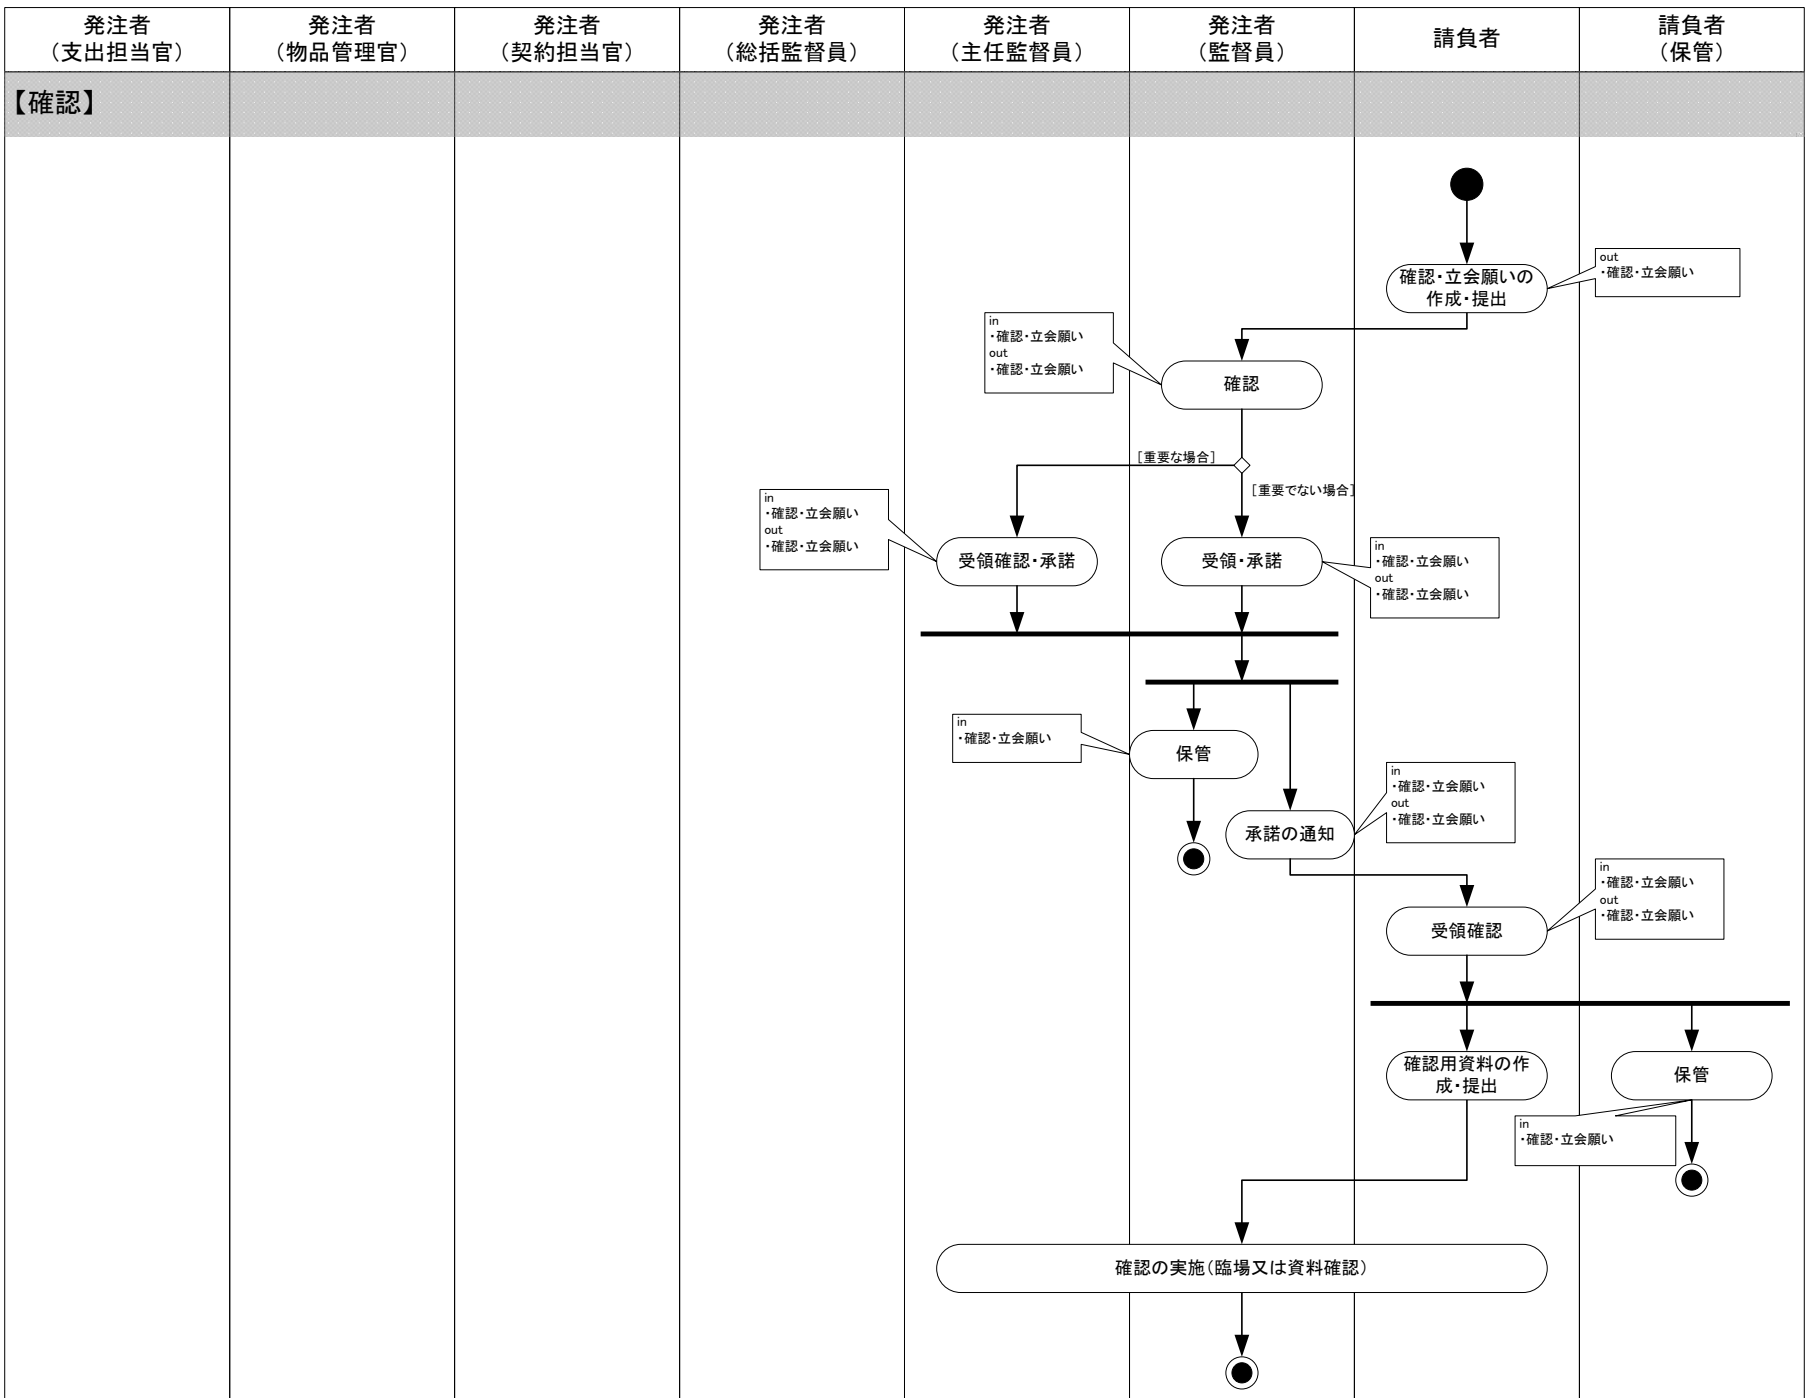

代表的なワークフロー（土木工事共通仕様書）

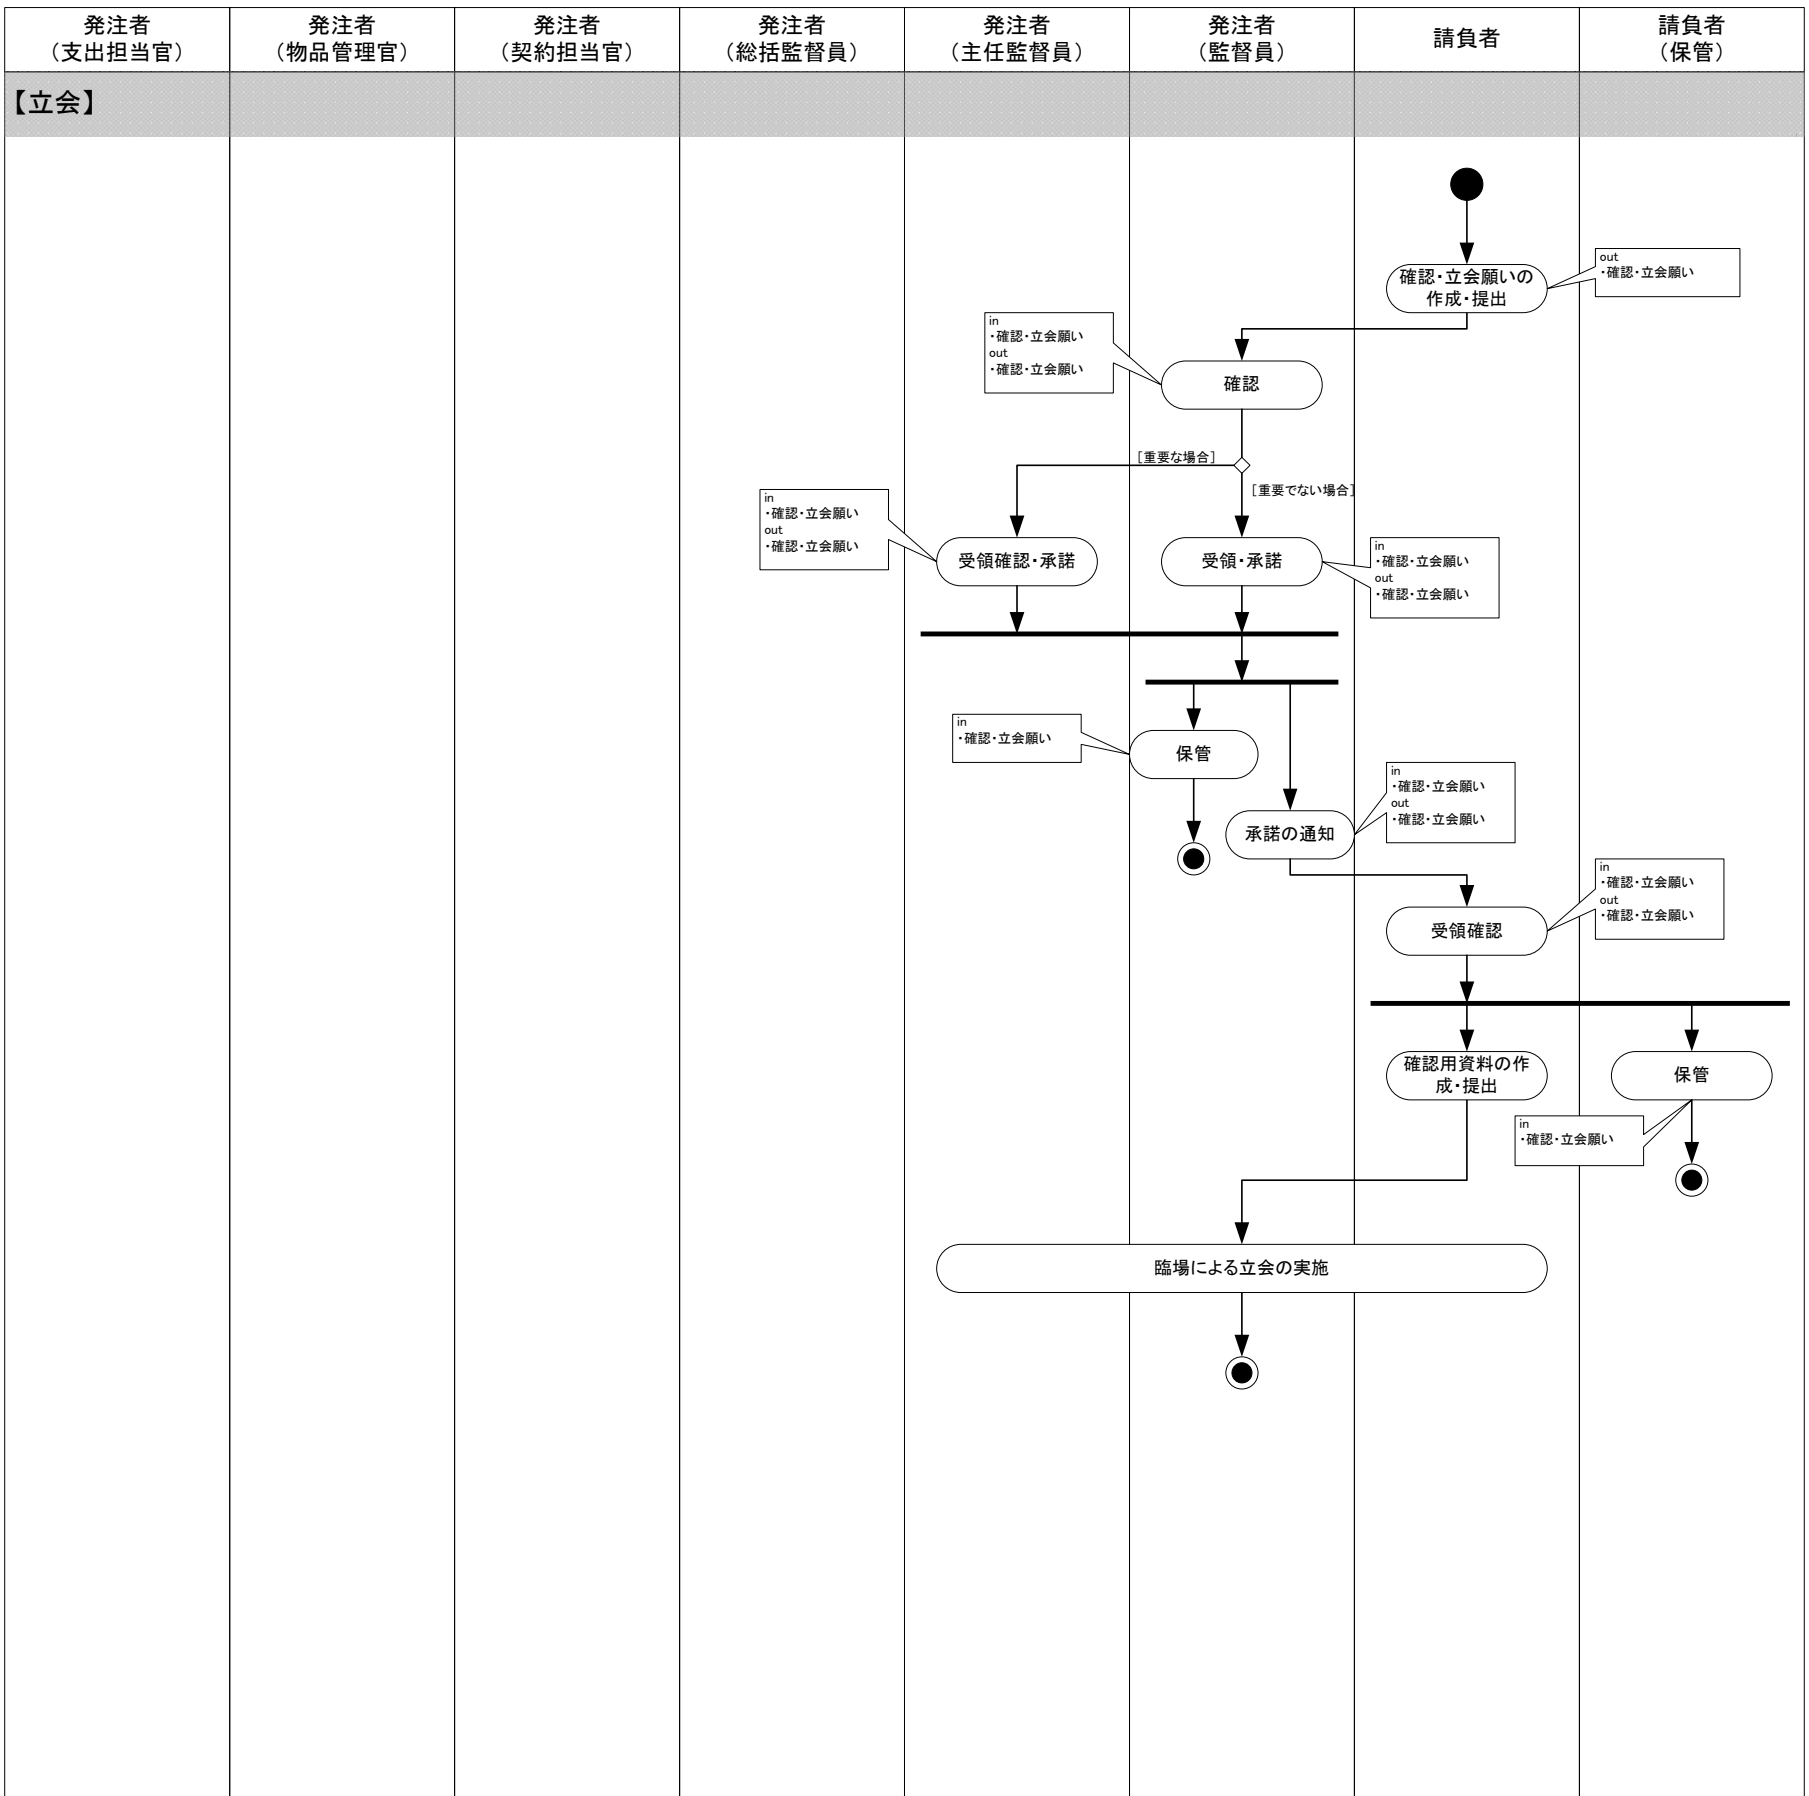

代表的なワークフロー（監督技術マニュアル（案）・土木工事監督技術基準（案））

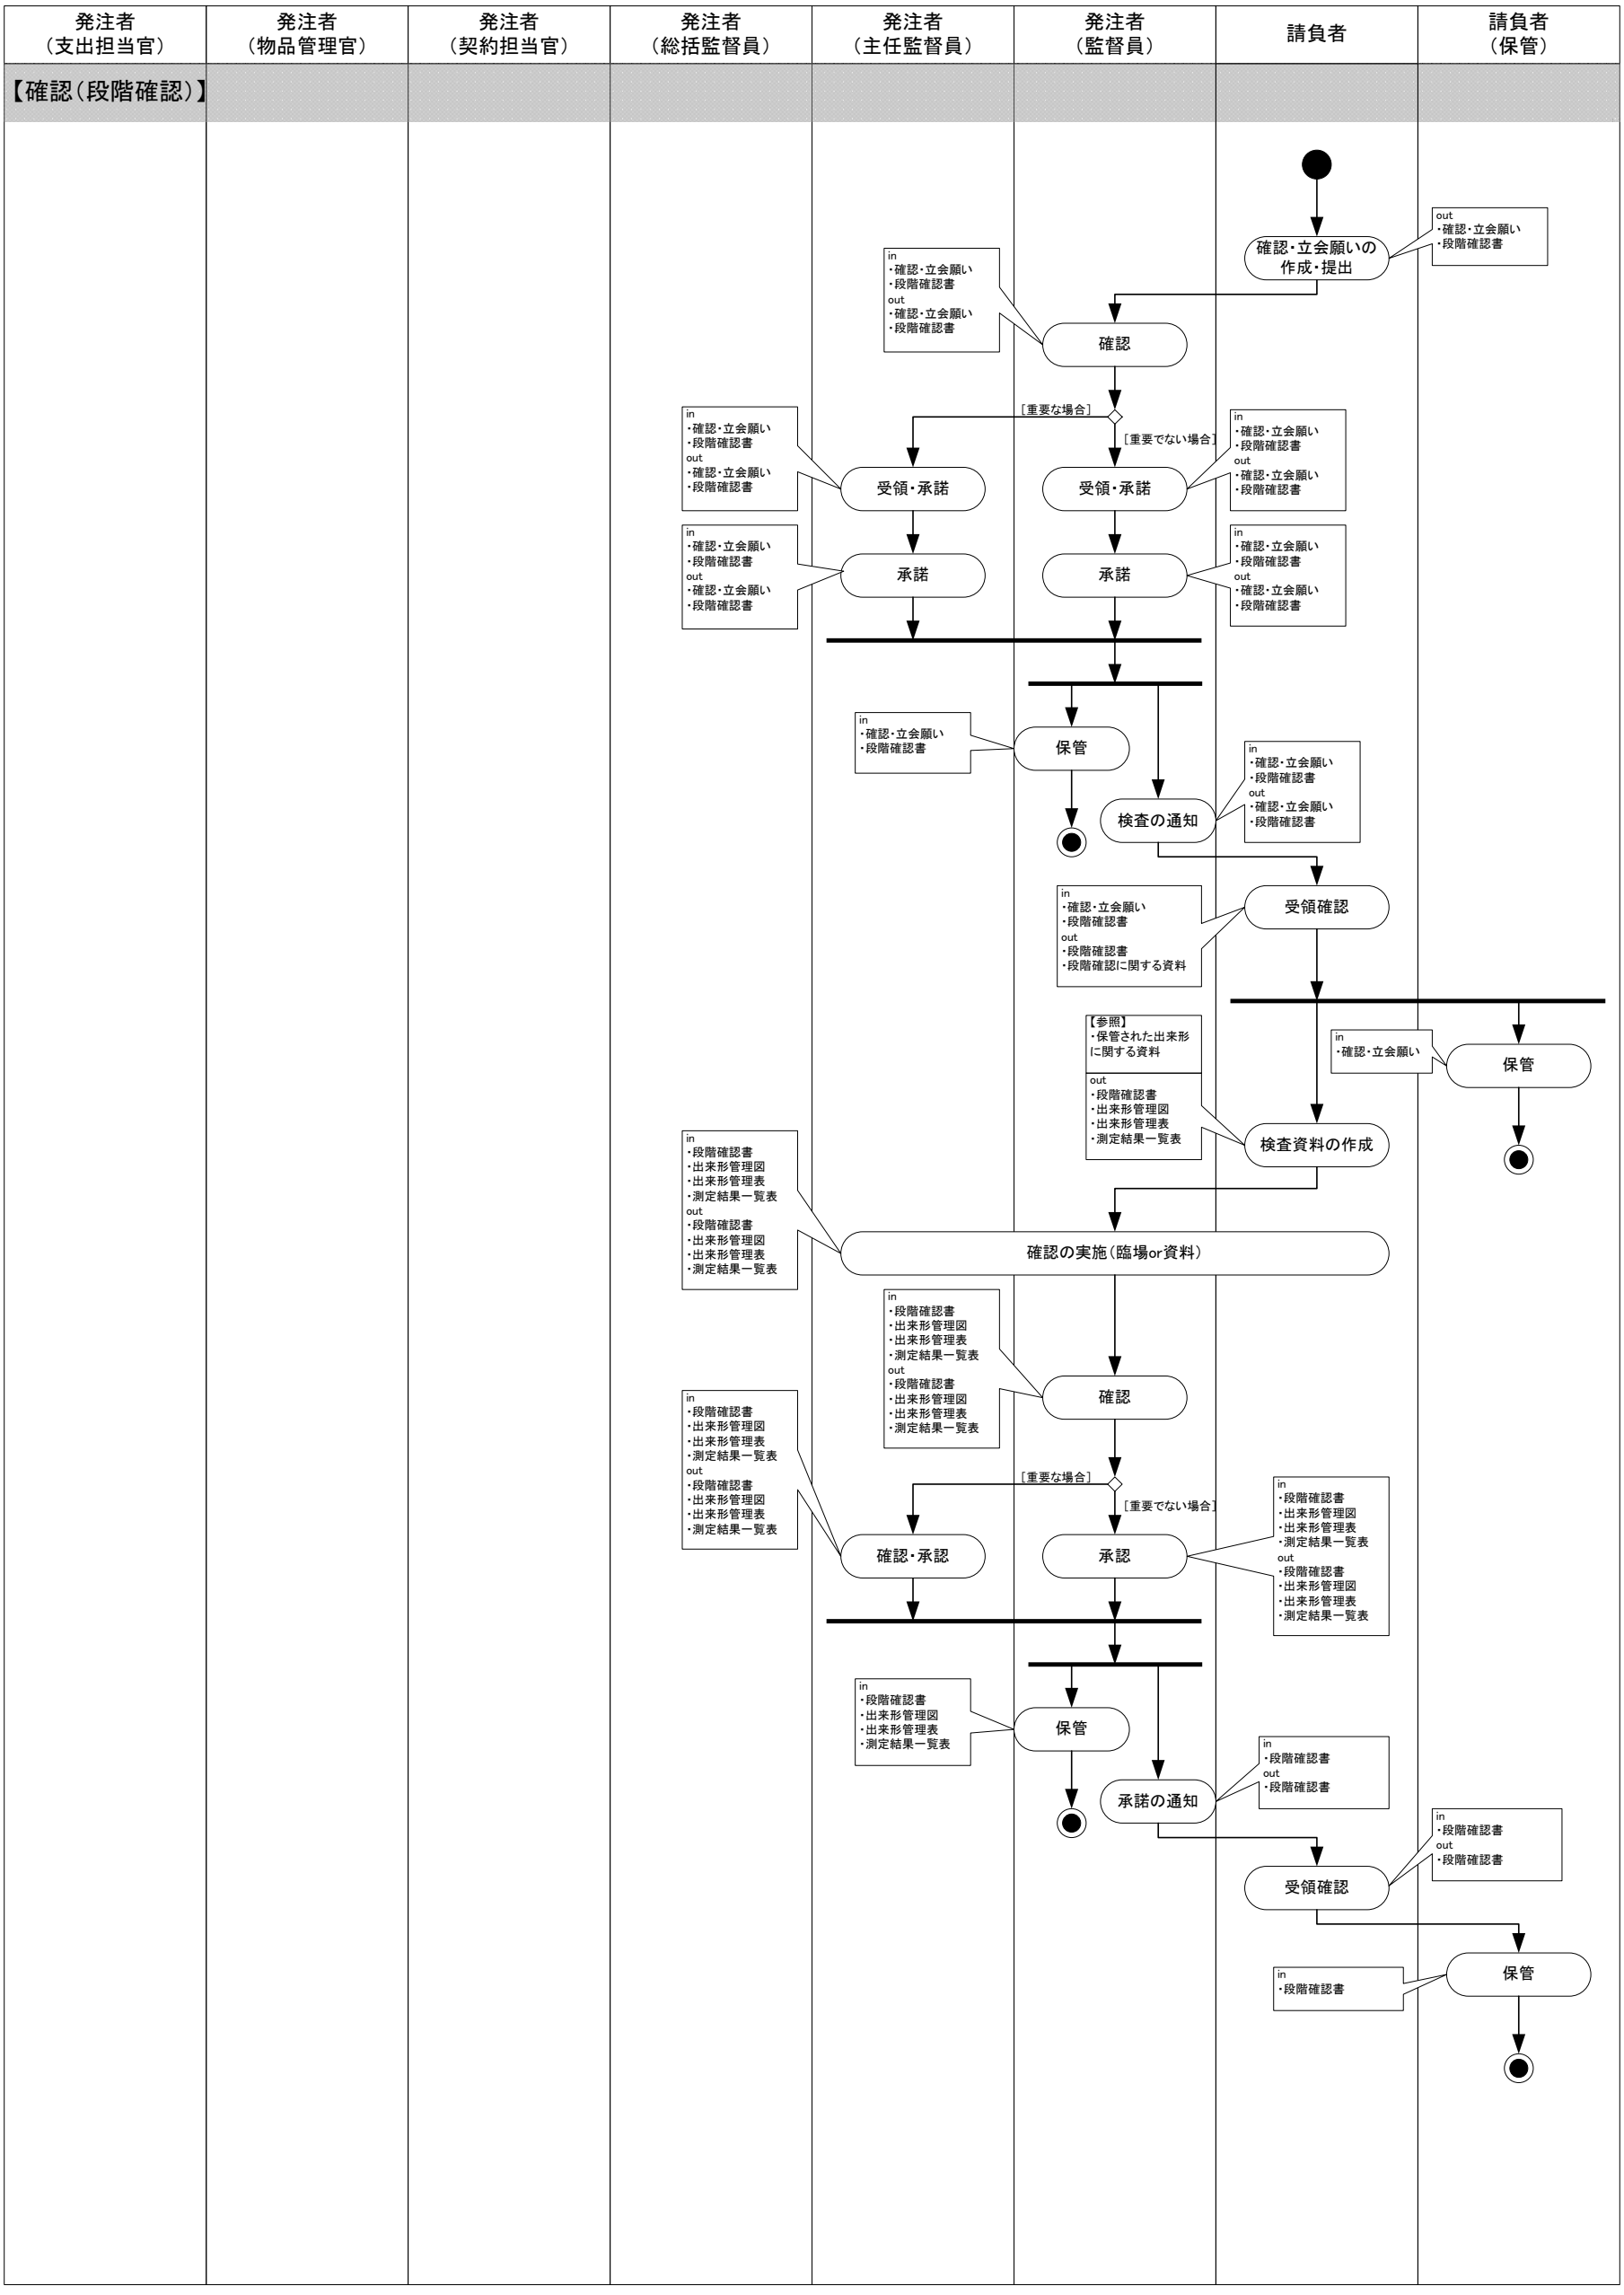

代表的なワークフロー（監督技術マニュアル（案）・土木工事監督技術基準（案））

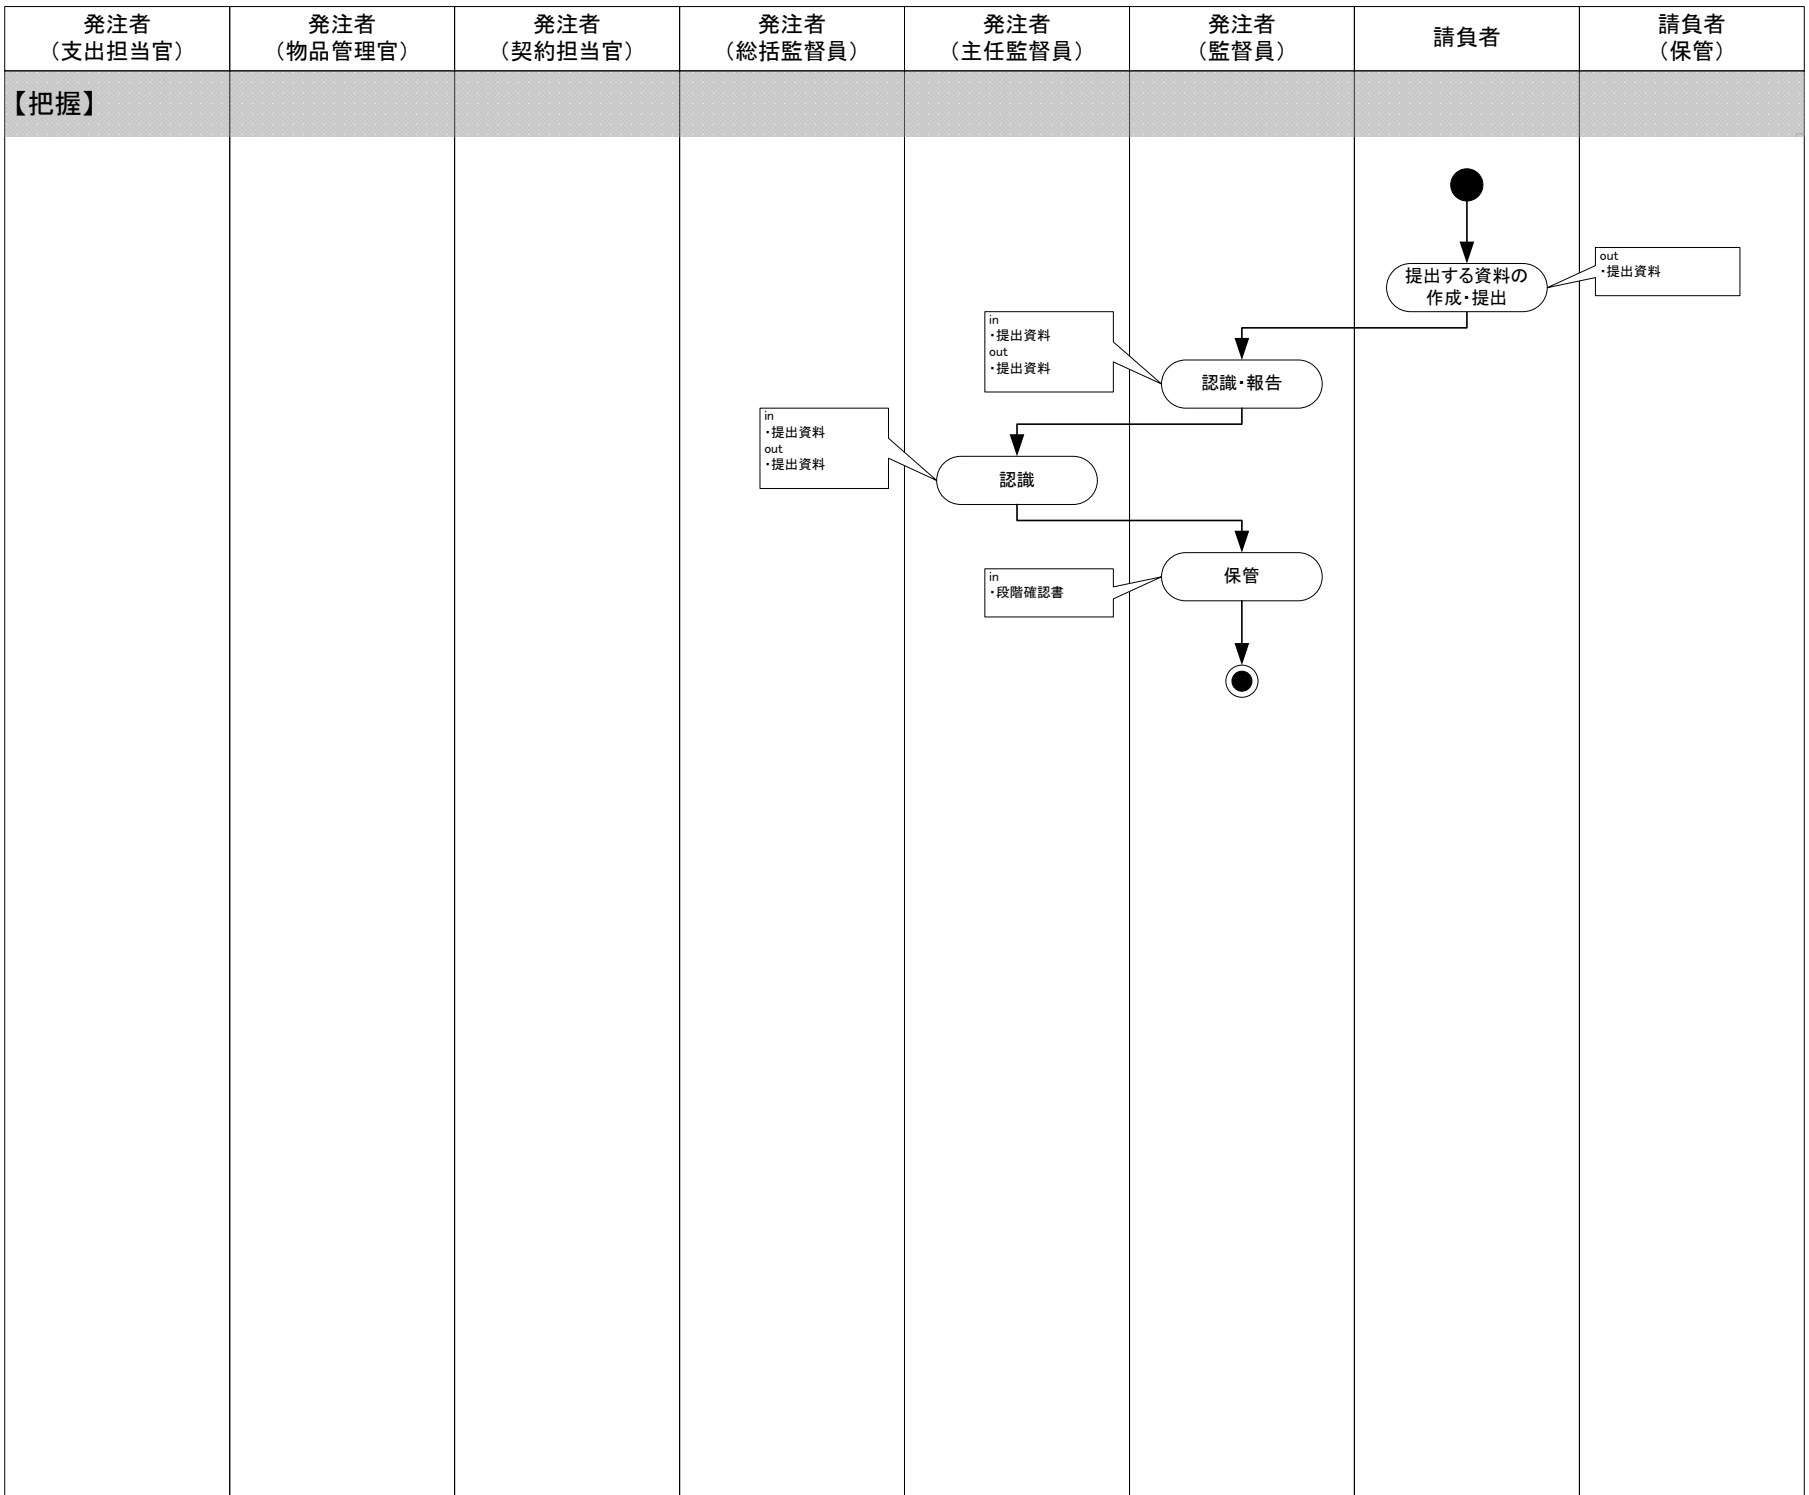

作業場面におけるワークフロー

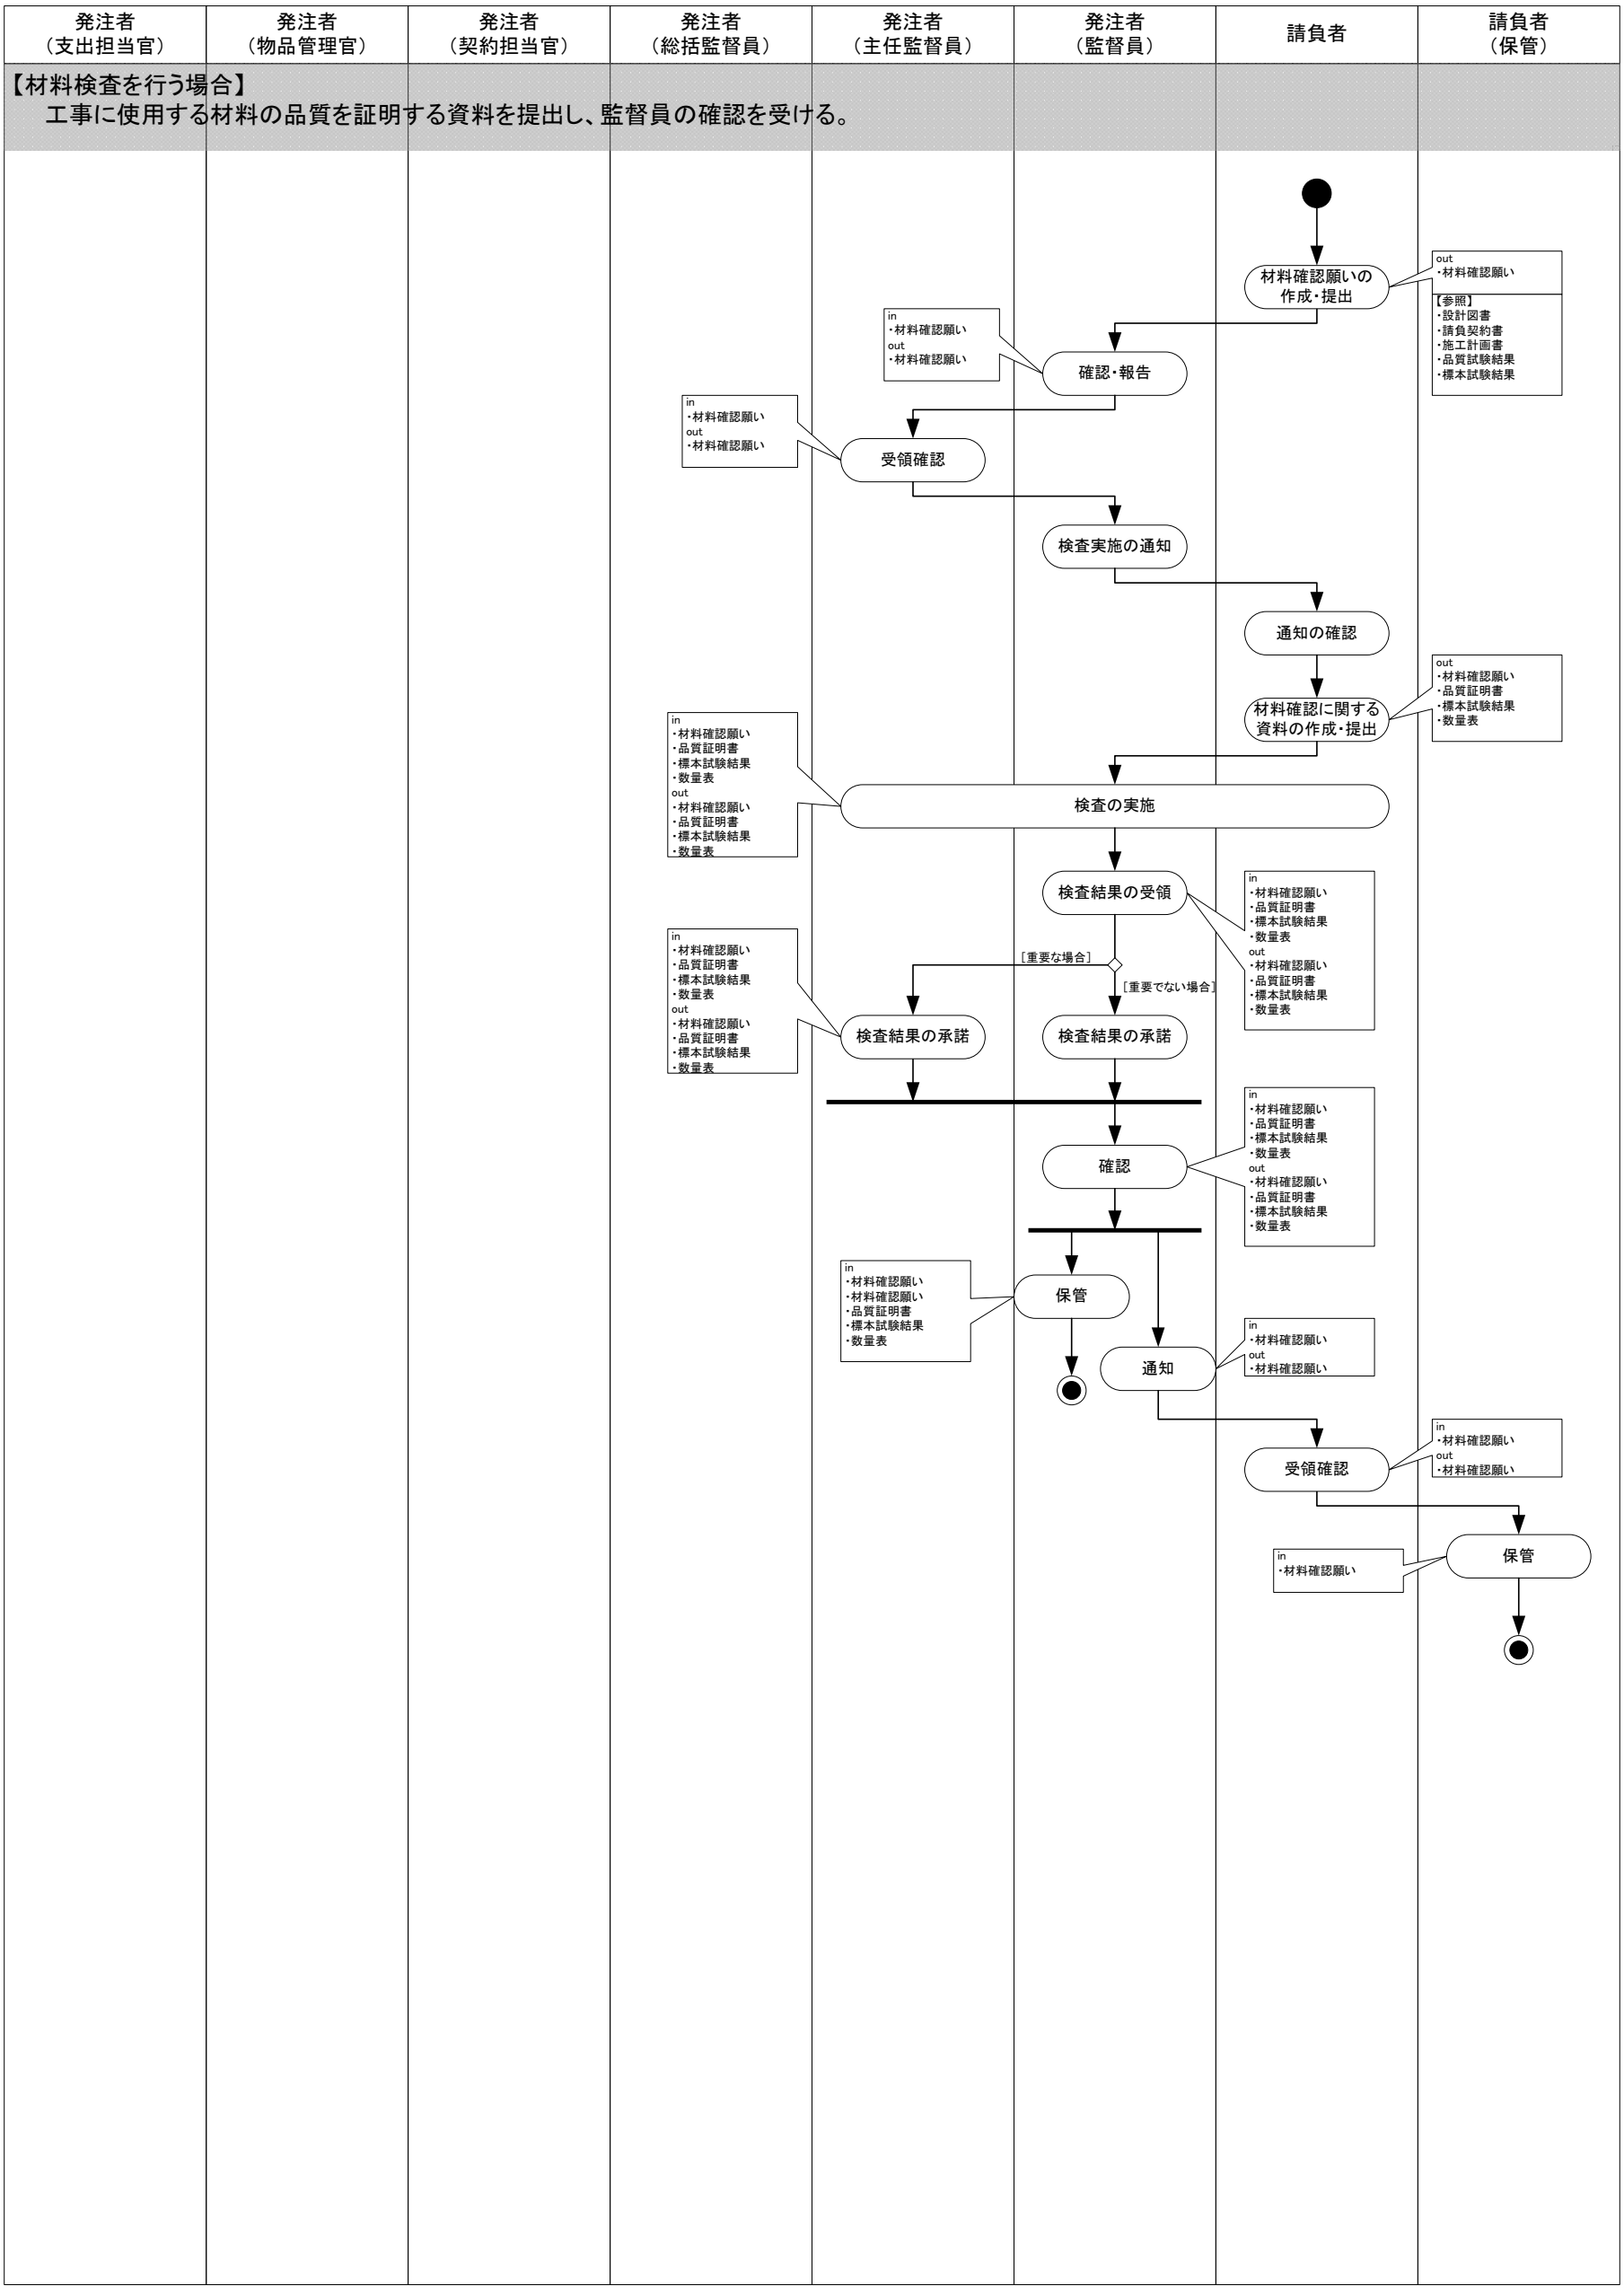

作業場面におけるワークフロー

発注者 （支出担当官）	発注者 （物品管理官）	発注者 （契約担当官）	発注者 （総括監督員）	発注者 （主任監督員）	発注者 （監督員）	請負者	請負者 （保管）
【協議確認を行う場合】 発注者と請負者の間において協議を行う場合は、工事に関する指示、協議内容を工事打合せ簿に明記する。							

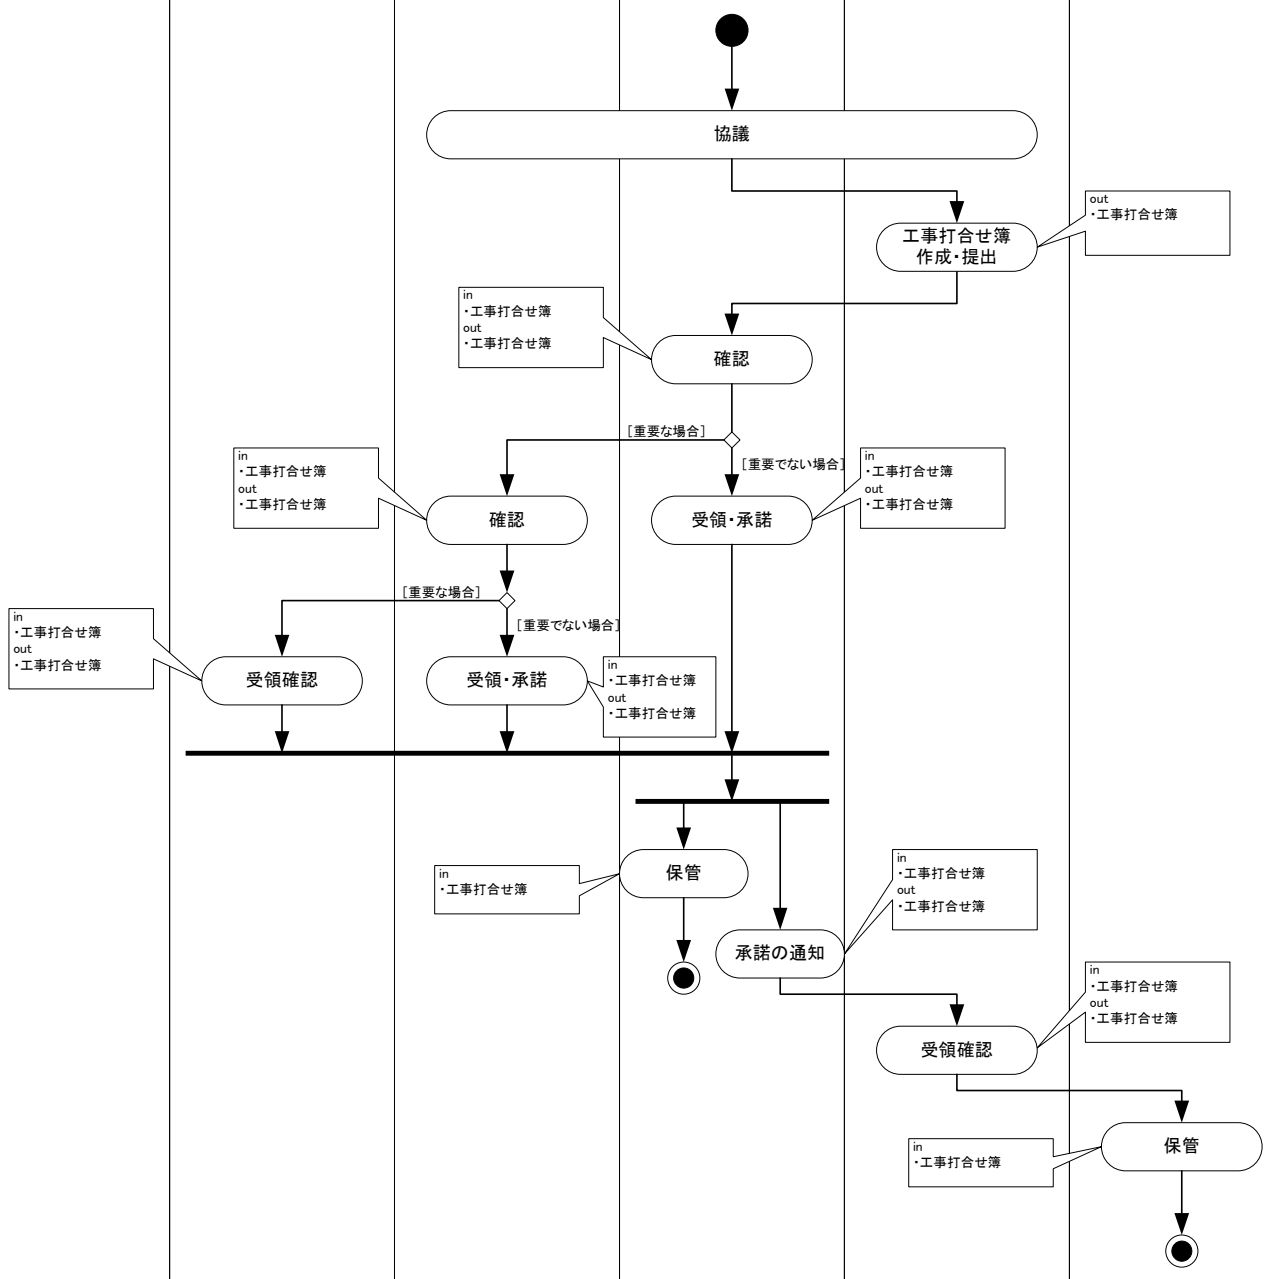

作業場面におけるワークフロー

発注者 （支出担当官）	発注者 （物品管理官）	発注者 （契約担当官）	発注者 （総括監督員）	発注者 （主任監督員）	発注者 （監督員）	請負者	請負者 （保管）
【確認承諾を行う場合】 発注者と請負者の間において、「確認」を行う場合は、事前に確認・立会願い書により、確認依頼を行い、工事打合せ簿により確認内容を保管する。							

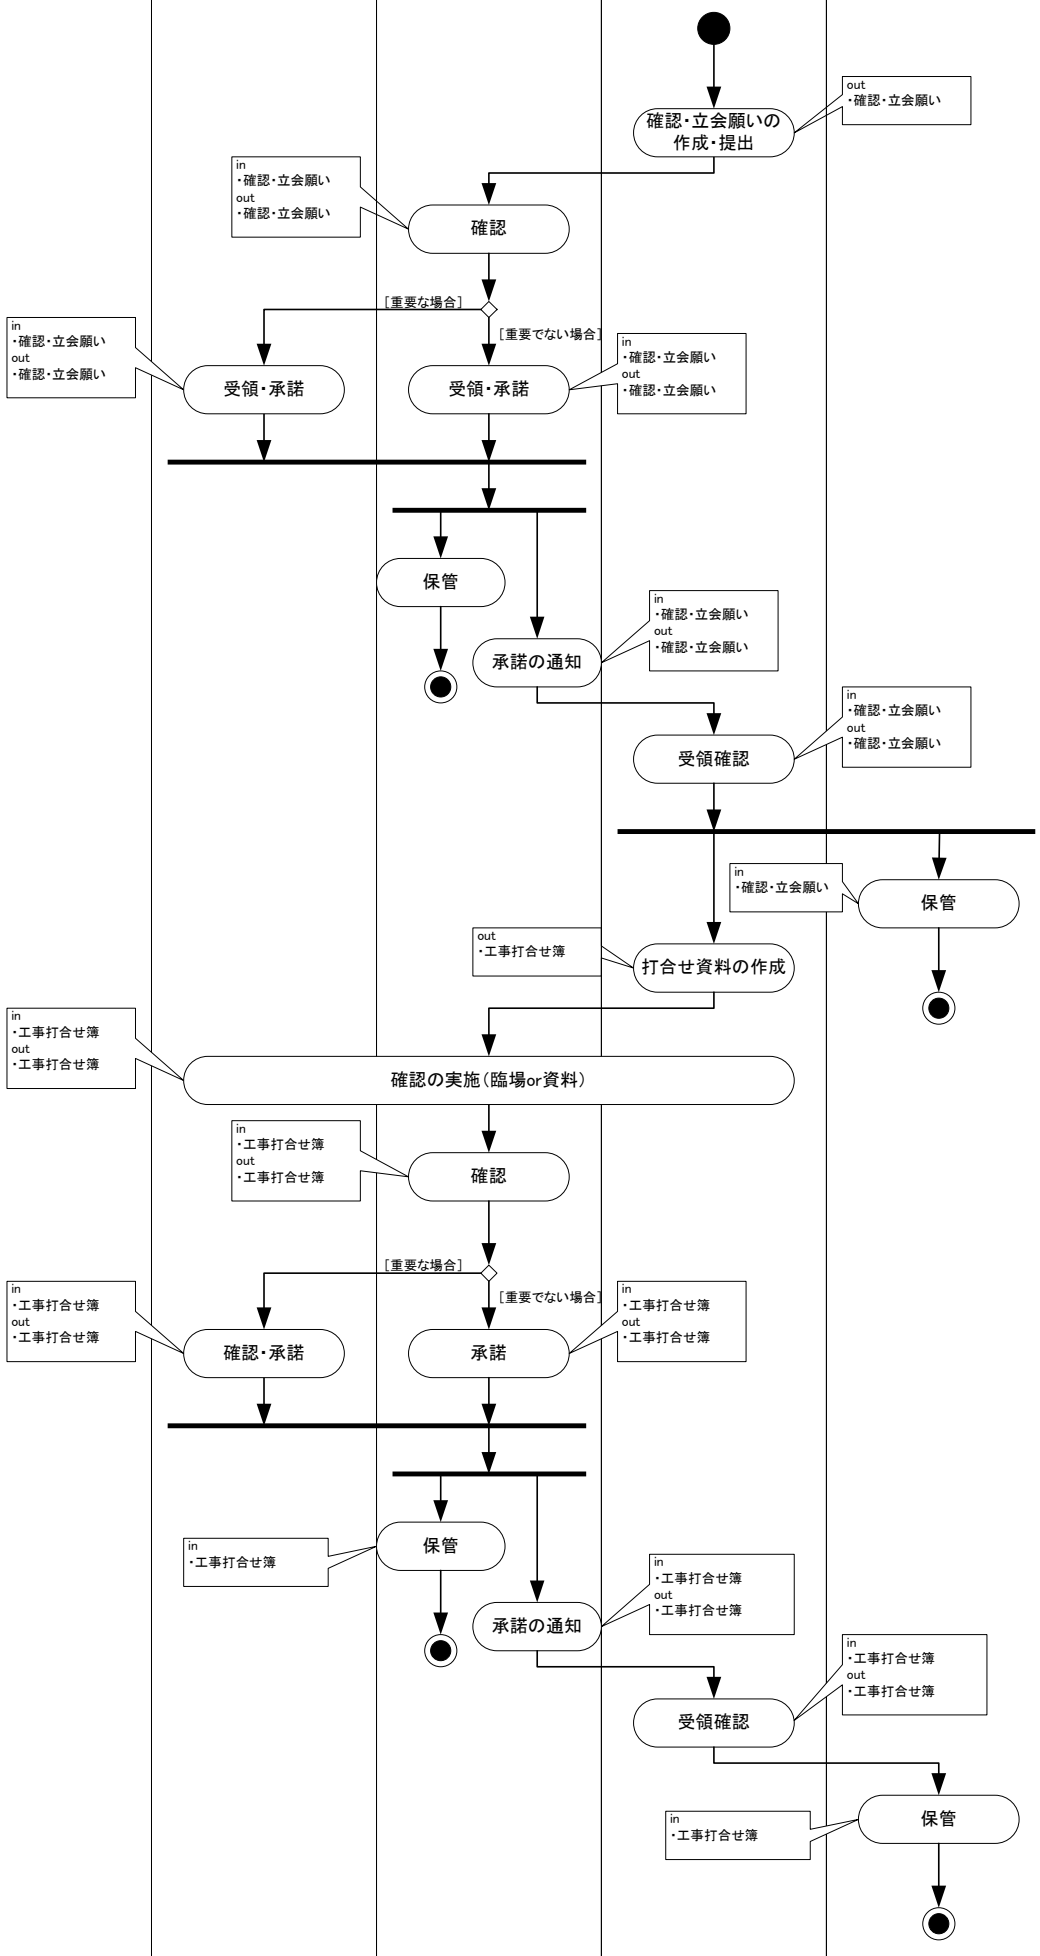

作業場面におけるワークフロー

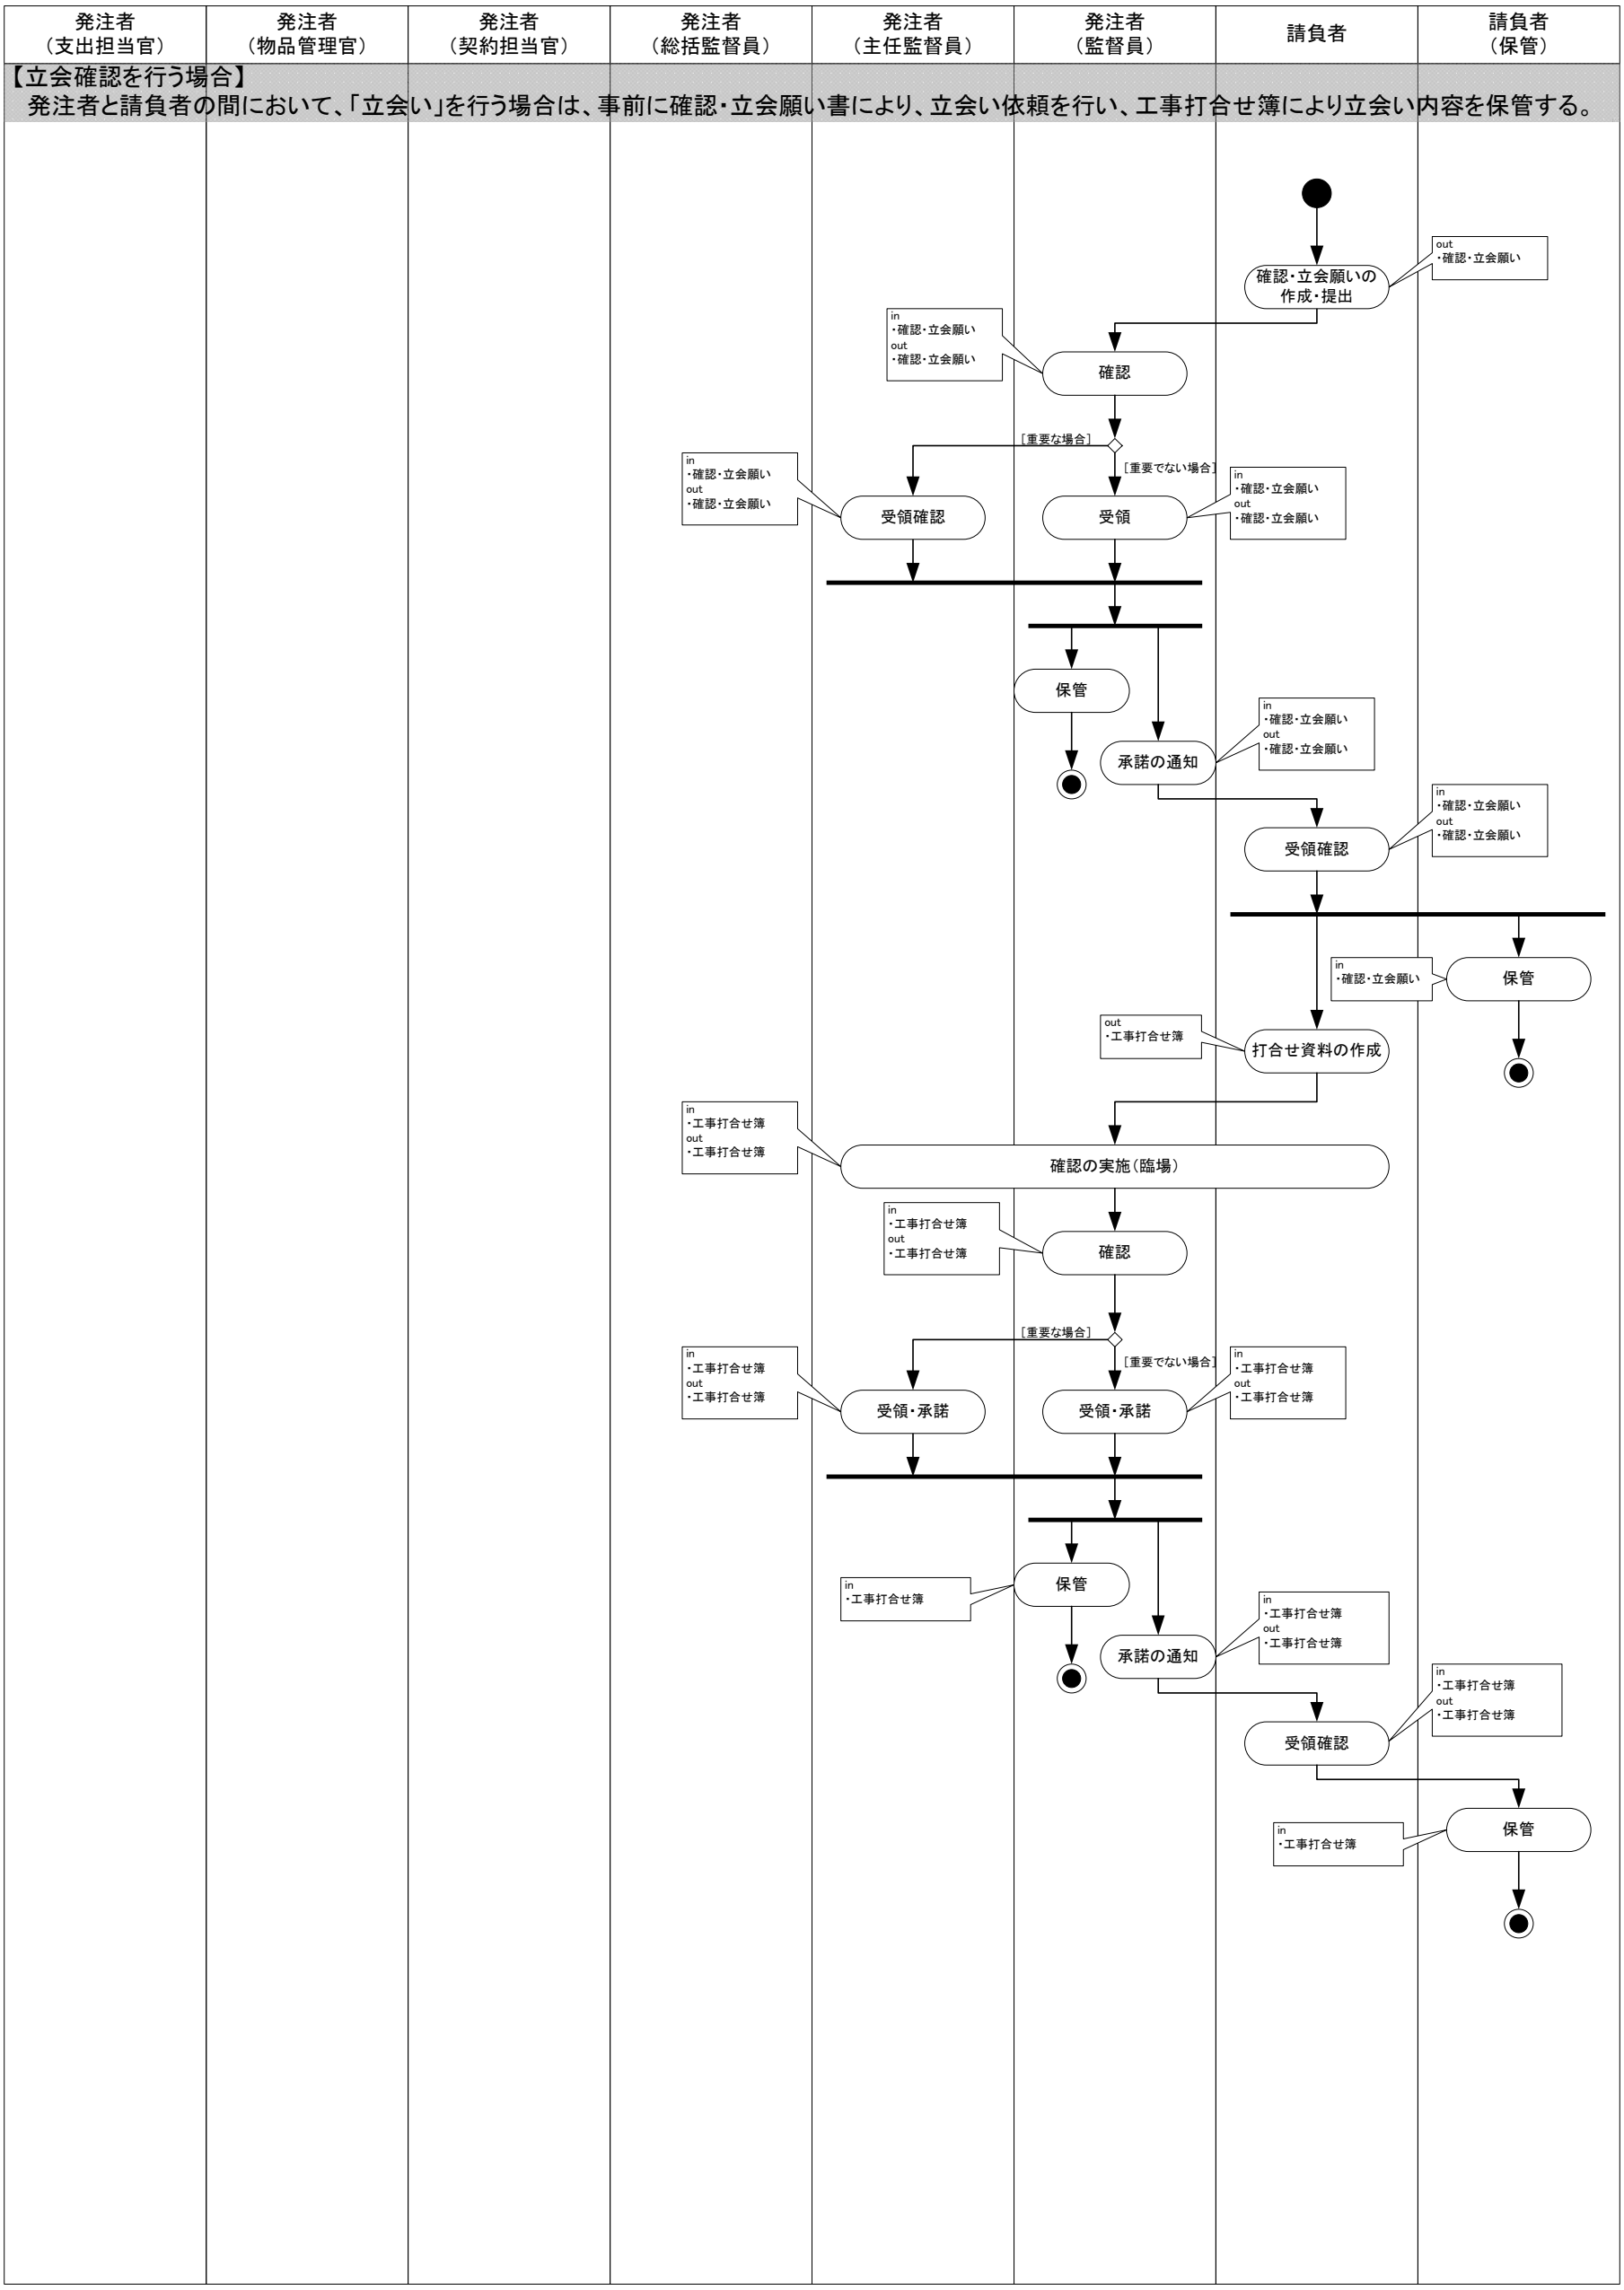

作業場面におけるワークフロー

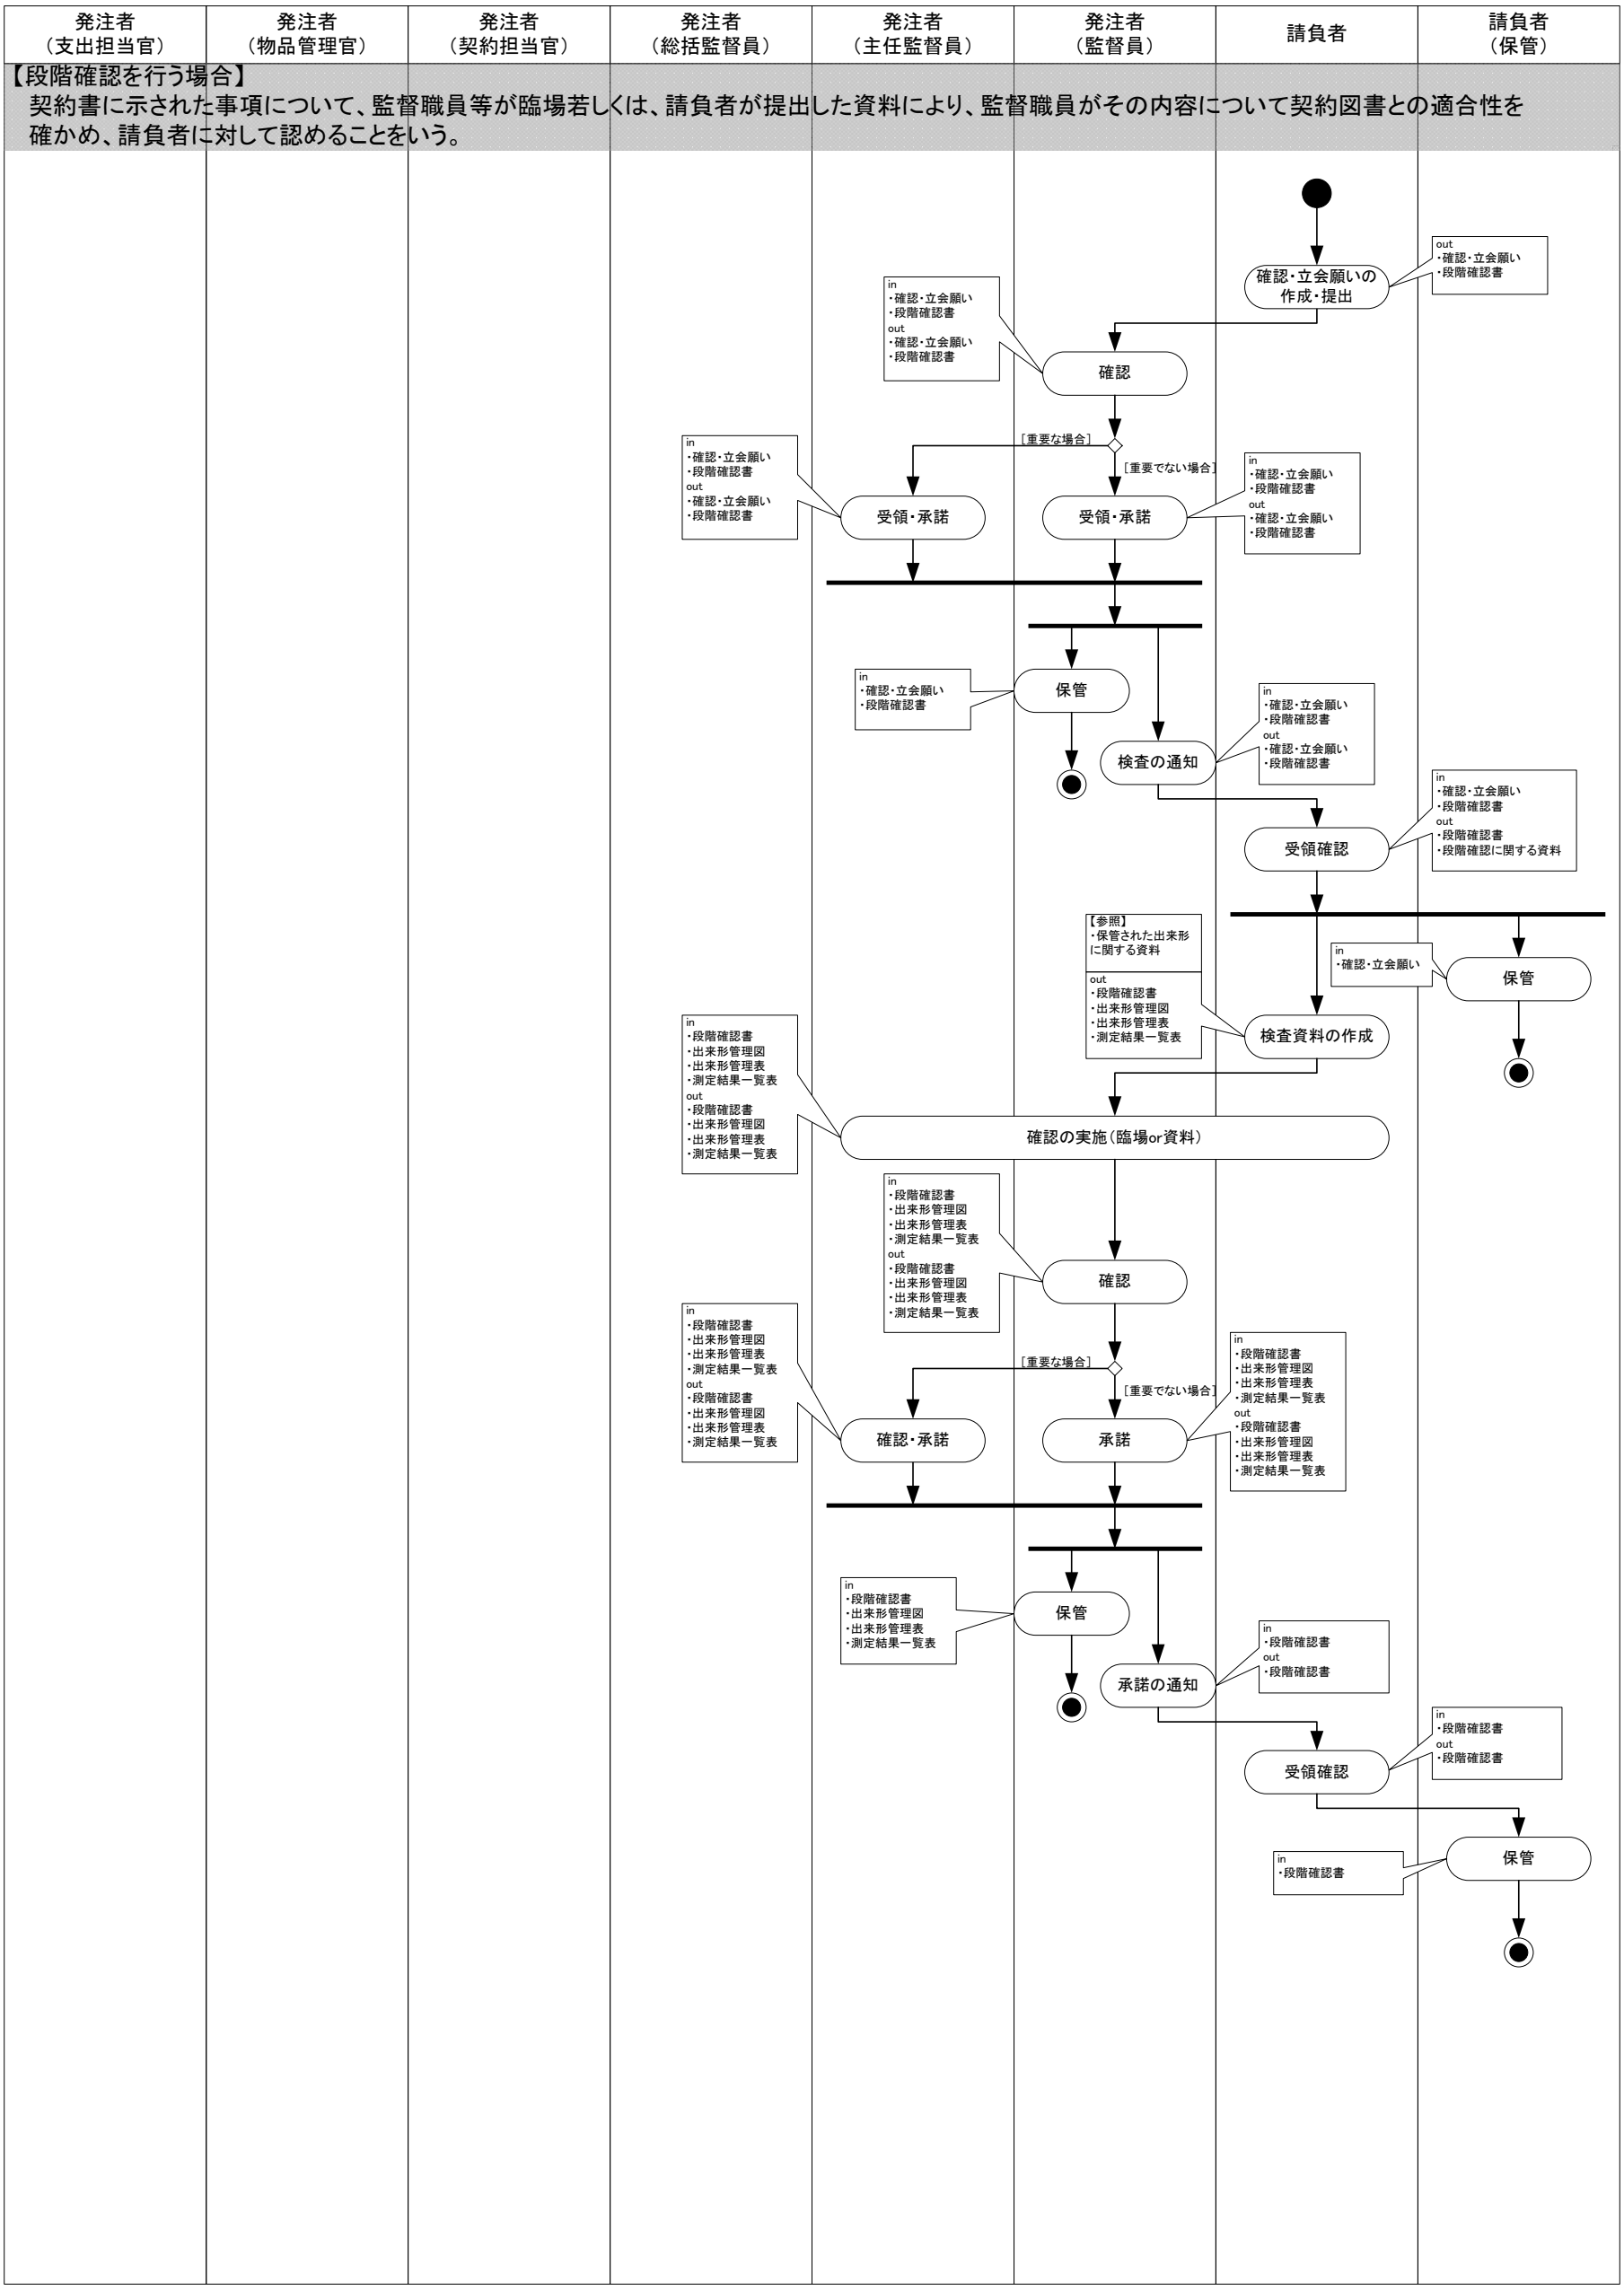

巻末資料2-2-16

巻末資料 3-1　業務改善プロセス

巻末資料3-1-1

請負代金内訳書（現状の業務プロセス（AS-IS））

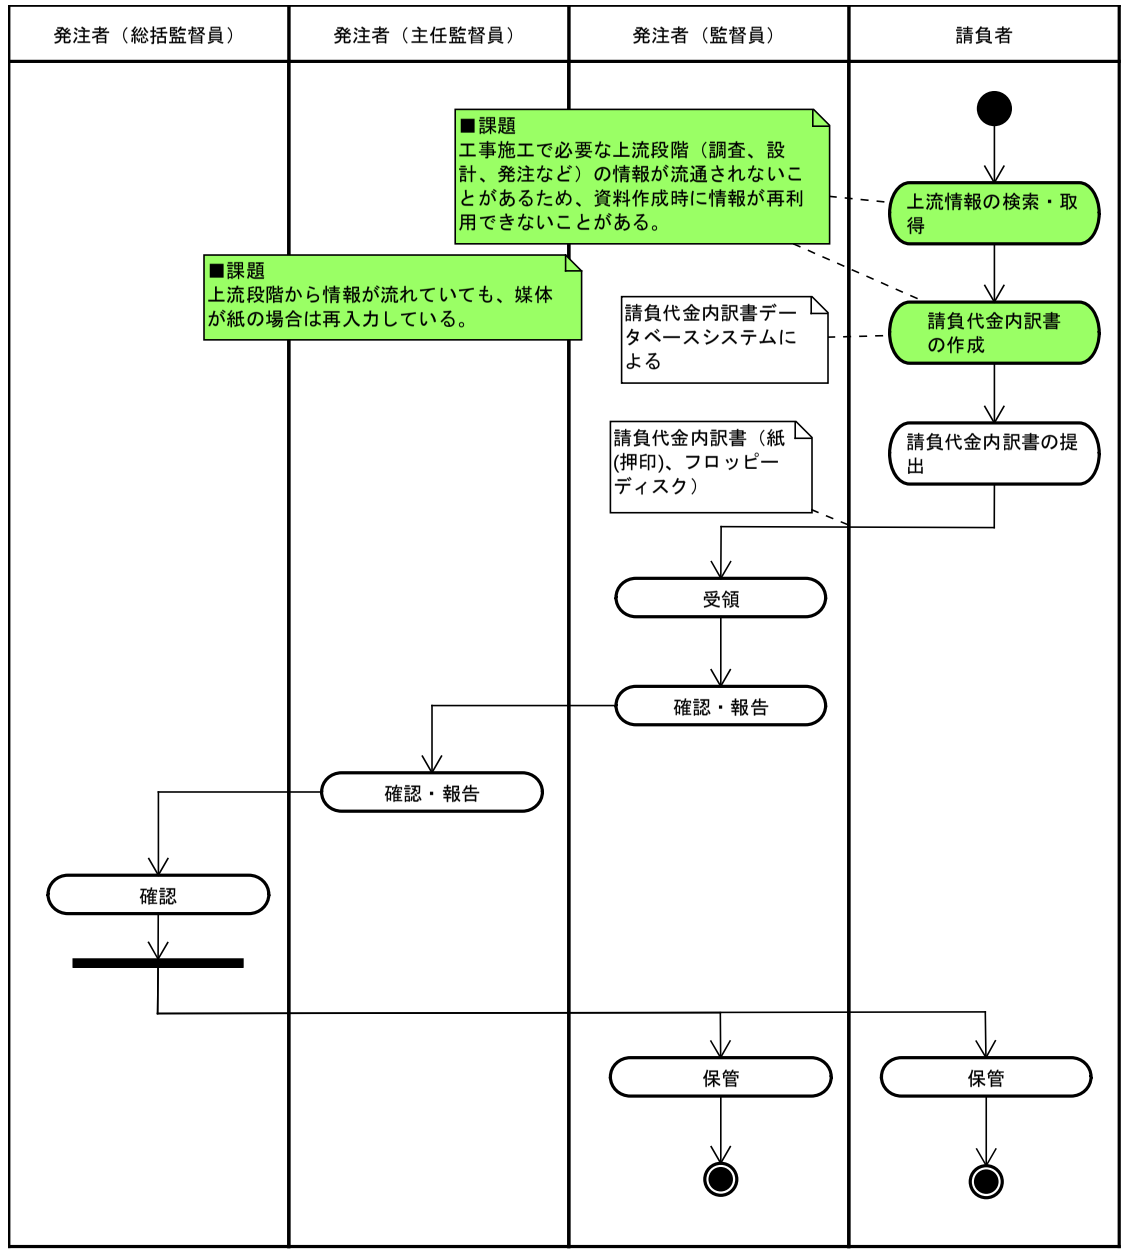

請負代金内訳書（業務改善プロセス（次期モデル））

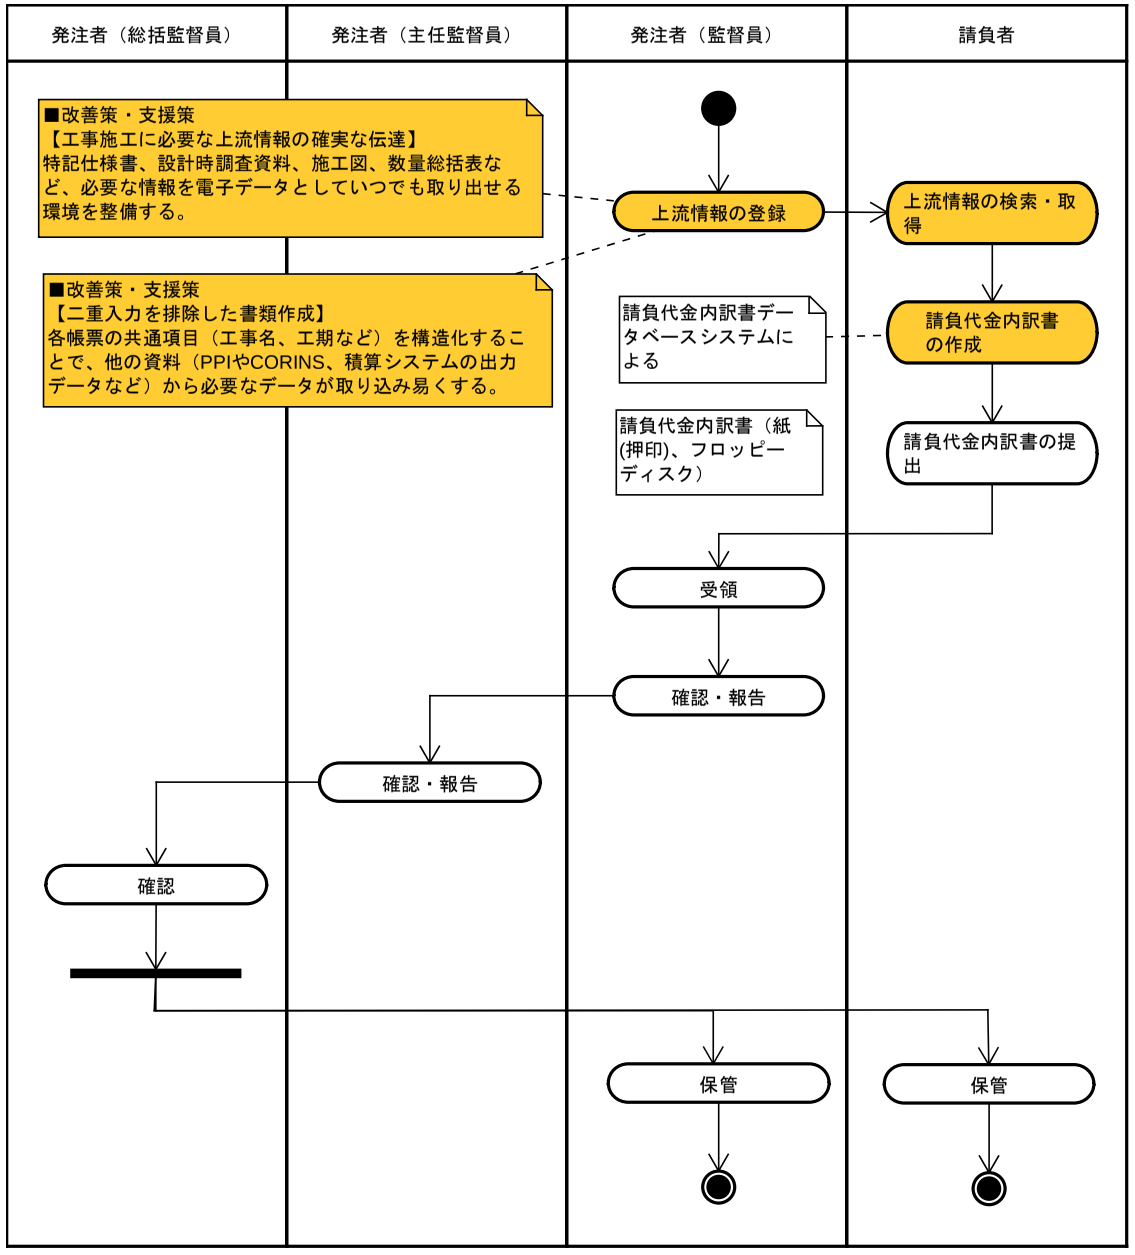

巻末資料3-1-2

協議（現状の業務プロセス（AS-IS））

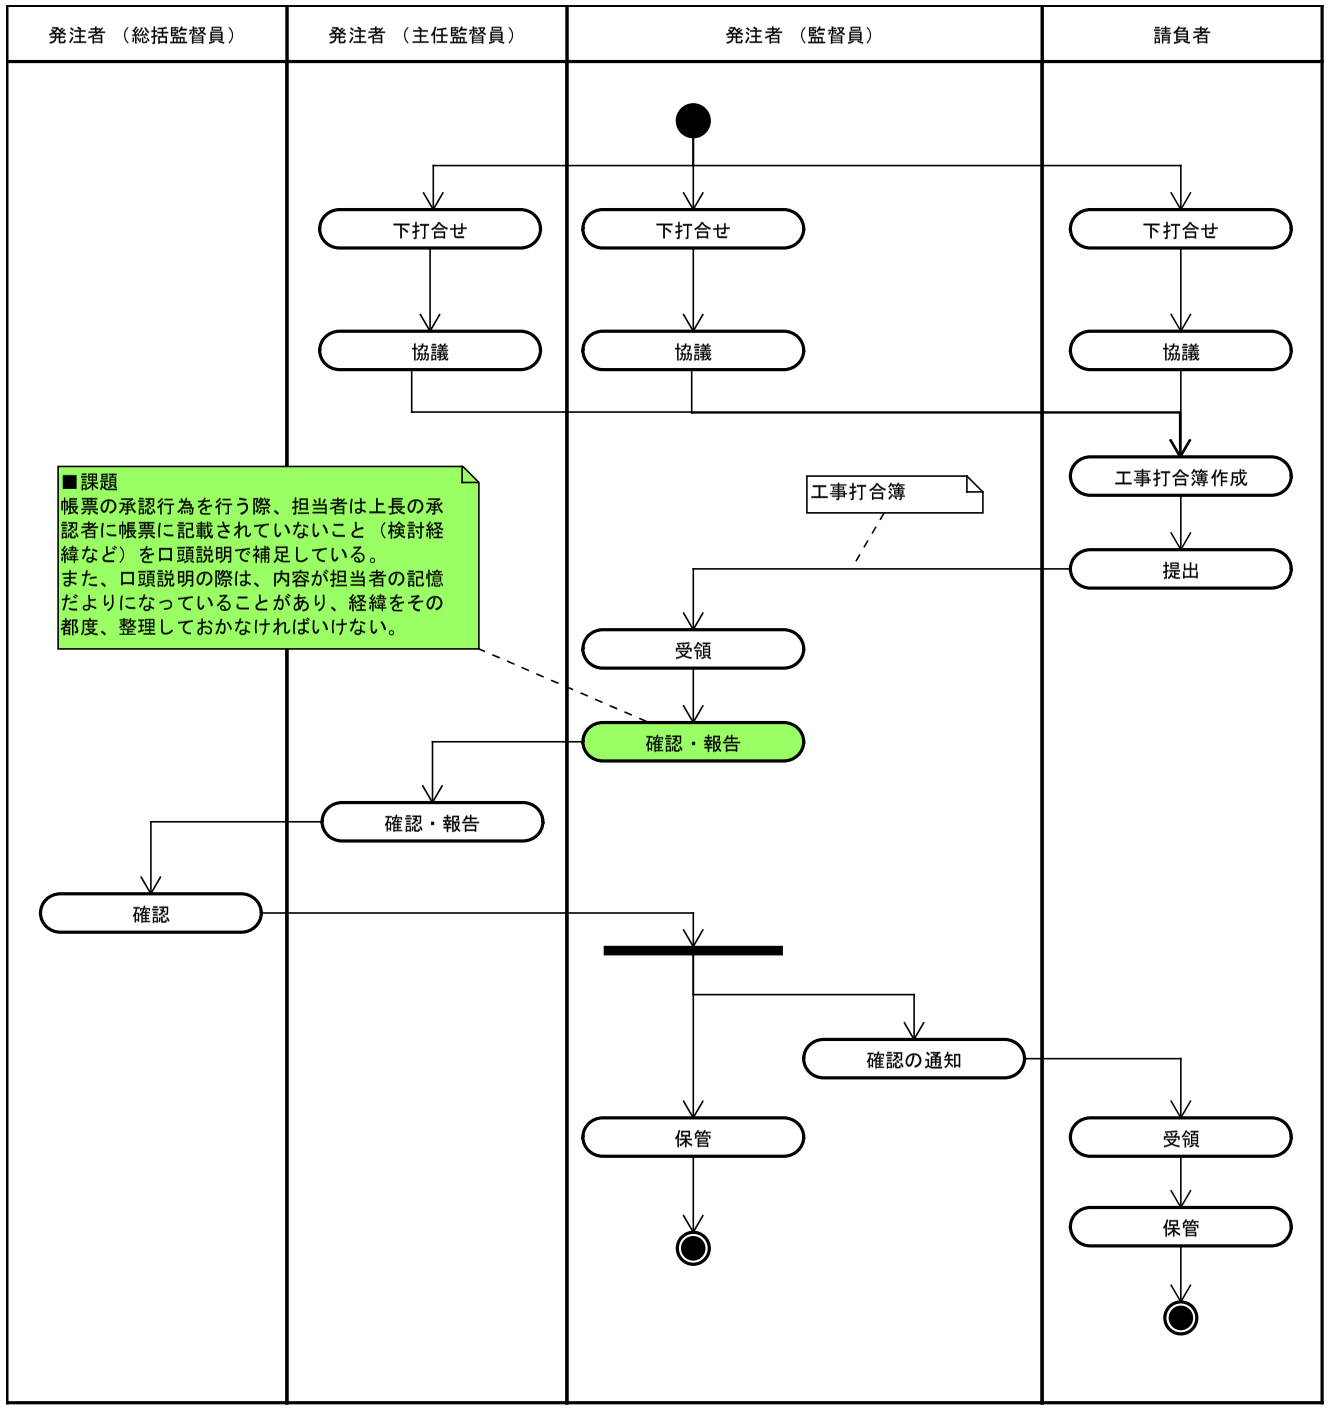

協議（業務改善プロセス（次期モデル））

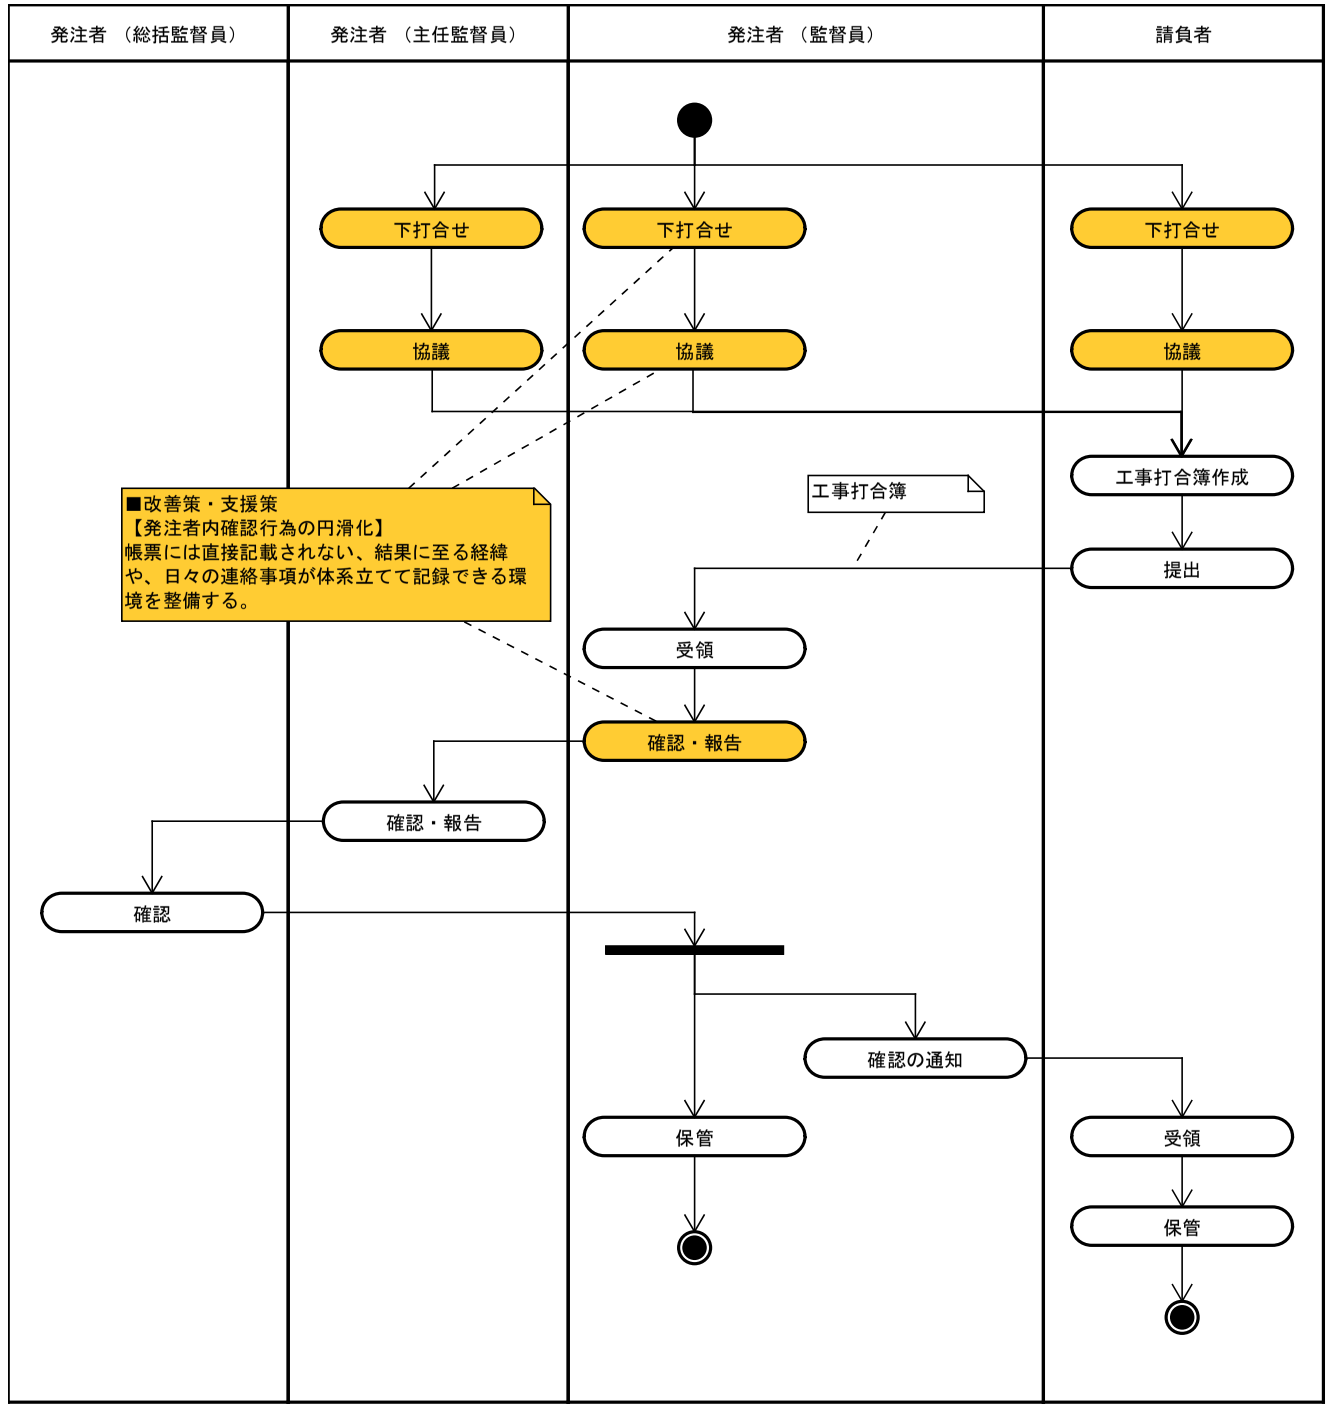

監督職員による検査・立会（現状の業務プロセス（AS-IS））

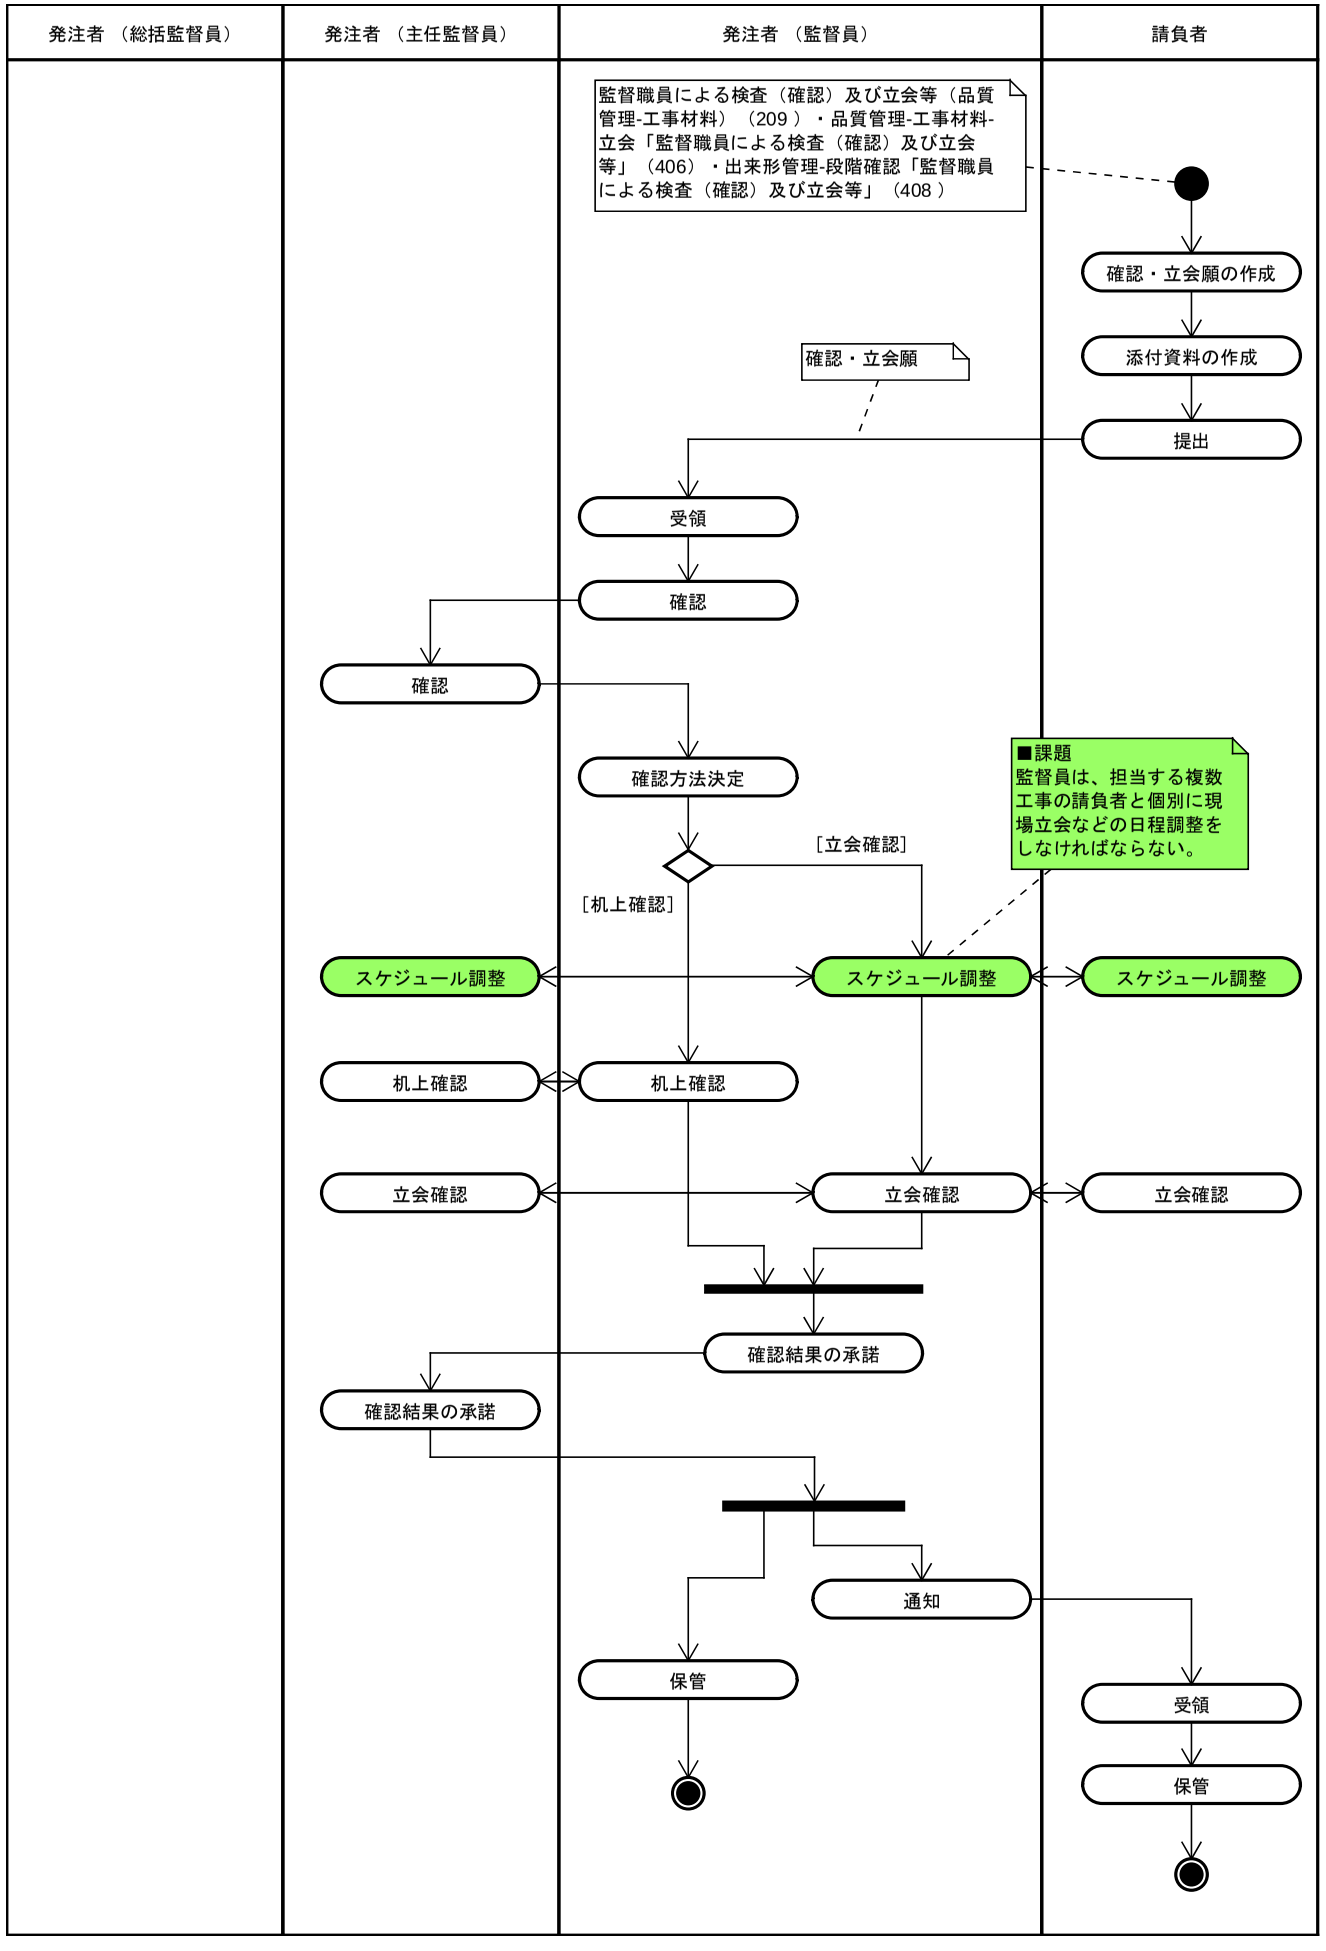

監督職員による検査・立会（業務改善プロセス（次期モデル））

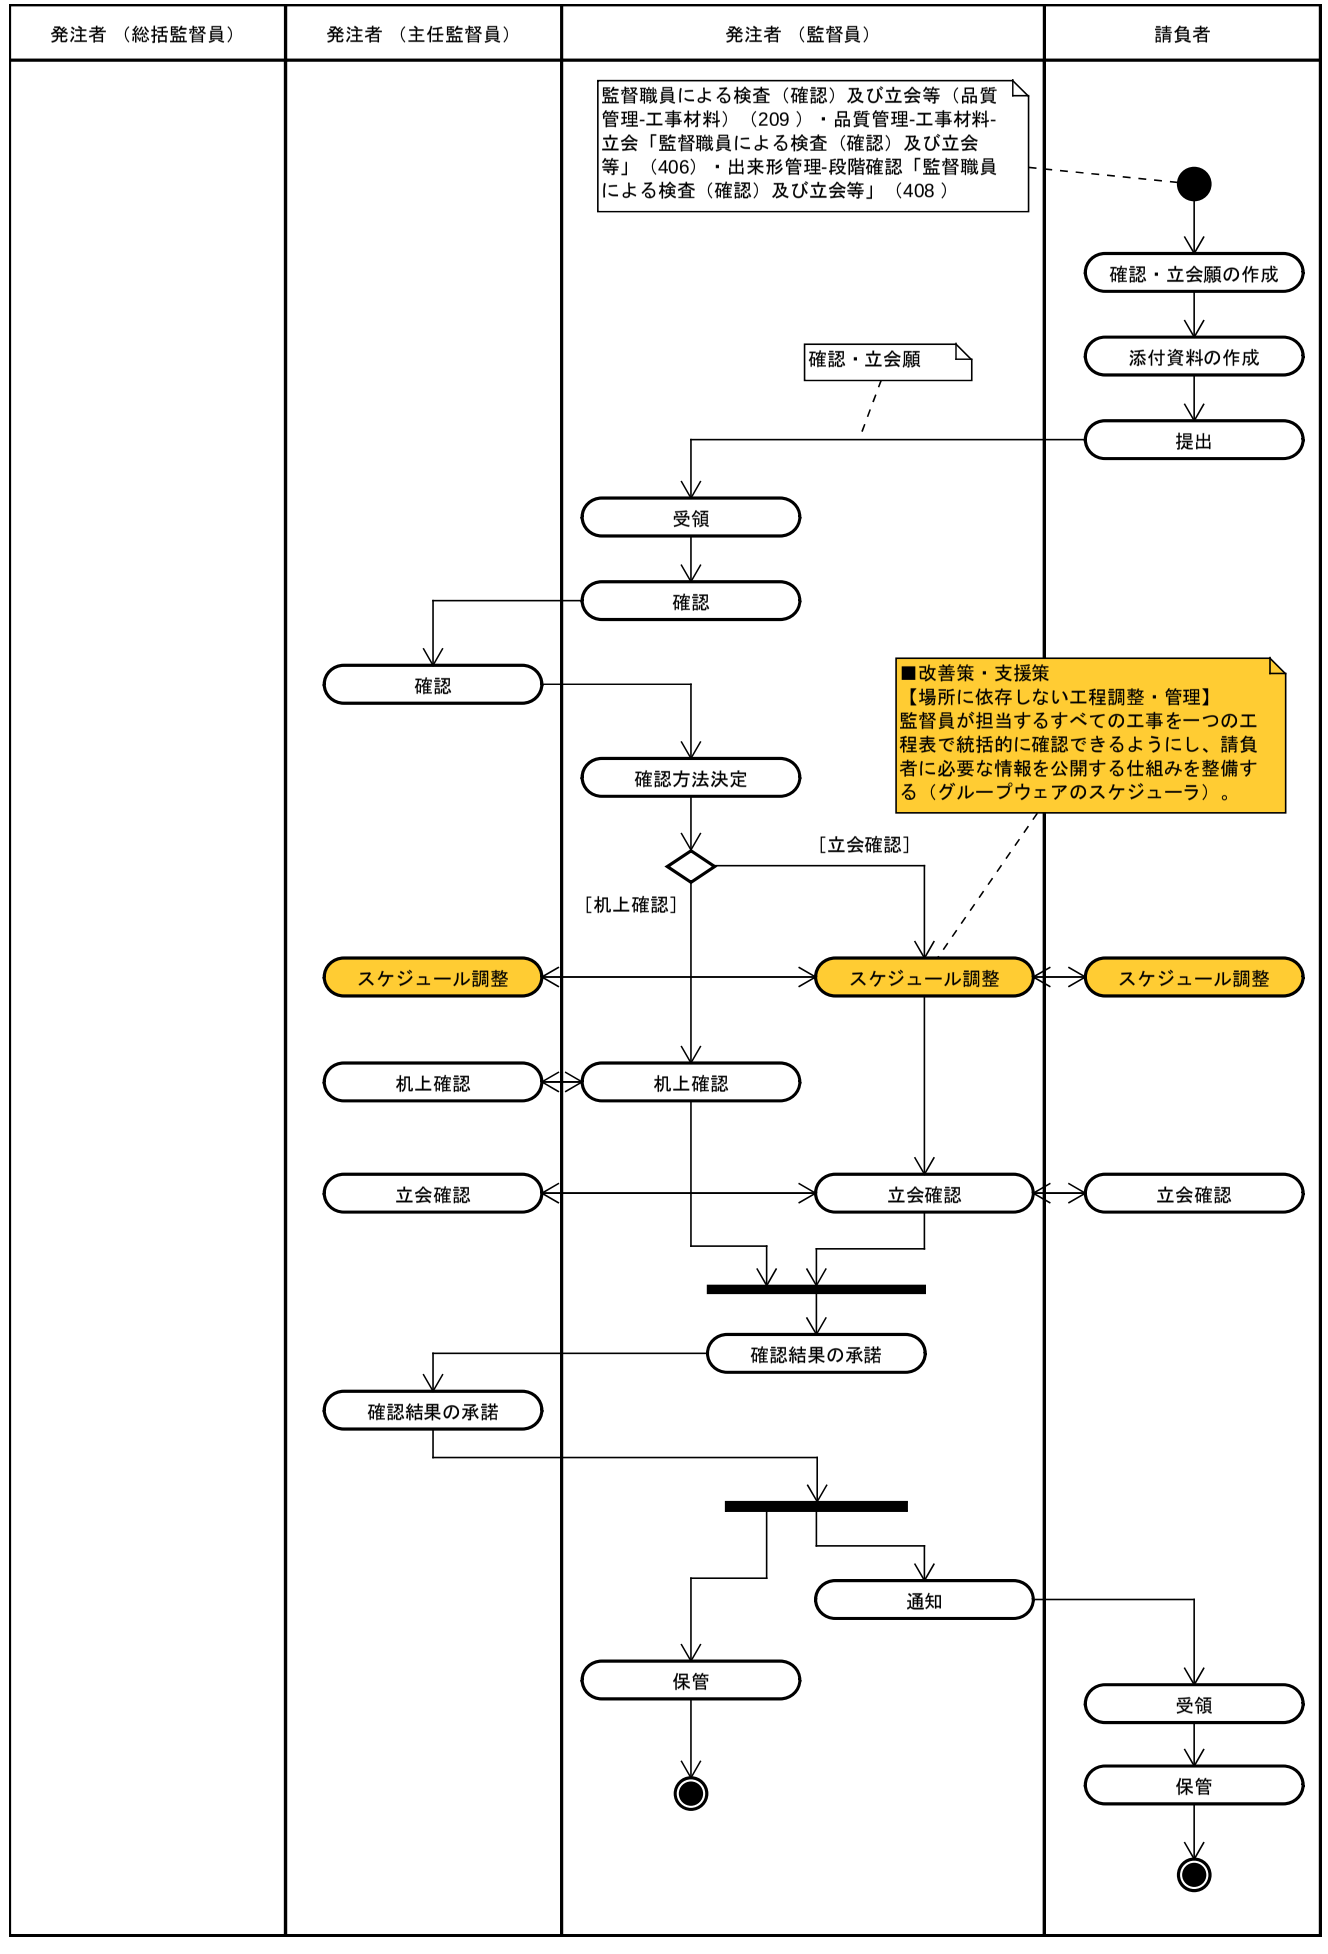

工事打合簿（現状の業務プロセス（AS-IS））

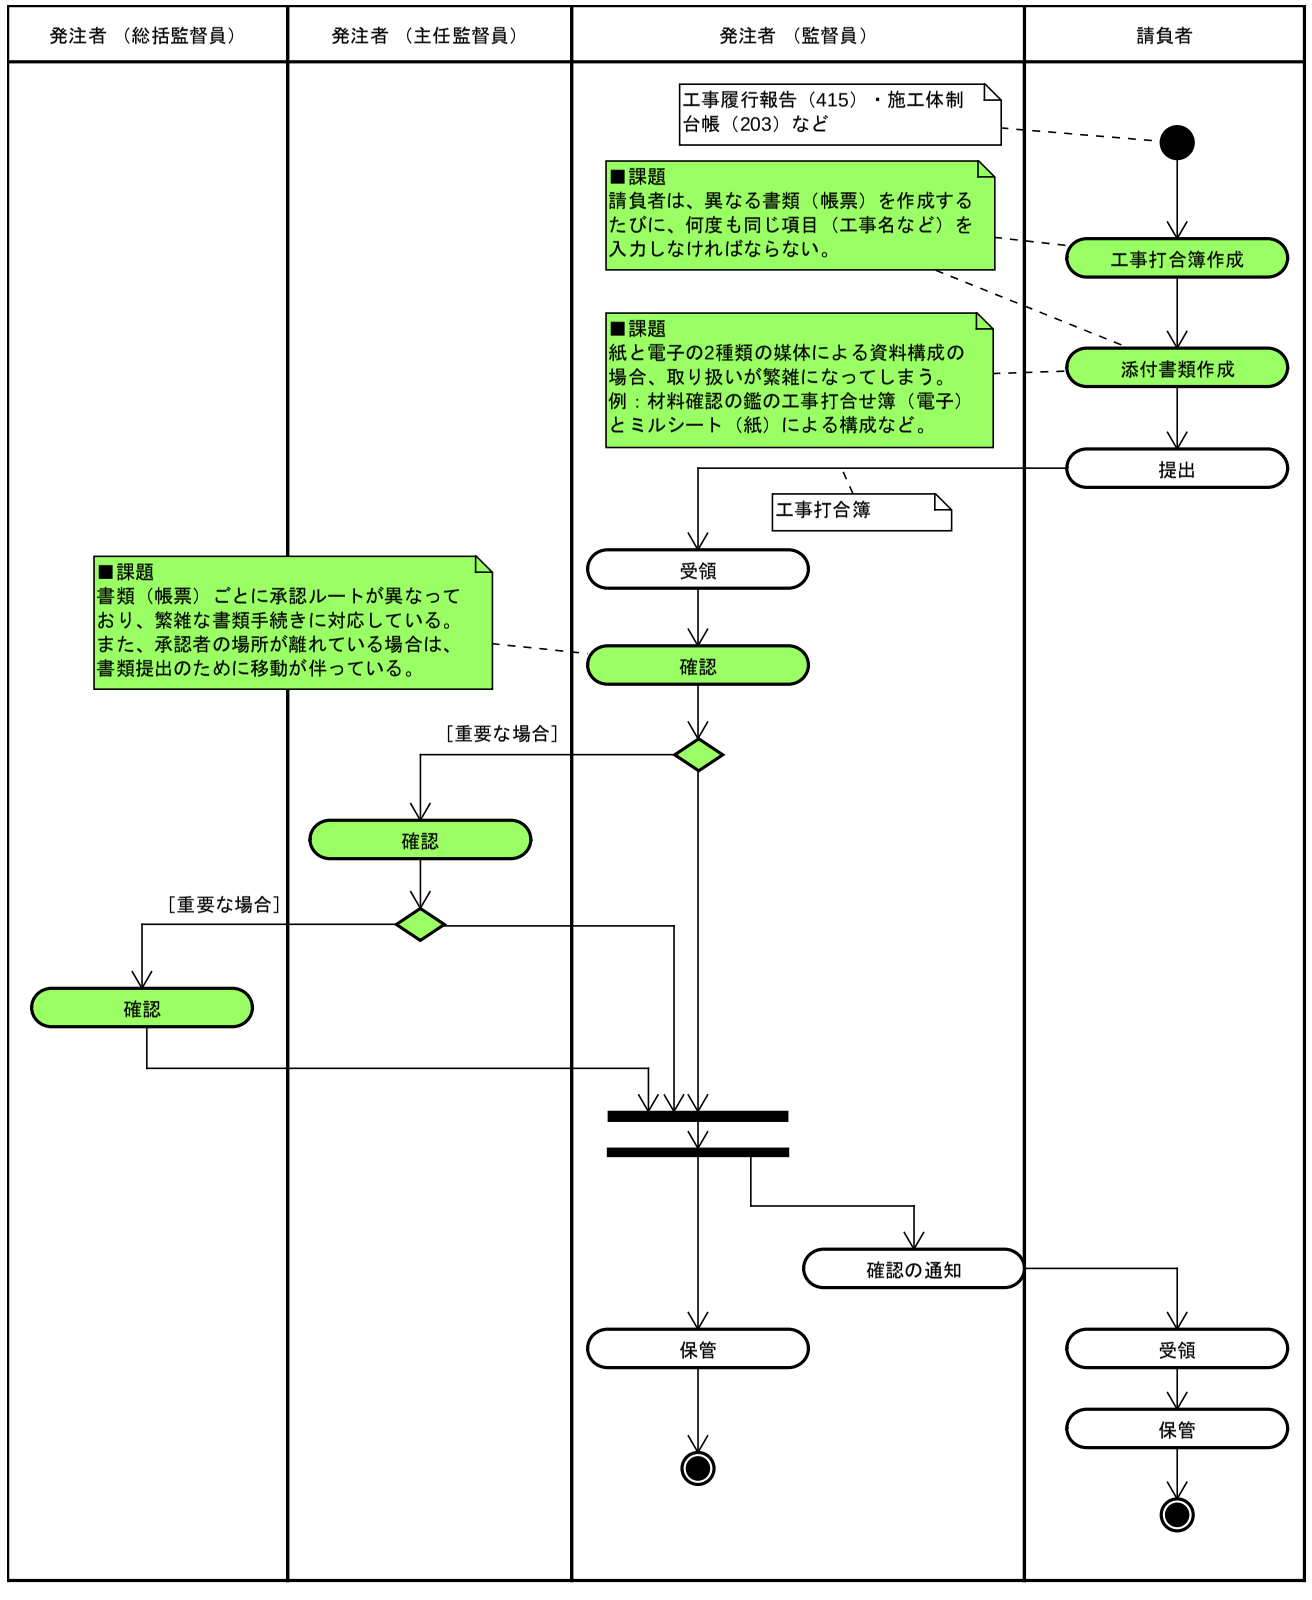

工事打合簿（業務改善プロセス（次期モデル））

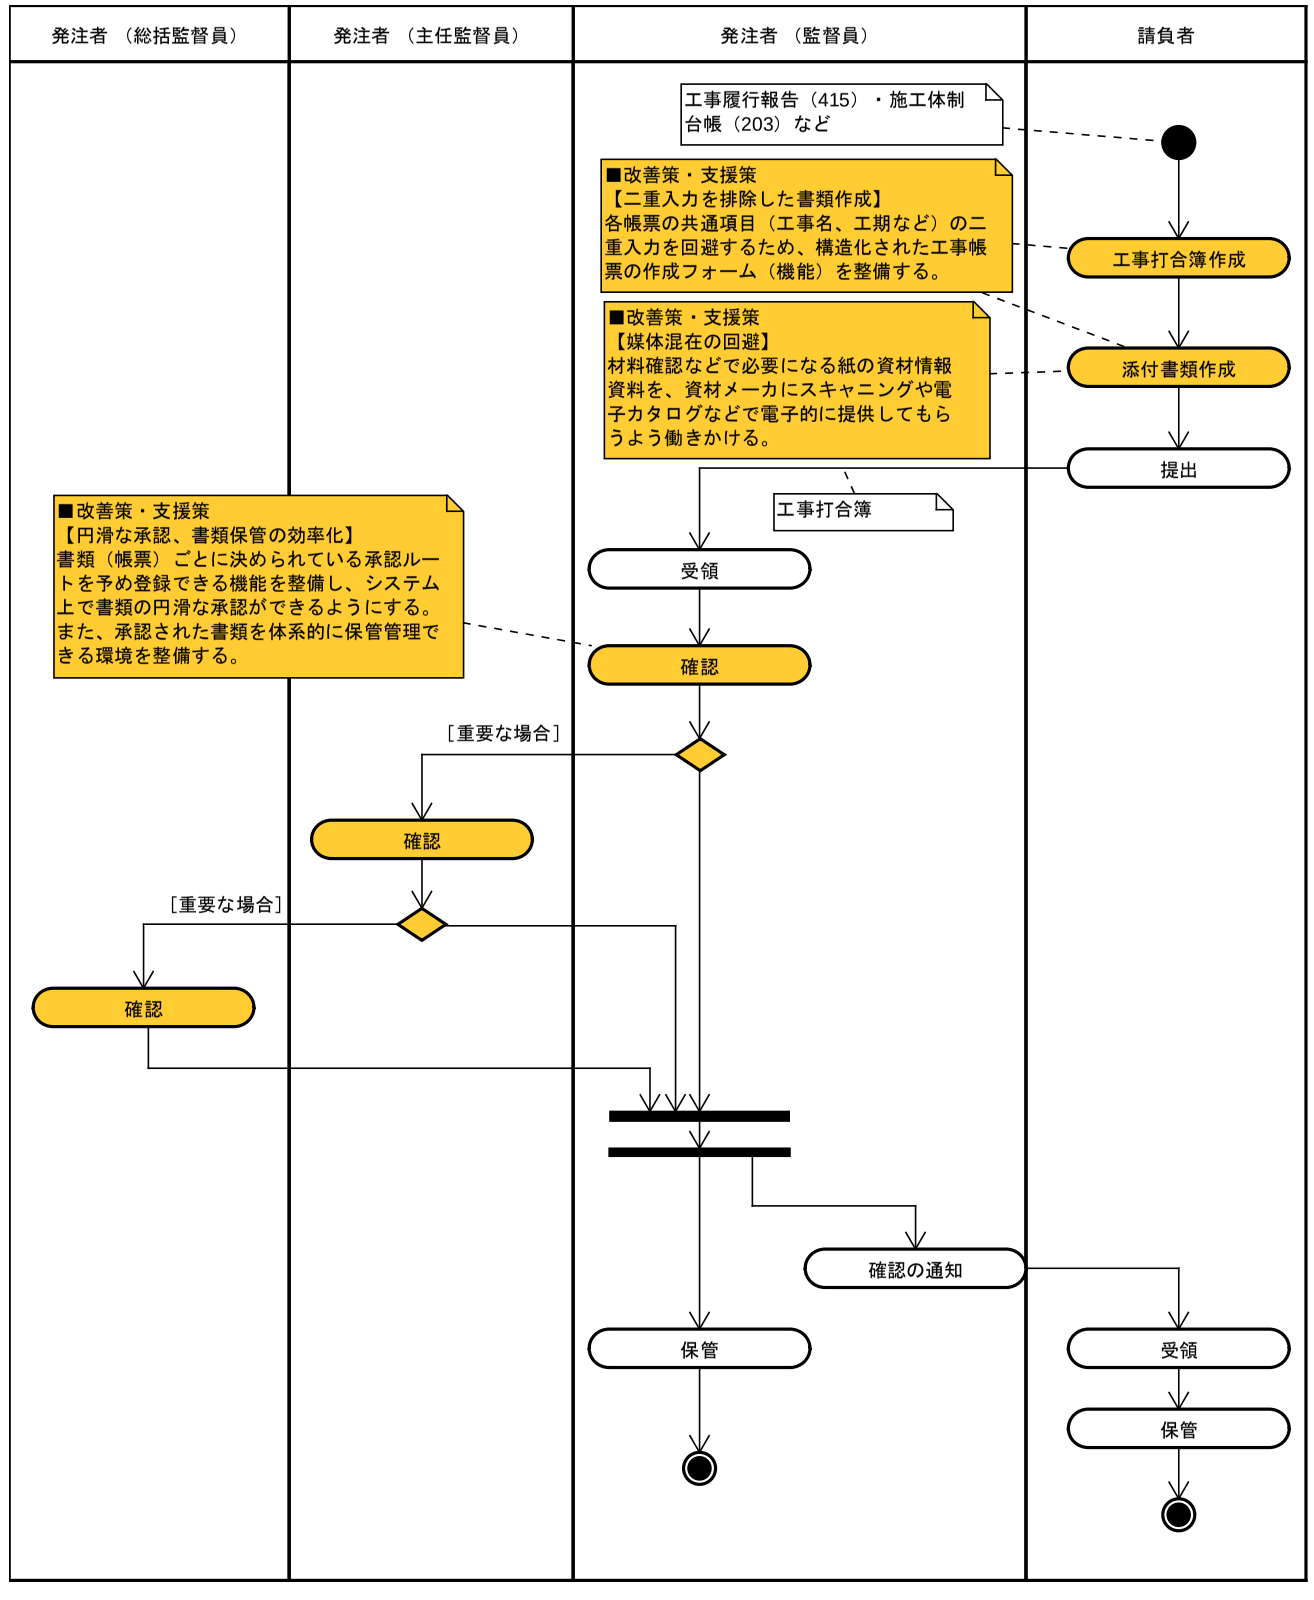

環境管理（現状の業務プロセス（AS-IS））

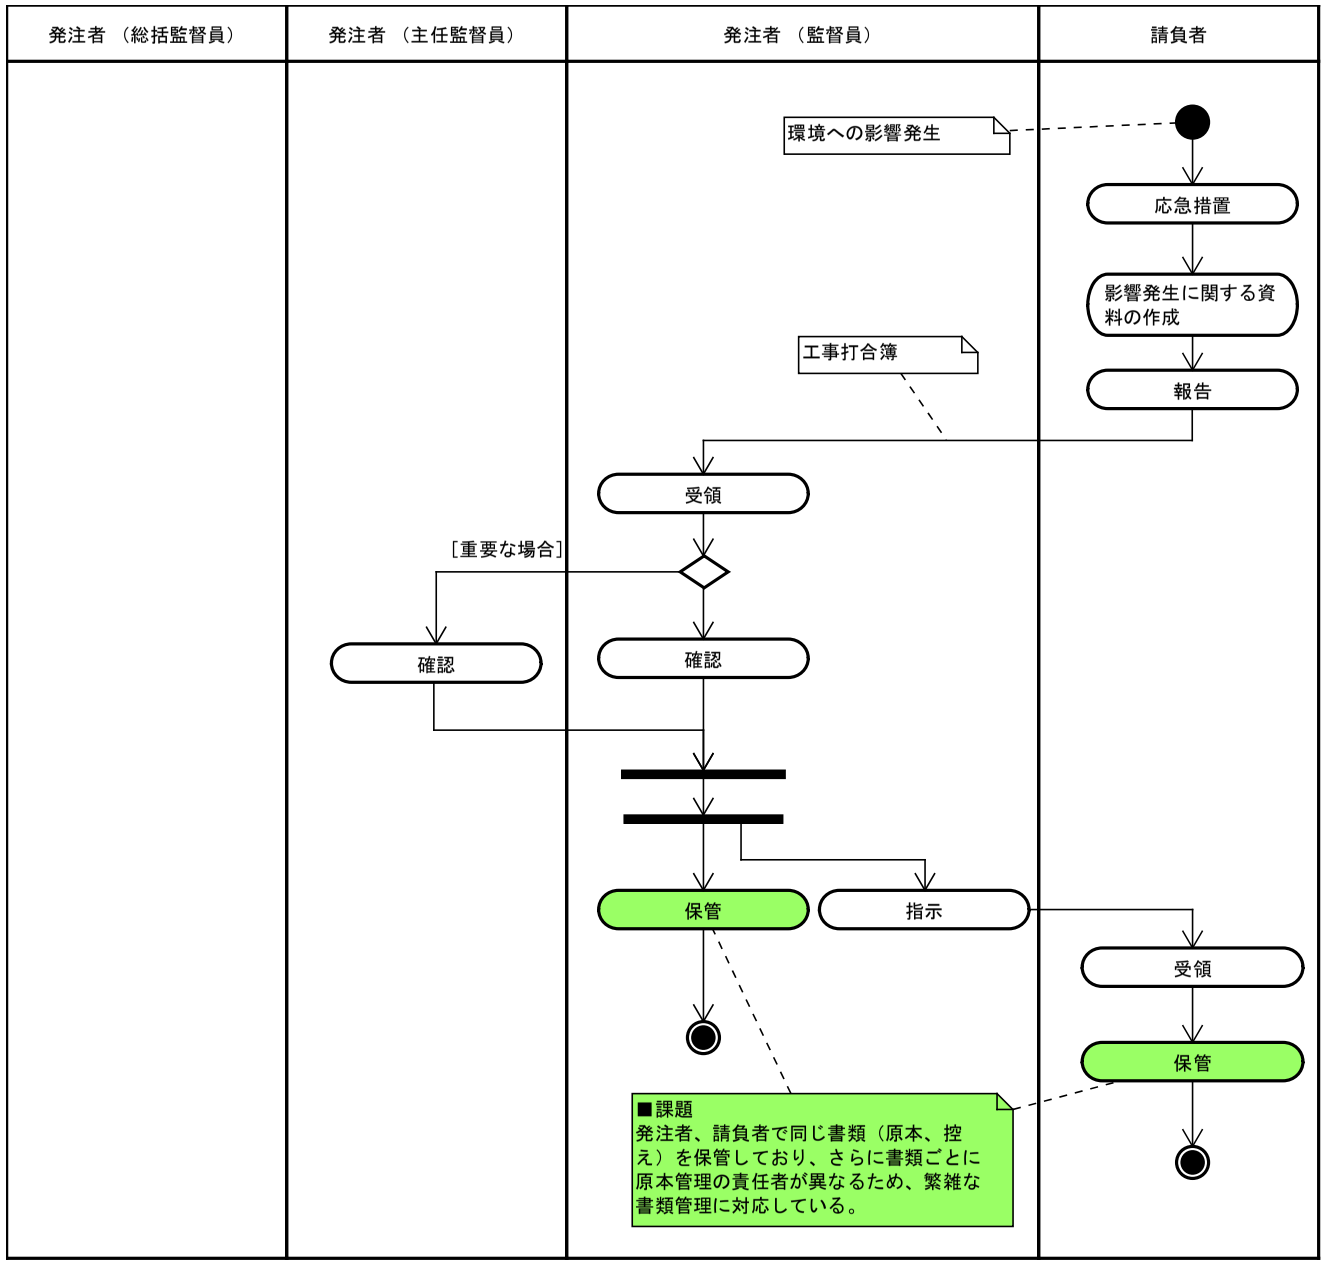

環境管理（業務改善プロセス（次期モデル））

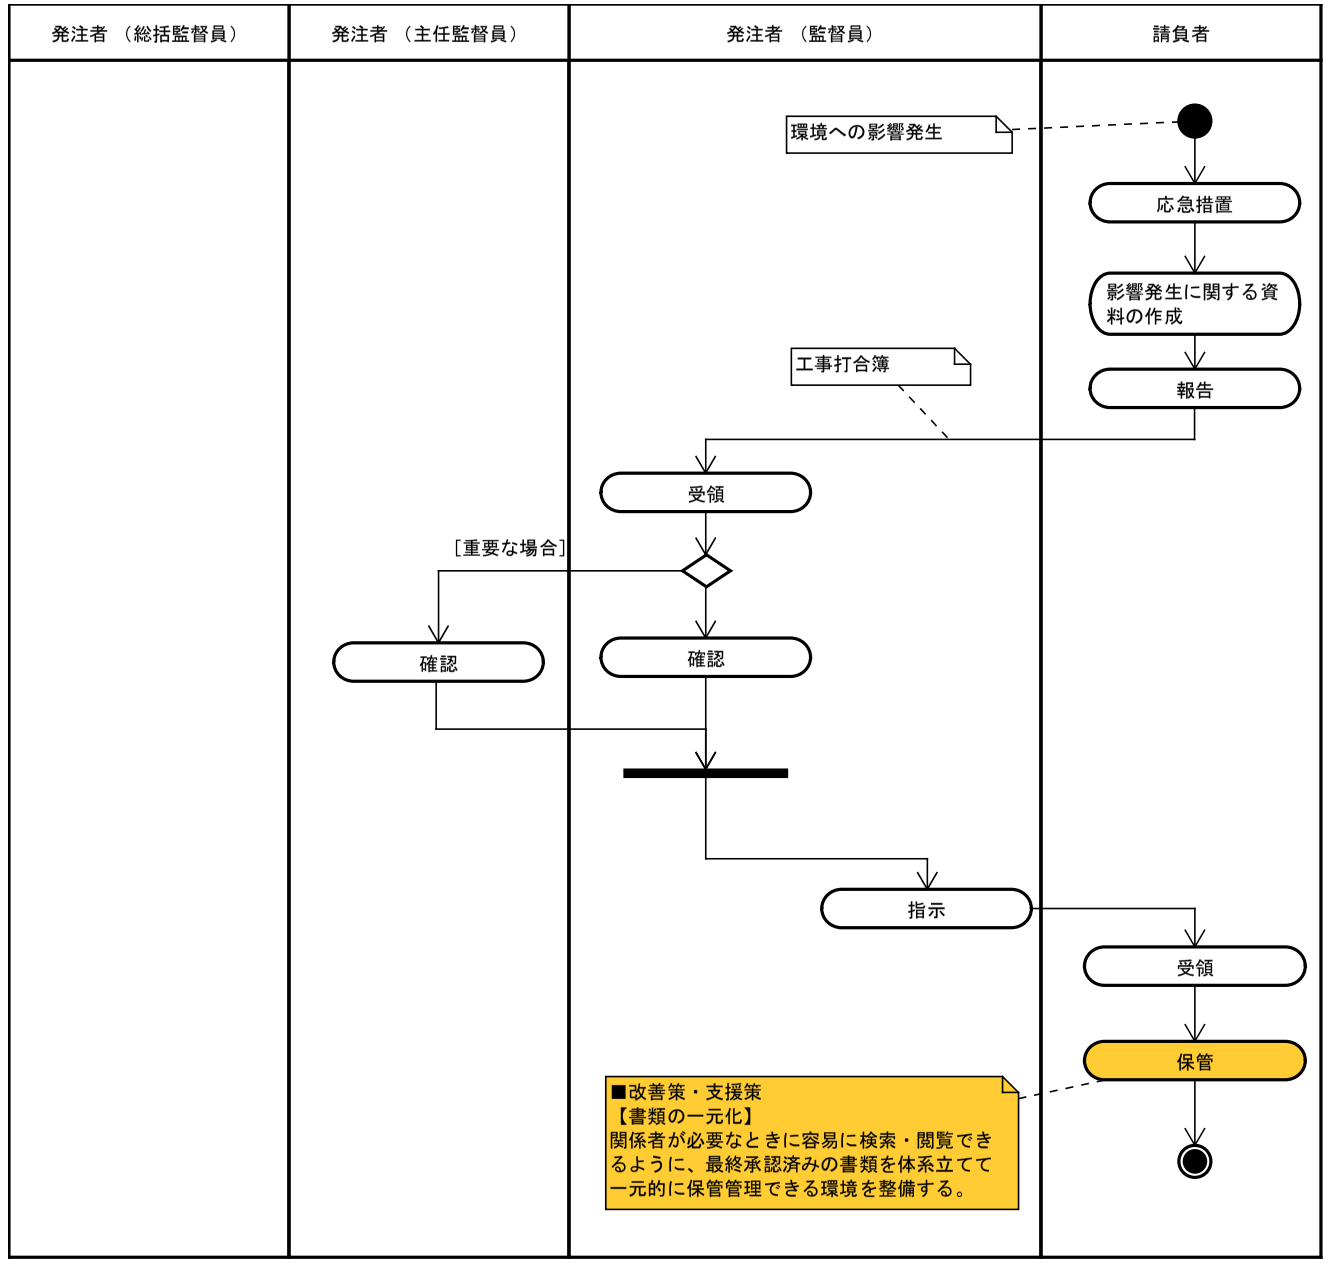

技術検査（現状の業務プロセス（AS-IS））

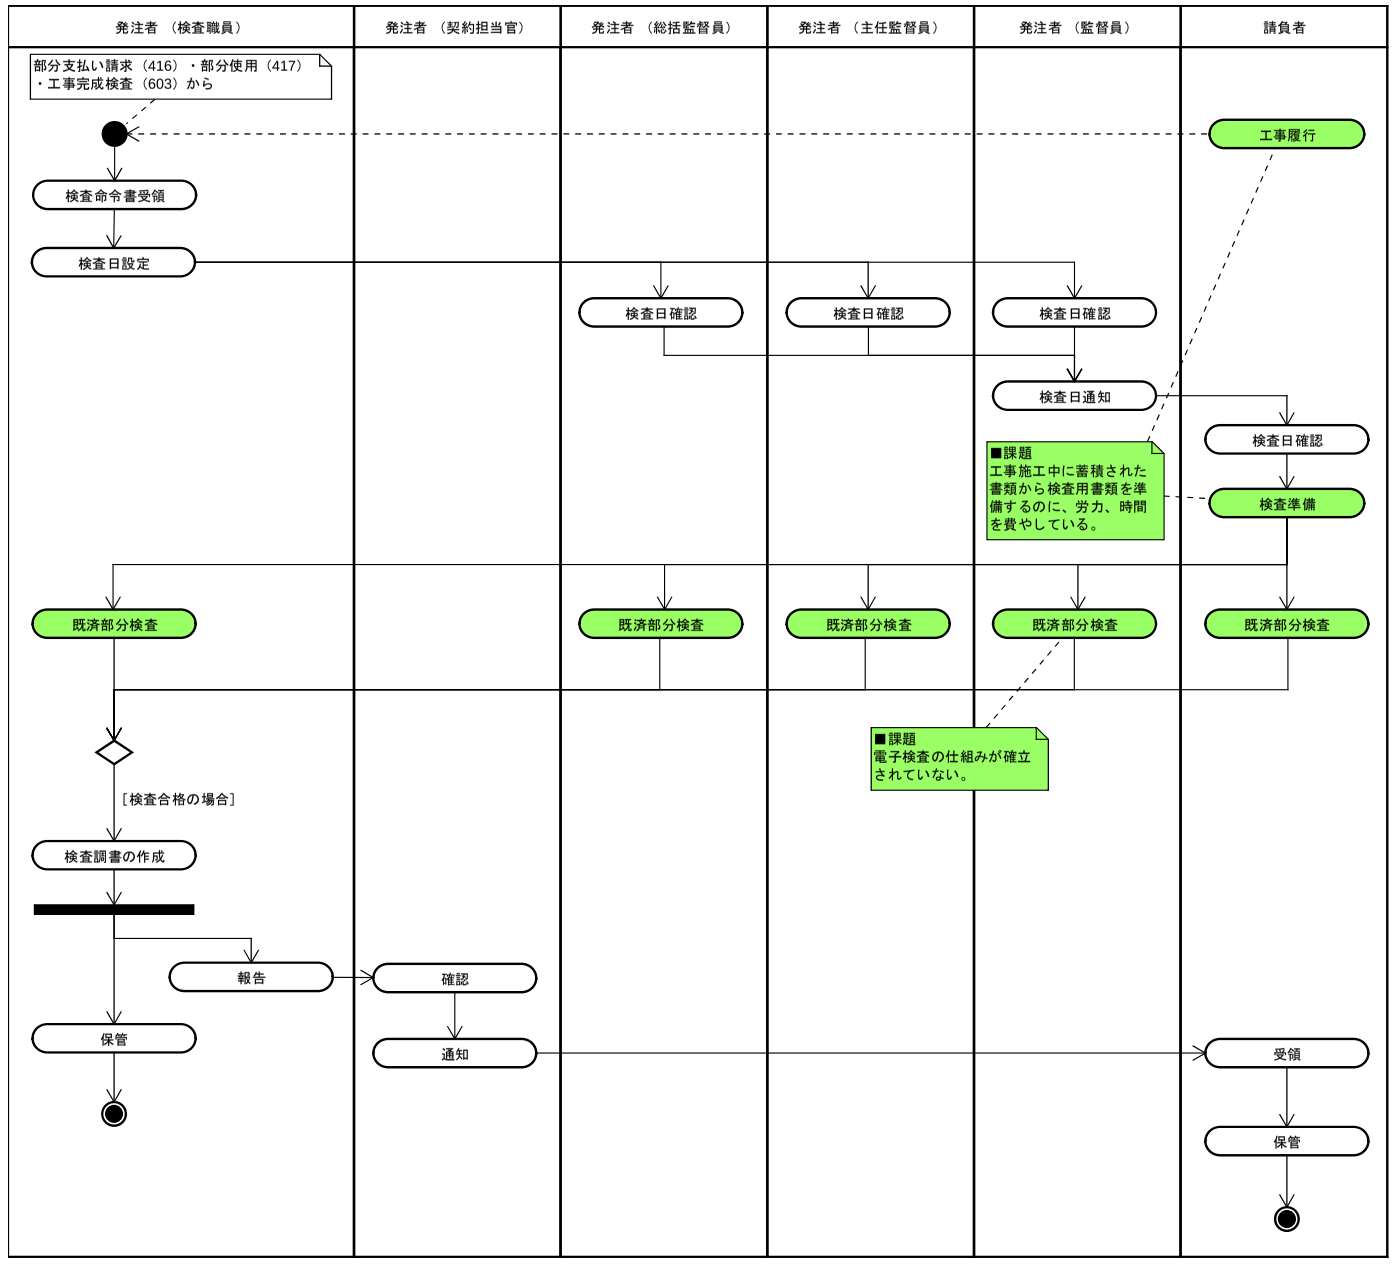

技術検査（業務改善プロセス（次期モデル））

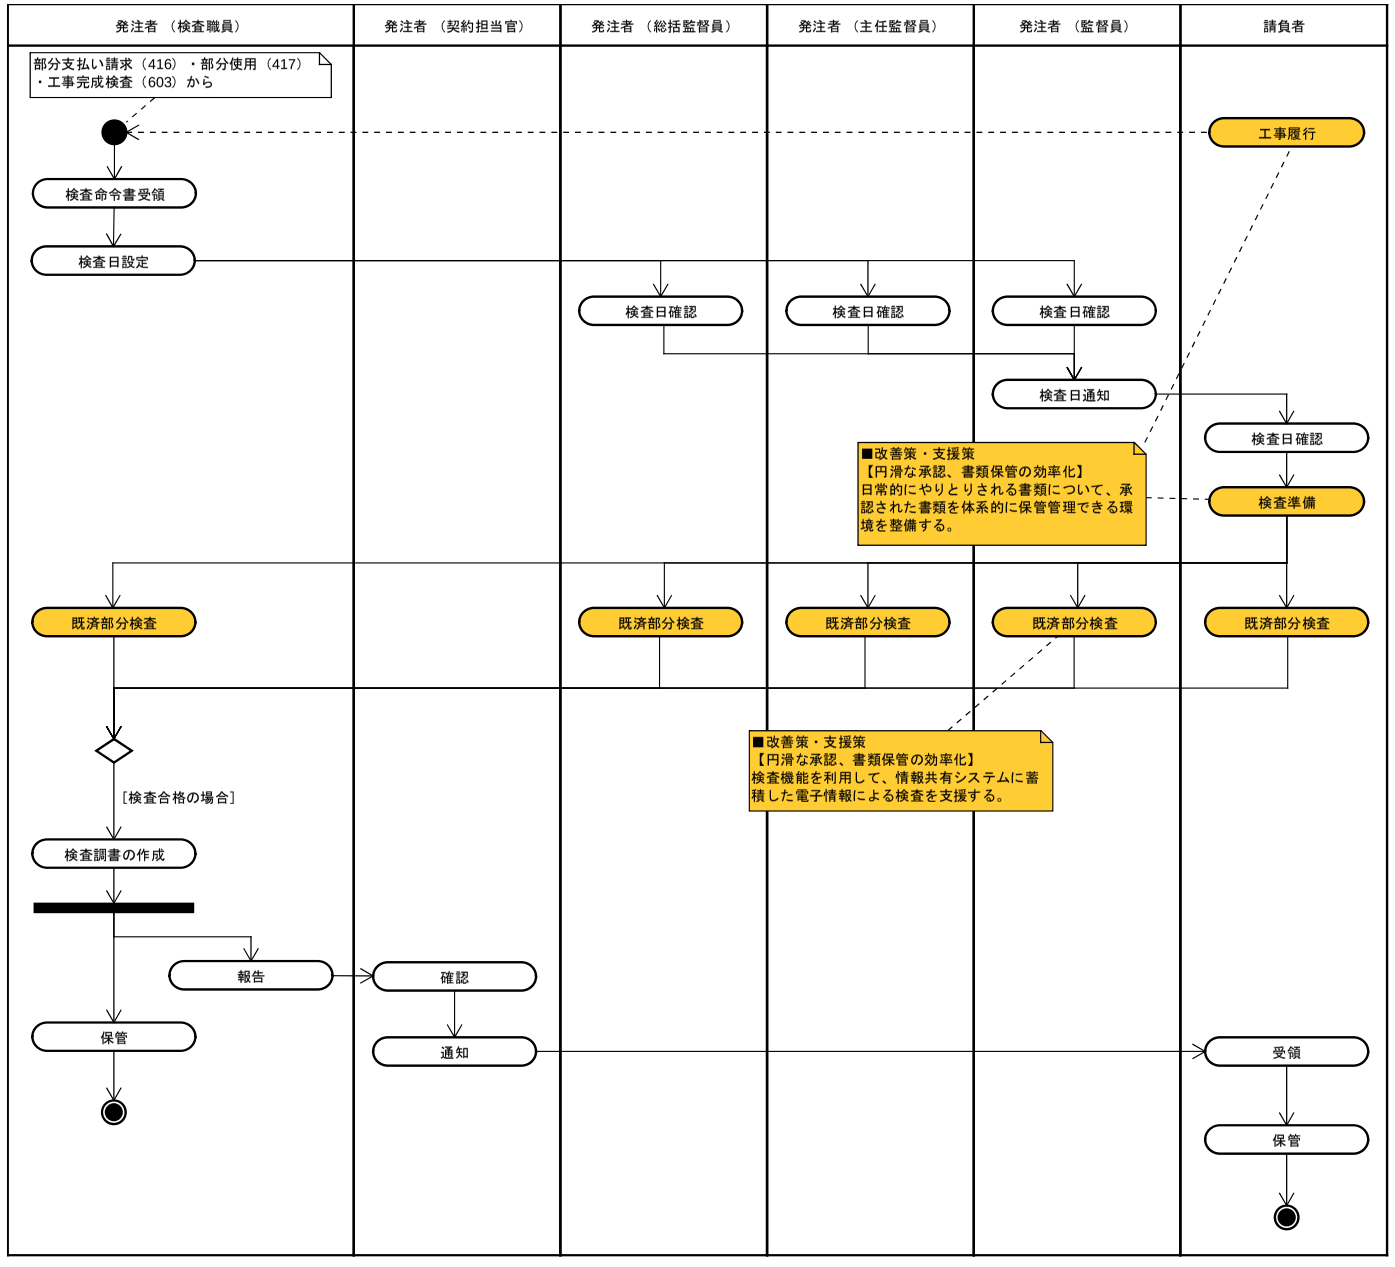

工事完成図書（現状の業務プロセス（AS-IS））

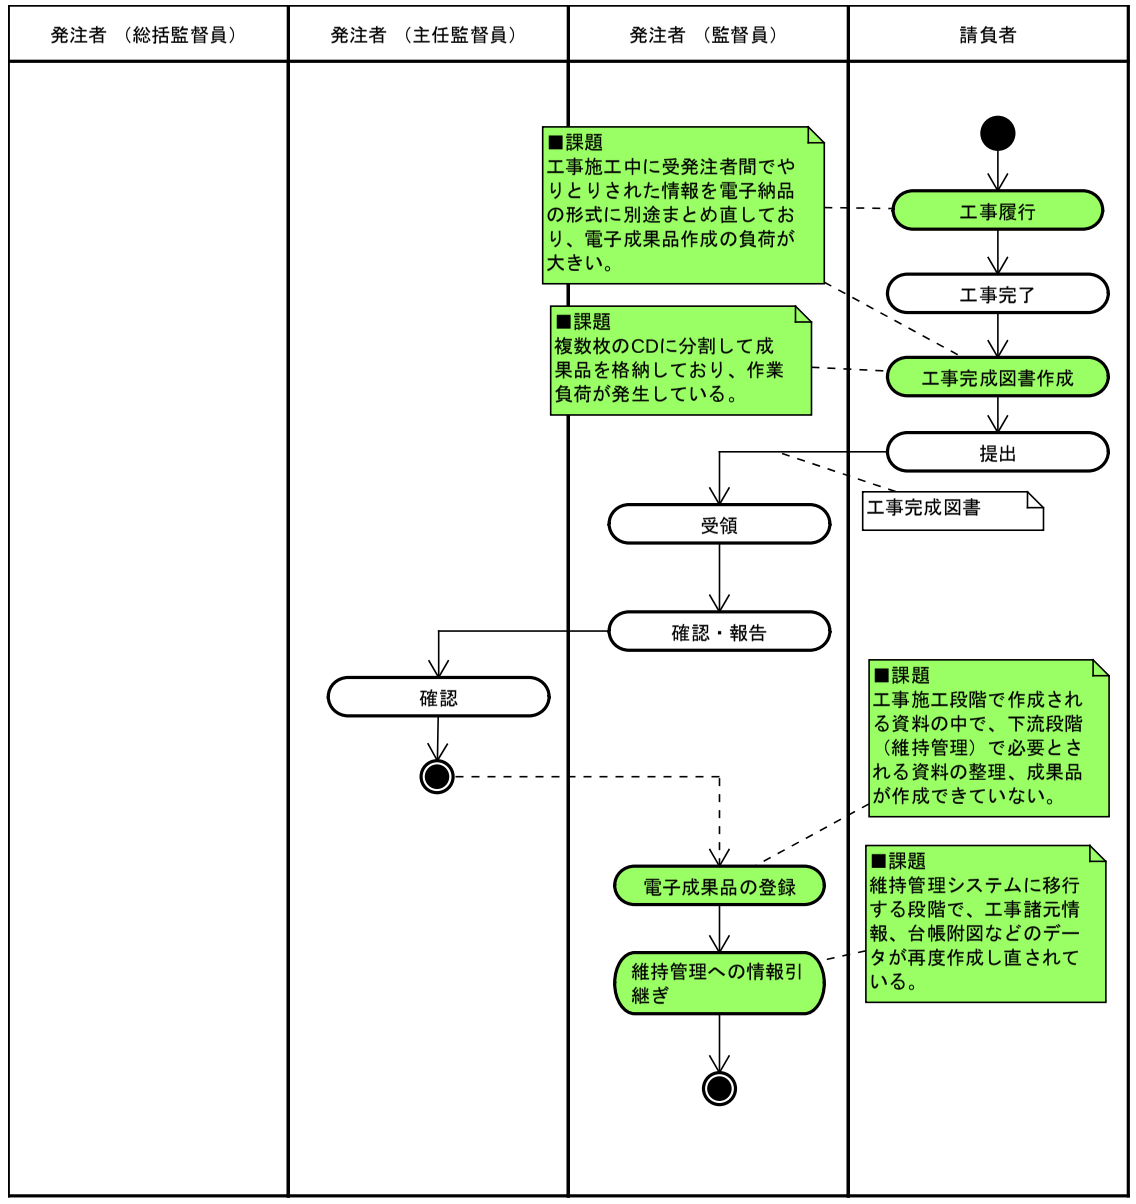
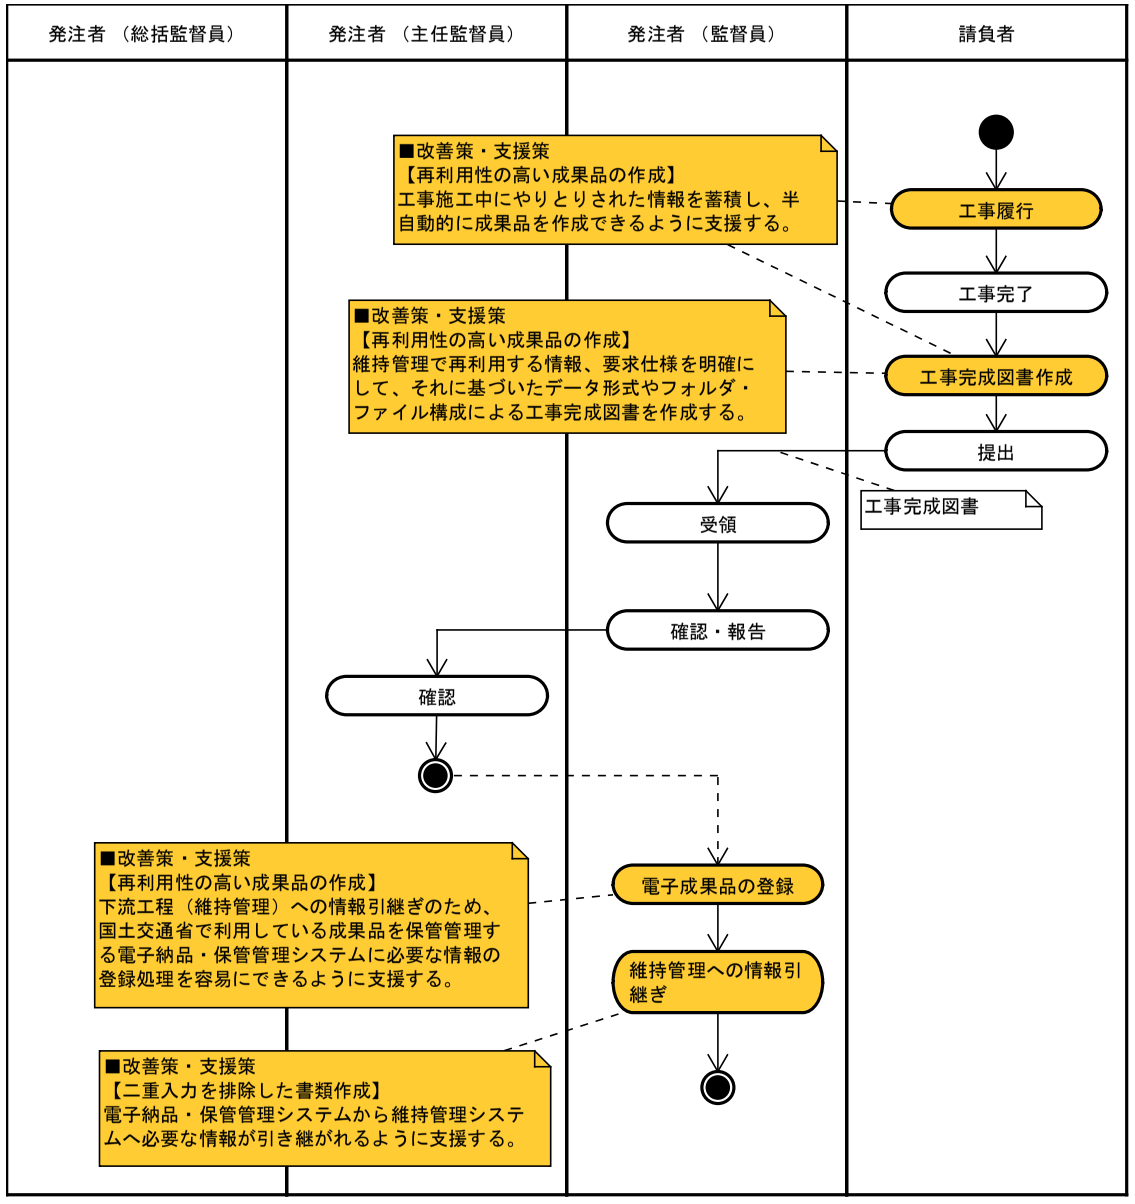
工事完成図書（業務改善プロセス（次期モデル））
